„AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE“

S A R A J E V O

I Z V J E Š T A J
O POSLOVANJU „AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE“ SARAJEVO
ZA 2025. GODINU

SARAJEVO, FEBRUAR 2026. GODINE

S A D R Ž A J

REZIME ... 3

U V O D ... 7

I OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA U 2025. GODINI ... 12

Vodne naknade ... 13

Ostali neoporezivi prihodi ... 21

Ostvareni primici ... 21

II OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA U 2025. GODINI ... 21

III OSTVARENI FINANSIJSKI REZULTAT ... 40

IV OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH RASHODA I IZDATAKA U 2025. GODINI ... 40

Ostali tekući rashodi – rashodi sektora voda (ekonomski kod 614819) ... 43

A. Upravljanje vodama na vodnom području rijeke Save ... 43

B. Tekuća i investiciona ulaganja u vodne objekte ... 62

C. Preneseni ugovoreni i drugi radovi iz viška prihoda nad rashodima ... 90

C.1. Preneseni ugovoreni radovi i usluge iz 2024. godine koji se finansiraju iz viška prihoda nad rashodima ... 90

C.2. Novi radovi, nabavka roba i usluga koji se finansiraju iz viška prihoda nad rashodima 95

Troškovi za kamate (ekonomski kod 616000) ... 106

Tekuća rezerva (ekonomski kod 617000) ... 106

Izdaci za nabavku stalnih sredstava (ekonomski kod 821000) ... 107

Otplata kredita (ekonomski kod 823000) ... 108

V OSTALI PROJEKTI ... 108

VI OSTALE INFORMACIJE O POSLOVANJU AVP SAVA ... 114

VII OSTALI POSLOVI I ZADACI AVP SAVA ... 115

REZIME

I – PRIHODI

U 2025. godini Agencija za vodno područje rijeke Save, ostvarila je ukupan prihod u visini od 22.963.573,79 KM. Od toga prihod od vodnih naknada iznosi 22.300.958,31 KM.
Preostalih 662.615,48 KM neoporezivog prihoda čini:

- Prihodi po osnovu naplaćenih kamata od kredita radnika (721212) 35,97 KM
- Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra (721220) 15.756,24 KM
- Dividenda primljena od učešća u kapitalu (721350) 136.096,81 KM
- Prihodi od izdavanja vodnih akata (722613) 27.653,82 KM
- Naplata refundacije bolovanja radnika (722614) 26.166,41 KM
- Refundacija i povrat sredstava (7226141) 456.906,23 KM
  (Povrat neutrošenih sredstava općina Visoko 450.000,00 KM i refundacija troškova radnika AVP Sava ostvarenih na sastancima Savske komisije)

Ostvareni primici u 2025. godine iznose 3.012,03 KM i njih čine naplaćene otplate po stambenim kreditima datim radnicima u poslijeratnim godinama.

II – RASHODI (REALIZACIJA PLANA I FINANSIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU)

U 2025. godini Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo je ostvarila ukupan rashod/izdatke u iznosu od 16.952.418,94 KM, od toga:

Rashodi 2025. godine su osvareni u iznosu d 16.349.185,27 KM, a podrazumijevaju sve troškove ostvarene u 2025. godini.
Izdaci 2025. godine su ostvareni u iznosu od 603.233,67 KM, a uključuju sve izdatke ostvarene na osnovu nabavke stalnih sredstava i otplate kredita

U skladu sa Okvirnim planom 2024-2026. godina i Planom i Finansijskim planom za 2025. godinu, realizovane su sljedeće aktivnosti:

- Za monitoring voda je planirano 874.953,00 KM, a realizovano je 804.409,75 KM.
- Za informacioni sistem voda (ISV) je planirani budžet iznosio 343.352,44 KM, realizovano je 213.279,31 KM.
- Za zaštitne vodne objekte u vlasništvu Federacije BiH je planirano za utrošak 2.635.100,75 KM, od toga je realizovano 2.249.598,38 KM.
- Za preventivne aktivnosti i radove odbrane od poplava na površinskim vodama I kategorije planirano je 5.801.734,56 KM. Od toga je realizovano 1.785.771,80 KM.

III – FINANSIJSKI REZULTAT

- S obzirom na planirani prihod, primitke i preneseni višak prihoda nad rashodima iz 2025. u 2025. godinu, ukupan planirani budžet za 2025. godinu iznosi 33.370.704,34 KM, a realizovano 16.952.418,94 KM što predstavlja 51% ostvarenje Plana i Finansijskog plana za 2025. godinu.
- Ukupno ugovoreni poslovi i zadaci u 2025. godini iznose 25.440.155,01 KM što predstavlja 76,23 % od ukupno planiranih poslova i zadataka.

- U 2025. godini je ostvaren finansijski rezultat viška prihoda nad rashodima u visini 6.014.166,88 KM.

IV- NAJZNAČAJNIJI POSLOVI I AKTIVNOSTI U 2025. GODINI

U 2025. godini izvršena je implementacija zakonske regulative, strateških i planskih dokumenata iz segmenta voda u Federaciji BiH, akcionih planova, međunarodnih sporazuma i konvencija koje je BIH potpisala i ratifikovala, te implementacija projekata finansiranih od strane međunarodnih finansijskih institucija.

Najznačajnije aktivnosti su:

- Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata u vlasništvu Federacije BiH na području Srednje i Odžačke Posavine.
- Sprovođenje aktivnosti propisane članovima 5. i 7. FOP-a (Federalni operativni plan odbrane od poplava).
- Provođenje preventivnih aktivnosti i radova odbrane od poplava na površinskim vodama I kategorije.
- Organizovanje i provođenje hidrološkog i monitoringa stanja voda na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, a sve u skladu sa važećom zakonskom i podzakonskom regulativom.
- Realizacija mjera iz Programa mjera Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022.-2027.) i Strategije upravljanja vodama u Federaciji BiH (2022.-2032.).
- Intervencije po incidentnim i vanrednim zagađenjima, a sve u skladu sa zakonskom i pozakonskom regulativom.
- Razvijanje informacionog sistema voda u skladu sa zakonskim, strateškim i planskim dokumentima.
- Transparentno informisanje javnosti o poslovima i aktivnostima AVP Sava.
- Učestvovanje u implementaciji projekata koji se finansiraju od strane međunarodnih i domaćih institucija: Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u Federaciji Bosne i Hercegovine-WATSAN (EIB); Modernizacija sektora vodnih usluga (Svjetska banka); Tehnička pomoć za sistem izvještavanja na prostoru cijele zemlje u vezi sa međunarodnim obavezama u oblasti okoliša/životne sredine (EEA, EIONET, EUROSTAT i međunarodnih konvencija) – (EU ENVIR); Unapređenje kvaliteta voda kroz istraživanje i mjere za upravljanje cvjetanjem mikroorganizama na akumulacijama Jablanica i Modrac u Federaciji Bosne i Hercegovine (Federalno ministartsvo okoliša i turizma); Globalni program za podršku razvoju planova finansiranja bioraznolikosti-BIOFIN (UNDP), Dugotrajno skladište i odlagalište radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj; Čista rijeka Miljacka; itd.
- Aktivno učestvovanje u stručnim komisijama: Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav, Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Save i Komisiji za vodoprivrednu saradnju između Republike Hrvatske i BiH – Podkomisija za sliv Crnog mora).
- Izdavanje vodnih akata u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
- Ostali poslovi i aktivnosti propisani zakonskom i podzakonskom regulativom i aktima nadležnih institucija.

V – ZAKLJUČCI

1. Realizacija Plana i Finansijskog plana za 2025. godinu, koja iznosi 51%, nije na zadovoljavajućem nivou. Shodno tome, provedeno je niz aktivnosti koje će poboljšati realizaciju planskih aktivnosti i poslovanje u narednoj godini.
2. U aprilu 2025. godine imenovan je Upravni odbor Agencije, a u augustu 2025. godine imenovan je direktor, nakon čega su intenzivirani procesi vezani za realizaciju Plana i Finansijskog plana, unapređenje internih procedura, te pokretanje aktivnosti na izradi i donošenju Pravilnika o radu i sistematizaciji radnih mjesta, te brojnim drugim otvorenim pitanjima značajnim za zakonito i efikasno poslovanje.
3. Nakon imenovanja novog rukovodstva, pokrenut je niz aktivnosti s ciljem stabilizacije poslovanja, jasnijeg definisanja odgovornosti i uspostavljanja efikasnijeg sistema planiranja, praćenja i izvještavanja o realizaciji Plana i Finansijskog plana.
4. Tokom 2025. godine održan je niz sastanaka sa predstavnicima općina i gradova, na kojima su precizno definisane i potvrđene obaveze jedinica lokalne samouprave s jedne strane i Agencije s druge strane, s ciljem unapređenja realizacije aktivnosti definisanih Planom i Finansijskim planom. Ovim sastancima dodatno je ojačana koordinacija i uspostavljen jasniji okvir međusobnih prava i obaveza.
5. U oktobru 2025. godine je organizovana Konferencija „Izazovi upravljanja vodama na vodnom području rijeke Save", s ciljem jačanja institucionalne saradnje i ukazivanja na potrebu koordiniranog djelovanja svih nivoa vlasti u planiranju i provođenju mjera za smanjenje rizika od štetnog djelovanja voda. Poseban naglasak je stavljen na neophodnost unapređenja procesa rješavanja imovinsko-pravnih odnosa od strane općina i gradova, kao preduslova za realizaciju projekata koje provodi Agencija.
6. Revidovane su i unaprijeđene procedure za izradu i donošenje Plana i Finansijskog plana, kako bi se u narednom periodu osigurala blagovremenost njihovog usvajanja, efikasnija realizacija i kvalitetnija kontrola izvršenja planiranih aktivnosti.
7. U posljednjih pet mjeseci 2025. godine intenzivno se radio na aktivnostima koje su usmjerene na poboljšanje realizacije Plana i Finansijskog plana za 2025. godinu, uključujući izradu i donošenje Izmjena Plana i Finansijskog plana za 2025.godinu kao i Okvirnog plana Agencije 2024-2026, uspostavu Pravnog sektora, te na stvaranju organizacionih, pravnih i finansijskih pretpostavki za znatno efikasniju, ekonomičniju i efektivniju realizaciju planskih dokumenata u 2026. godini i narednom periodu.
8. Budući da je Plan i Finansijski plan za 2026. godinu pripremljen i usvojen od strane Upravnog odbora, te je na isti krajem 2025. godine dobijena saglasnost nadležnog federalnog ministarstva, stvoreni su preduslovi da realizacija započne već u prvom tromjesečju 2026. godine.
9. Sve ugovorene obaveze iz 2025. godine bit će realizovane u 2026. godini, a za njih su obezbijeđena sredstva iz akumuliranog viška prihoda nad rashodima iz prethodnog perioda, čime se osigurava kontinuitet započetih aktivnosti.
10. Analiza postojećeg stanja ukazuje na potrebu unaprijeđenja većeg broja internih procesa, uključujući normativni okvir, organizacionu strukturu, sistematizaciju radnih mjesta, planiranje i provođenje postupaka javnih nabavki, koordinaciju sa jedinicama lokalne samouprave, kao i sistem interne kontrole i praćenja realizacije Plana i Finansijskog plana. Sveobuhvatno unapređenje navedenih segmenata ključni je preduslov za dovođenje realizacije Plana i Finansijskog plana u prihvatljive i održive okvire.

11. Direktor i Upravni odbor zatekli su značajan broj neriješenih pitanja iz prethodnog perioda, uključujući organizacione, normativne, kadrovske i operativne izazove. Stabilizacija poslovanja, uspostavljanje funkcionalnih procedura i rješavanje zatečenih problema zahtijevaju određeni vremenski period, sistemski pristup i punu podršku svih relevantnih aktera.

U V O D

„Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo (u daljem tekstu: AVP Sava) osnovana je u skladu sa odredbama Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/06). AVP Sava je registrovana kod Općinskog suda u Sarajevu pod brojem: 065-0-Reg-07-003968 i otpočela je sa radom i poslovanjem 01.01.2008. godine. Posljednja promjena upisa u sudski registar izvršena je dana 13.08.2025. godine pod brojem: 065-0-Reg-25-003258. AVP Sava je federalna neprofitna javna ustanova koja posluje u skladu sa Zakonom o vodama i drugim propisima kojima se uređuje rad javnih ustanova.
U skladu sa Zakonom o vodama (članovi 159. i 160.) i Statutom AVP Sava (član 31.), Upravni odbor AVP Sava, čije članove imenuje i razrješava Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, za svaku godinu donosi Plan i Finansijski plan AVP Sava za narednu godinu te usvaja Izvještaj o poslovanju AVP Sava za prethodnu godinu, na koje saglasnost daje Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo). Plan i Finansijski plan AVP Sava predstavlja osnovni dokument kojim se planira poslovanje, utvrđuju prihodi i druga sredstva, kao i poslovi i zadaci na koje se planirana sredstva usmjeravaju. Godišnji Izvještaj o poslovanju predstavlja dokument kojim se daje pregled izvršenih poslova i zadataka koji su izvršeni u tekućoj godini.

U sladu sa Zakonom o vodama (član 162.) i Statutom AVP Sava (član 36.), Nadzorni odbor AVP Sava, čije članove imenuje i razrješava Vlada Federacije BiH, vrši pregled godišnjeg Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna finansijskog poslovanja AVP Sava, te o rezultatima izvršenog nadzora izvještava Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Upravni odbor i direktora AVP Sava.

Upravni odbor AVP Sava, čije članove također imenuje i razrješava Vlada Federacije BiH, u skladu sa članom 160. Zakona o vodama, a uz saglasnost Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, usvaja Izvještaj o poslovanju AVP Sava za prethodnu godinu.

Izvještaj o poslovanju AVP Sava, zajedno sa obrascima Godišnjih izvještaja, dostavlja se nadležnim institucijama i predstavlja cjelovitu i sveobuhvatnu informaciju o poslovanju AVP Sava za 2025. godinu.

Dužnost vršioca dužnosti (VD) direktora AVP Sava u periodu od 15.10.2024. godine do 03.08.2025. godine obnašala je Dženana Remić. Imenovananje Dženane Remić za VD direktor je izvršeno od strane Upravnog odbora AVP Sava na period od 6 mjeseci, Odlukom broj: 50-1107-2/24 od 15.10.2024. godine, na koju je Federalno ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva dalo saglasnost broj: 07-02-21/2-1865-1/24 dana 16.10.2024. godine. Po isteku navedenog mandata, Upravni odbor AVP Sava je dana 15.04.2025. godine donio Odluku broj: 50-591-5/25, o imenovanju Dženane Remić za VD direktora AVP Sava na period od tri mjeseca. Na ovu Odluku Ministarstvo je dalo saglasnost broj: 07-02-21/2-1073/25 dana 15.04.2025. godine. Po isteku navedenog mandata, dana 14.07.2025. godine i pod brojem: 50-1000-4/25, Upravni odbor AVP Sava je donio novu Odluku o imenovanju Dženane Remić za VD direktora AVP Sava na period do tri mjeseca, odnosno do završetka konkursne procedure i izbora direktora AVP Sava. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je 15.07.2025. godine dalo saglasnost na Odluku, broj: 07-21/2-1744/25.

Upravni odbor AVP Sava je 21.07.2025. godine donio Odluku o izboru i imenovanju direktora Agencije za vodno područje rijeke Save – Dr.sc. Senad Memić, na koju je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dana 24.07.2025. godine dalo saglasnost broj: 07-21/2-1778-1/25. Dužnost direktora Agencije za vodno podrčje rijeke Save Sarajevo, Dr.sc. Senad Memić je preuzeo dana 04.08.2025. godine na mandat od četiri godine.

Vlada Federacije BiH je dana 29.11.2024. godine donijela Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora AVP Sava V.broj: 1861/2024 u sastavu: Anisa Čičić Močić predsjednik, Hariz Mehidić član i Vlado Stanić član.

Rješenjem V.broj: 677/2025 od 09.04.2025. godine, Vlada Federacije BiH je imenovala Upravni odbor AVP Sava na mandat od četiri godine, u sastavu: Anto Mikić predsjednik, Josip Jukić član, Amila Ibrulj član, Denis Šehanović član i Damir Živojević član.

Na sjednici održanoj 27.12.2024. godine, Upravni odbor AVP Sava je donio Odluku o privemenom finansiranju „Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo za period januar-mart 2025. godine broj: 50-1419-4/24.

Upravni odbor AVP Sava je, na sjednici održanoj 14.01.2025. godine, razmatrao i donio Odluku o usvajanju Plana i Finansijskog plana „Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo za 2025. godinu, broj: 50-39-4/25. U skladu sa članom 160. stav 2. tačka 2. Zakona o vodama, Saglasnost na Plan i Finansijski plan AVP Sava za 2025. godinu data je od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva aktom broj: 07-02-21/2-259/25 od 20.01.2025.godine.

Upravni odbor je na sjednici održanoj dana 27.05.2025. godine donio Odluku o usmjeravanju viška prihoda nad rashodima, broj: 50-802-3/25. Na navedenu Odluku Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je dalo saglasnost broj: 07-2-21/2-1498/25 od 12.06.2025. godine. Predmetna Odluka sastavni je dio Plana i Finansijskog plana AVP Sava za 2025. godinu.

Na dan 31.07.2025. godine, za potrebe izrade Izvještaja o poslovanju izrađen je finansijski izvještaj o izvršenju budžeta (Obrazac GIB), kao i račun prihoda i rashoda (Obrazac PR). U Obrascu GIP evidentiranu su analitički pokazatelji prihoda/primitaka i rashoda/izdataka.

Na dan 31.07.2025. godine, ukupno ostvareni prihodi (ekonomski kod 700000) evidentirani su iznosu od 12.779.532,00 KM što predstavlja **64% ostvarenih planiranih prihoda za 2025. godinu**. U ukupne prihode su uključeni: Takse (722200) u iznosu od 9.827,00 KM, Vodne naknade (722500) u iznosu od 12.745.240,00 KM, te Prihodi od vlastitih usluga (722600) u iznosu od 24.465,00 KM.
Na dan 31.07.2025. godine, ukupno ostvareni rashodi i izdaci su evidentirani u ukupnom iznosu 6.717.419,00 KM što čini **20,12% realizovanih planiranih sredstava za 2025. godinu**. U ukupne rashode i izdatke su uključeni: Plaće i naknade troškova zaposlenih (611000) u iznosu od 2.173.204,00 KM, Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi (612000) u iznosu od 208.468,00 KM, Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge (613000) u iznosu od 721.434,00 KM, Tekući transferi i drugi tekući rashodi (614000) u iznosu od 3.607.346,00 KM, Izdaci za kamate (616000) u iznosu od 6.967,00 KM i izdaci za nabavku stalnih sredstava (821000) u iznosu od 70.550,00 KM.

Evidentno je da se realizacija Plana i Finansijskog plana u prvih sedam mjeseci 2025. godine nije odvijala po planiranoj dinamici:

- Plaće i naknade troškova zaposlenih (611000), evidentirano je ostvarenje 44% planiranih sredstava. (Plaće i naknade troškova zaposlenih su isplaćivane redovno. Manje ostvarenje plana je evidentirano jer je odobrenim iznosima na ekonomskom kodu 611000 planiran prijem novih radnika. Procedura prijema novih radnika je okončana u 8. mjesecu 2025. godine).
- Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi (612000), evidentirano je ostvarenje 38,70% planiranih sredstava (Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi su „pratili" obračun i isplatu plaća i ostalih naknada radnika AVP Sava).
- Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge (613000) sa ostvarenjem 33,47% planiranih sredstava.
- Tekući transferi i drugi tekući rashodi (614000) su imali ostvarenje od 14,33% planiranih sredstava.
- Izdaci za kamate (616000) sa ostvarenjem od 34,83% planiranih sredstava i
- Izdaci za nabavku stalnih sredstava (821000) sa ostvarenjem od 44,94% planiranih sredstava.

Prilikom analize poslovanja i realizacije Plana i Finansijskog plana za 2025. godinu, evidentirano je da je realizacija ekonomskog koda „Tekući transferi i drugi tekući rashodi (614000)" imala ostvarenje svega 14,33 % planiranih sredstava, što zahtijeva dodatnu analizu uzroka i dinamike izvršenja.

Ekonomski kod 614000 sačinjava:

A. 6148191 Upravljanje vodama na vodnom području rijeke Save
B. 6148192 Tekuća i investiciona ulaganja u vodne objekte
C. 6148193 Preneseni ugovoreni i drugi radovi koji se finansiraju iz viška prihoda nad raskodima.

U periodu od 04.08.2025. godine do 31.12.2025. godine poduzeto je niz aktivnosti kako bi se poboljšala realizacija Plana i Finansijskog plana i poboljšala efikasnost rada AVP Sava.

U navedenom periodu, direktor AVP Sava (Senad Memić) je pripremio Prijedlog Izmjena i dopuna Plana i Finansijskog plana za 2025. godinu, koje je Upravni odbor razmatrao i usvojio na sjednici održanoj 10.10.2025. godine te donio Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Plana i Finansijskog plana za 2025. godinu broj: 50-1366-3/25. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je saglasnost na Izmjene i dopune Plana i Finansijskog plana za 2025. godinu dalo aktom broj: 07-21/2-2189-1/25 od 14.10.2025. godine. Izmjene i dopune Plana i Finansijskog plana su urađene kako bi se postigao efikasniji i produktivniji utrošak javnih sredstava prema krajnjim korisnicima istih.
Također, direktor AVP Sava je pripremio Prijedlog Izmjena i dopuna Okvirnog Plana i Finansijskog plana za 2024.-2026. godinu, koje je Upravni odbor razmatrao i donio Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Okvirnog Plana i Finansijskog plana za 2024.-2026. godinu, broj: 80-1369-3/25 na sjednici održanoj dana 14.10.2025. godine. Vlada Federacije BiH je svojim aktom V.broj: 1861/2025 od 15.12.2025. godine donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Okvirnog Plana i Finansijskog plana za 2024.-2026. godinu broj: 80-1369-3/25.

U cilju poboljšanja realizacije planiranih projekata i aktivnosti, kao i izvršavanja zadataka i poslova utvrđenih Zakonom o vodama te drugim zakonskim, podzakonskim i internim aktima, u oktobru 2025. godine, formirana je komisija i pokrenuta je procedura izrade novog Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Donošenje navedenog akta će omogućiti kvalitetniju preraspodjelu radnih zadataka, utvrditi realan broj radnih mjesta, kao i odgovarajuću strukturu zaposlenih u AVP Sava.

Također, u cilju poboljšanja i povećanja efikasnosti poslovanja, pristupilo se definisanju internih procedura, izradi, izmjenama i reviziji postojećih internih akata, odnosno donošenju novih internih akata tamo gdje se za to ukazala potreba.

U cilju kvalitetnije pripreme Plana i Finansijskog Plana AVP Sava za 2026. godinu, te potrebi veće transparentnosti i kvalitetnije komunikacije sa krajnjim korisnicima javnih sredstava, AVP Sava je organizovala Konferenciju "Izazovi upravljanja vodama na vodnom području rijeke Save". Na konferenciju su pozvani i prisustvovali su predstavnici općina i gradova, kao i krajnji korisnici javnih sredstava, odnosno institucije koje za proces donošenja Plana i Finansijskog plana predlažu i kandiduju svoje projekte AVP Savi. Na konferencije je ukazano na neophodnost saradnje institucija u planiranju i provedbi mjera smanjenja rizika od štetnog djelovanja velikih voda. Ukazano je na probleme u realizaciji preventivnih aktivnosti odbrane od poplava na vodama I kategorije s kojim se AVP Sava suočava u svom radu. Predstavljene su procedure i kriteriji izrade godišnjeg Plana i Finansijskog plana Agencije, a direktor Senad Memić je prisutne upoznao jednim od ključnih problema u realizaciji projekata, a to su neriješeni imovinsko-pravni odnosi i nedostatak građevinskih dozvola, što značajno usporava njihovu provedbu. Održana konferencija ispunila je planirane ciljeve te je ocijenjena kao uspješna sa aspekta kvaliteta organizacije i doprinosa procesu pripreme Plana i Finansijskog plana.

U decembru 2025. godine je pripremljen prijedlog Plana i Finansijskog plana za 2026. godinu, koji je direktor AVP Sava na sjednici Upravnog odbora održanoj 18.12.2025. godine predstavio, na osnovu čega je Upravni odbor donio Odluku o usvajanju Plana i Finansijskog plana za 2026. godinu broj: 80-1756-6/25. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je 24.12.2025. godine svojim aktom broj: 07-21/1-2633/25 dalo saglasnost na Plan i Finansijski plan za 2026. godinu.

Direktor je u periodu august-decembar 2025.godine održao niz sastanaka sa predstavnicima lokalnih zajednica u općinama i gradovima i to: Goražde, Zavidovići, Doboj Jug, Tešanj, Srebrenik, Donji Vakuf, Gornji Vakuf, Bugojno, Bihać, Sanski Most, Ključ, Bosanska Krupa, Velika Kladuša, Vlada Posavskog kantona, Zavidovići, Ilidža.

U septembru 2025. godine je organizovana višednevna posjeta Unsko-sanskom kantonu zajedno sa federalnim ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, tokom koje su posjećene brojne lokalnih zajednica na području ovoga kantona. Tom prilikom održan je zajednički sastanak sa federalnom ministricom okoliša i turizma, kao i svim načelnicima i gradonačelnicima lokalnih zajednica te kantonalnim ministrima nadležnim za oblast okoliša. Teme sastanka odnosile su se na realizaciju projekata na području Unsko-sanskog kantona, kao i na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na vodotocima I kategorije, kao neophodan preduslov za realizaciju projekata izgradnje obaloutvrda.

Direktor je, zajedno sa članovima Upravnog odbora AVP Sava prisustvovao otvaranju Međunarodnog sajmu ekologije „EKOBIS 2025", kojem je AVP Sava dala institucionalnu podršku. U svom obraćanju, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je naglasio značaj povezivanja sektora poljoprivrede, vodoprivrede i ekologije, kao ključnih stubova održivog razvoja i tom priliko istakao značaj integracije sektora poljoprivrede, vodoprivrede i ekologije kao ključnih elemenata održivog razvoja, uz naglasak na neprihvatljivost nelegalne gradnje u vodozaštitnim područjima, neadekvatnog upravljanja otpadom i nepoštivanja zakonskih propisa.

U septembru 2025. godine Agenciju je posjetila delegacija Državnog hidrometeorološkog zavoda Republike Hrvatske, predvođena generalnim direktorom Ivanom Güttlerom, uz prisustvo predstavnika Federalnog hidrometeorološkog zavoda i partnerskih institucija. Tokom sastanka razmatrano je proširenje saradnje u oblasti razmjene prognostičkih podataka, uključujući korištenje radarskih mjerenja, s ciljem unapređenja sistema ranog upozoravanja na ekstremne hidrološke i meteorološke pojave. Istaknuta je potreba jačanja tehničkih kapaciteta u Federaciji BiH, kao i značaj ažuriranja postojećih sporazuma između nadležnih agencija radi formalizacije proširene institucionalne saradnje.

AVP Sava ostvaruje prihode po osnovu vodnih naknada u skladu sa Zakonom o vodama i podzakonskim aktima.
U 2025. godini AVP Sava je ostvarila ukupne prihode od vodnih naknada u iznosu od 22.300.958,31 KM, a što predstavlja 113% u odnosu na planirane za 2025. godinu. Ukupni ostali neporezni prihodi u 2025. godini iznose 662.615,48 KM, što je 220,87% ostvarenje u odnosu na planirane za 2025. godinu, tako da ukupni prihod AVP Sava u 2025. godini iznosi 22.963.573,79 KM, što iznosi 116,86 % u odnosu na planirani za 2025. godinu.

Ostvareni primici u 2025. godini iznose 3.012,03 KM, a odnose se na primljene otplate kredita od pojedinaca (radnika).

U cilju izmjene Zakona o poreznoj upravi održani su sastanci sa premijerom Federacije BiH, ministrom finansija Federacije BiH i privremeno postavljenim direktorom Porezne uprave Federacije BiH. Tema sastanka se odnosila na razmatranja izmjena i dopuna zakonskih propisa s ciljem da se obračun, kontrola i naplata PVN-a vrše putem Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, čime bi se doprinijelo povećanju naplate ovih prihoda Agencije, kao i jačanju fiskalne discipline.

Rashodi AVP Sava ostvaruju se plaćanjem izvršenih radova i aktivnosti u namjene i zadatke utvrđene Planom i Finansijskim planom AVP Sava za 2025. godinu. U 2025. godini ukupno ostvareni rashodi iznose 16.349.185,27 KM. Ukupni izdaci u 2025. godini ostvareni su u iznosu od 603.233,67 KM i odnose se na nabavku stalnih sredstava i otplate po kreditima.

Navedeno ostvarenje rashoda, nabavka stalnih sredstava i otplate kredita predstavljaju ukupnu finansijsku realizaciju Plana i Finansijskog Plana AVP Sava za 2025. godinu u iznosu od 16.952.418,94 KM što predstavlja 51% u odnosu na planiranu. Realizacija ugovorenih, a neizvršenih radova i usluga biće prenesena u narednu godinu.

I OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA U 2025. GODINI

Ukupno ostvareni prihodi i primici AVP Sava u 2025. godini iznose 22.963.573,79 KM. Ostvarenje prihoda i izdataka po izvorima može se vidjeti u narednoj tabeli:

Red. broj	EKON. KOD	IZVORI PRIHODA I PRIMITAKA	PLAN ZA 2025. GODINU	OSTVARENJE 2025.GODINE	% (5/4)x 100
1	2	3	4	5	6
1.	**722500**	**VODNE NAKNADE**	**19.650.000,00**	**22.300.958,31**	**113**
1.1.	722521	PVN za zaštitu voda od vlasnika transportnih sredstava koja za pogon koriste naftu i naftne derivate	5.200.000,00	5.622.151,53	108
1.2.	722522	PVN za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, proizvodnju ili uvoz vještačkog đubriva i hemikalija za zaštitu bilja)	2.200.000,00	2.308.172,72	105
1.3.	722523	PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu	800.000,00	757.011,55	95
1.4.	722524	PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda za flaširanje voda i mineralnih voda, uzgoj ribe u ribnjacima, za navodnjavanje i druge namjene	200.000,00	185.948,93	93
1.5.	722525	PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući termoelektrane	800.000,00	766.198,71	96
1.6.	722526	PVN za korištenje voda za proizvodnju električne energije u hidroelektranama	350.000,00	178.916,66	51
1.7.	722527	PVN za vađenje materijala iz vodotoka	20.000,00	13.160,35	65
1.8.	722529	Opća vodna naknada	10.080.000,00	12.469.397,86	124
2.	**722600**	**OSTALI NEPOREZNI PRIHODI**	**300.000,00**	**662.615,48**	**221**
2.1.	7226141	Ostali neporezni prihodi	300.000,00	662.615,48	221
		UKUPNO OSTVARENI PRIHODI U 2025. GODINI (1+2):	**19.650.000,00**	**22.963.573,79**	**117**
3.		**OSTVARENI PRIMICI**		**3.012,03**	
3.1.	813210	Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima		**3.012,03**	
3.2.	814300	Primici od domaćeg zaduživanja (kredit)		-	
		UKUPNO OSTVARENI PRIMICI U 2023. GODINI (3):		**3.012,03**	
		SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI (1+2+3):	**19.650.000,00**	**22.966.585,82**	**117**

Vodne naknade

Vodne naknade kao izvor sredstava za upravljanje vodama u Federaciji BiH i prihod AVP Sava obezbjeđuju se u skladu sa:
- Zakonom o vodama („Službene novine Federacije BiH", broj: 70/06),
- Odlukom o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH", broj: 46/07, 10/14 i 3/16) i
- Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH", broj: broj 97/07, 46/09, 79/11, 88/12 i 03/16) (u daljem tekstu: Pravilnik).

Vodne naknade su podijeljene u dvije osnovne grupe:
- opća vodna naknada i
- posebne vodne naknade.

Vodne naknade od strane obveznika uplaćuju se na depozitne račune javnih prihoda kantonalnih budžeta i sa tog računa se raspodjeljuju korisnicima u skladu sa članom 177. Zakona o vodama. Nadležnoj Agenciji pripada 40% od ukupno uplaćenih sredstava (45% kantonalnim budžetima, a 15% se raspoređuje Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH) i ista se doznačavaju na transakcijske račune AVP Sava.

Ukupno ostvareni prihodi od vodnih naknada u 2025. godini iznose 22.300.958,31 KM što je 13,34 % više u odnosu na planirane za 2025. godinu i što je za 10,38 % više u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini (20.202.909,89 KM).

U posljednjih pet-šest godina je evidentan porast naplate vodnih naknada. U odnosu na ukupan iznos naplaćenih vodnih naknada iz 2021. godine koji je iznosio 16.940.272,01 KM, u 2025. godini je ostvarena veća naplata za cca 5,3 mil KM. Kontinuiran porast naplate je naročito izražen kod opće vodne naknade, što potvrđuje da plaćanje javnih prihoda iziskuje i adekvatnu kontrolu plaćanja. S obzirom da obračun i plaćanje opće vodne naknade kontroliše Porezna uprava Federacije BiH, naplata opće vodne naknade je u stalnom porastu. Na povećanje naplate opće vodne naknade je također uticalo i povećanje prosječne plaće u Federaciji BiH, odnosno povećanje najniže plaće u Federaciji BiH.

S druge, strane posebne vodne naknade nemaju po postojećim zakonskim i podzakonskim aktima osiguranu adekvatnu kontrolu naplate. U kontroli naplate posebnih vodnih naknada je izostavljen sistem prinudne naplate, o čemu je AVP Sava u više navrata obavještavala sve nadležne institucije. Do održavanja kontinuiteta naplate posebnih vodnih naknada je došlo prevashodnim radom i angažmanom od strane AVP Sava koji se ogledao u sljedećem:

-u angažmanu direktora AVP Sava koji je koristio svaku priliku da na sastancima sa predstavnicima općina i gradova ukaže na značaj lokalne zajednice u podsticanju obveznika za plaćanje svojih obaveza,
-kvalitetnom sistemu praćenja obveznika posebnih vodnih naknada (operativni sistem – softver vodnih naknada),
-kontinuiranoj komunikaciji sa obveznicima plaćanja PVN,
-kontinuiranoj i dobroj saradnji sa FUZIP/vodni inspektorat,
-obilaskom i kontrolom obveznika od strane ovlaštenih predstavnika AVP Sava,
-slanju opomena o nedostavljanju obrazaca i neizvršavanju obaveza po osnovu plaćanja,

-održavanjem sastanaka sa obveznicima koji imaju evidentirana dugovanja i sl.

I pored svih uloženih napora, naplata nije ostvarena u iznosu koji je ekvivalent zaduženjima obveznika po osnovu posebnih vodnih naknada, prevashodno zbog neusaglašenosti zakonodavstva (Zakon o vodama i Zakon o poreznoj upravi FBiH).
U narednoj tabeli je dat pregled ostvarenih prihoda AVP Sava u periodu 2021.-2025. godina po svim vrstama vodnih naknada:

	2021.	2022.	2023	2024	2025
722521	4.749.692,13	4.848.020,15	5.056.960,12	5.347.653,23	5.622.151,53
722522	2.744.564,85	3.132.415,24	2.718.592,35	2.425.387,21	2.308.172,72
722523	682.589,67	688.079,15	714.739,00	735.576,35	757.011,55
722524	124.767,26	162.482,81	168.564,35	174.567,37	185.948,93
722525	901.460,10	788.451,99	710.666,65	765.681,17	766.198,71
722526	199.163,18	225.846,64	238.419,92	163.987,60	178.916,66
722527	83.956,95	54.565,08	9.404,64	86.874,48	13.160,35
722529	7.454.077,87	8.605.619,58	9.712.034,05	10.503.182,41	12.469.397,86
Ukupno	**16.940.272,01**	**18.505.480,64**	**19.329.381,08**	**20.202.909,82**	**22.300.958,31**

Opća vodna naknada
Opću vodnu naknadu dužni su plaćati obveznici koji su „registrovani za obavljanje djelatnosti", a što podrazumijeva sva pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje određene djelatnosti kod nadležnog suda, odnosno kod nadležnog općinskog organa.
Osnovicu za plaćanje čini ukupan iznos neto plaća zaposlenih na neodređeno i određeno vrijeme koji pomnožen sa visinom stope od 0,5%, daje iznos opće vodne naknade.
Opću vodnu naknadu dužna su plaćati i pravna lica po osnovu isplata po ugovoru o djelu, autorskih ugovora i članstva u upravnim i nadzornim odborima.
U 2025. godini AVP Sava je oprihodovala po osnovu naplate opće vodne naknade 12.469.397,86 KM, što predstavlja 123,70 % od planiranog iznosa za 2025. godinu i što je za 18,72 % više u odnosu na ostvarenu u prethodnoj godini (10.503.182,41 KM).

Posebne vodne naknade
U posebne vodne naknade spadaju su:
-Naknada za zaštitu voda od vlasnika transportnih sredstava koja za pogon koriste naftu i naftne derivate,
-Naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, proizvodnju ili uvoz vještačkog đubriva i hemikalija za zaštitu bilja),
-Naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu,
-Naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za flaširanje voda i mineralnih voda, uzgoj ribe u ribnjacima, za navodnjavanje i druge namjene,
-Naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući termoelektrane,
-Naknada za korištenje voda za proizvodnju električne energije u hidroelektranama i
-Naknada za vađenje materijala iz vodotoka.
Obveznici obračunavanja i plaćanja posebnih vodnih naknada su fizička i pravna lica, korisnici i zagađivači voda, kao i fizička i pravna lica koja vrše eksploataciju materijala iz vodotoka, uzgoj ribe u ribnjacima, proizvode električnu energiju hidroenergijom i dr. Osnovica za obračunavanje i plaćanje PVN je m^3 iskorištene vode, ekvivalentni broj stanovnik (EBS)

ispuštenog zagađenja, kg prodate ribe, m^3 izvađenog materijala iz vodotoka i KWh proizvedene električne energije. Visina PVN određena je Odlukom o visini posebnih vodnih naknada koju je donijela Vlada Federacije BiH.

PVN za zaštitu voda :

- PVN za zaštitu voda od vlasnika transportnih sredstava koja za pogon koriste naftu i naftne derivate (**722521**) naplaćeno je i oprihodovano 5.622.151,53 KM ili 108,11 % u odnosu na planirane za 2025. godinu i veće u odnosu na prethodnu godinu za 5,13 % (5.347.653,23). Ova vrsta PVN plaća se prilikom registracije vozila i predstavlja jedan od sigurnih i stabilnih izvora prihoda sektora voda i AVP Sava.

- PVN za zaštitu voda za ispuštanje otpadnih voda, uzgoja ribe, proizvodnje ili uvoza vještačkog đubriva ili hemikalija za zaštitu bilja (722522) naplaćena je u iznosu od 2.308.172,72 KM, što je 104,92 % u odnosu na planirani iznos za 2025. godinu, odnosno za 4,84 % manje u odnosu na ostvarene u prethodnoj godini (2.425.378,21). Ovu vrstu naknada plaćaju svi zagađivači voda.

VELIKI ZAGAĐIVAČI

U operativnoj evidenciji AVP Sava „Velikih zagađivača", odnosno zagađivača čiji godišnji teret zagađenja iznosi preko 500 ES, ima ukupno 102. Veliki broj velikih zagađivača uredno izmiruje obaveze koje se odnose na obračun i plaćanje posebnih vodnih naknada, dok kod manjeg broja ovih zagađivača postoje određeni problemi oko obračuna i plaćanja PVN. U 2025. godini poslane su opomene obveznicima koji nisu izvršili svoje obaveze u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.
U narednoj tabeli prikazani su rudnici sa ostvarenim najvećim dugovanjima po osnovu PVN zaključeno sa 31.12.2025. godine:

R.B.	Naziv obveznika	Dug (KM)
1.	RMU Banovići d.d. Banović	-5.028.229,34
2.	RMU Zenica d.o.o. Zenica	-585.788,90

Evidentno je da je najveće dugovanje ostvareno od strane RMU „Banovići" d.d. Banovići. Bitno je napomenuti da je ovo dugovanje evidentirano Rješenjem Porezne uprave Federacije za period 01.01.2014. -30.09.2019. godine. Na Rješenje PU FBiH, RMU „Banovići" d.d. Banovići je uložio žalbu koja se još uvijek razmatra u FMF. Obaveze po osnovu vodnih naknada prije 2014. godine su sve uplaćene. Obaveze koje su nastale nakon 30.09.2019. godine, RMU „Banovići" d.d. Banovići redovno izmiruje.
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RMU „ZENICA" d.o.o. Zenica je u teškoj finansijskoj situaciji i pored spremnosti obveznika da izvrši izmirenje svojih dugovanja, nelikvidnost preduzeća onemogućava plaćanje obaveza navedenog obveznika.

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RMU „ĐURĐEVIK" d.o.o. Đurđevik je imao značajna dugovanja u periodu 2022/2023. godina. Nakon kontrole od strane ovlaštenih predstavnika AVP Sava i velikog broja sastanaka koji su održani, obveznik je pokazao veliku spremnost i nastojanje za izmirenjem svih svojih dugovanja. Do kraja 2023. godine ovaj obveznik je u

potpunosti izmirio obaveze koje se odnose na obračun i plaćanje PVN, tako da dugovanje sa 31.12.2025. godine u iznosu od 35.647,03 KM predstavlja redovno/tekuće dugovanje.

Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RMU „KAKANJ" d.o.o. Kakanj je još jedan od obveznika koji je u proteklom periodu izmirio svoje obaveze koje su se odnosile na obračun i plaćanje PVN i koji svoje tekuće obaveze redovno izmiruje.
U narednoj tabeli navedeni su ostali **veliki zagađivači** koji imaju značajnija dugovanja po osnovu PVN zaključno sa 31.12.2025. godine:

R.B.	Naziv obveznika	Dug (KM)
1.	KOKSARA doo LUKAVAC za proizvodnju koksa, hemijskih proizvoda i energije Dugovanje do 10.11.2025. =1.674.210,01 KM Dugovanje od 11.11.2025.-31.12.2025. = 50.721,99	-1.724.932,00
2.	Pobjeda Tehnology d.d. Goražde	-352.587,21
3.	Sarajevska pivara d.d. Sarajevo	-376.757,27
4.	Arcelor Mittal doo Zenica	-103.517,35

Kao najveći dužnik iz gornje tabele evidentiran je KOKSARA doo Lukavac za proizvodnju koksa, hemijskih proizvoda i energije. U "Službenim novinama Federacije BiH" broj: 89/25 objavljeno je Rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad imovinom dužnika KOKSARA doo LUKAVAC za proizvodnju koksa, hemijskih proizvoda i energije. Ukupno potraživanje AVP Sava prema KOKSARA doo LUKAVAC za proizvodnju koksa, hemijskih proizvoda i energije, prijavljeno je kao potraživanje povjerioca u stečajnom postupku (na broj predmeta: 32 0 St 494441 25 St) u zakonskom roku. U trenutku pisanja Izvještaja status ovog obveznika još nije riješen.

Sa ostalim obveznicima iz gornje tabele, održani su sastanci i od strane ovlaštenih predstavnika AVP Sava izvršena je kontrola obračuna PVN i plaćanja obaveza po osnovu PVN. Od strane obveznika iskazana je spremnost plaćanja dugovanja. Međutim, nezavidna finansijska situacija ovih preduzeća, sa malom likvidnošću, je dovela do ostvarenja dugovanja po osnovu vodnih naknada.

Svim dužnicima iz gore navedenih tabela poslane su opomene za neplaćanje dugovanja. Opomene sa analitičkim karticama su dostavljene i Federalnom vodnom inspektoratu. Zapisnici sa izvršenih kontrola su dostavljeni Poreznoj upravi i Federalnom vodnom inspektoratu.

KOMUNALNA PREDUZEĆA

Pravna i fizička lica koja upravljaju vodovodnim, odnosno kanalizacionim sistemom (komunalna preduzeća), stepen zagađenja odnosno EBS utvrđuju množenjem količine ukupne isporučene vode prema pojedinim korisnicima izraženo u m3. Obračunavanje i plaćanje PVN za zaštitu voda vrši se do 20. u mjesecu za prethodni mjesec. Komunalna preduzeća koja imaju ugrađene uređaje za tretman otpadnih voda i čija ukupna godišnja količina EBS-a prelazi 500 ES, PVN za zaštitu voda plaćaju preko izvještaja o rezultatima ispitivanja tereta zagađenja otpadnih voda.

PVN za korištenje voda komunalna preduzeća obračunavaju množenjem količine zahvaćene vode u obračunskom periodu izražene u m3.
Komunalna preduzeća dostavljaju AVP Sava mjesečne izvještaje o količinama isporučene vode, „IV" obrasce (ako nemaju prečistač), kao i mjesečne izvještaje o količinama zahvaćene vode, „ZV" obrasce. Ovi izvještaji su propisani Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH", broj 92/07, 46/09, 79/11, 88/12, 03/16), na način određen tim Pravilnikom.
Zaključno sa 31.12.2025. godine u evidenciji AVP Sava evidentirana su 64 komunalna preduzeća i druga društva koja vrše zahvatanje i distribuciju vode.

U narednoj tabeli navedena su komunalna preduzeća i druga društva koji imaju značajnija dugovanja po osnovu PVN zaključno sa 31.12.2025. godine:

R.B.	Naziv obveznika	Dug (KM)
1.	JP Rad Lukavac	-477.949,05
2.	JKP Bašbunar TRAVNIK	-346.629,24
3.	BAGS-Energotehnika d.d. Vogošća	-374.164,40
4.	JP Vodovod d.o.o. Bihać	-198.232,32
5.	JP Komunalno d.o.o. Breza	-124.836,48
6.	JKP Vodovod i kanalizacija Bugojno	-94.630,68
7.	JP Vilenica Novi Travnik	-120.071,81
8.	JKP Trebišnjica Nova Bila	-42.741,41

Iako su općine/gradovi osnivači komunalnih preduzeća, najteža situaciju u odnosu na ostvarena dugovanja po osnovu neplaćanja PVN je prepoznata upravo kod ove kategorije obveznika. Direktor AVP Sava je u proteklom periodu u 2025. godini, veliki značaj dao razgovorima sa općinama/gradovima upravo na dugovanjima ove kategorije obveznika i iznalaženjem rješenja za izmirenje ovih dugovanja.

Opomene za neplaćanje dugovanja su poslane obveznicima. Opomene sa tabelarnim prikazom duga su dostavljene Federalnom vodnom inspektoratu. Sa jednim brojem dužnika su održani sastanci. Usaglašeno je dugovanje i zapisnički konstatovano koje iznose dugovanja iz prethodnog perioda će komunalna preduzeća uplatiti tokom godine uz redovno uplaćivanje tekućih obaveza.

„MALI" OBVEZNICI

U 2025. godini, registrovano je ukupno 659 tzv. „malih obveznika", obveznici čiji godišnji teret zagađenja iznosi manje od 500 EBS. Većina „malih obveznika" je redovna u plaćanju svojih obaveza i nemamo evidentirana velika dugovanja. Poslane su opomene za neplaćanja i nedostavljanje obrazaca svim obveznicima koji ne ispunjavaju svoje obaveze u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.

U kategoriji „benzinske pumpe" u 2025. godini evidentirano je ukupno 621 obveznik. Mali broj benzinskih pumpi ne izmiruje svoje obaveze koje se odnose na obračun i plaćanje PVN dok većina svoje obaveze izvršava redovno.

U toku 2025. godine poslane su opomene za neplaćanje obveznicima koji su imali dugovanja kao i obveznicima koji nisu na vrijeme dostavljali mjesečne obrasce.

PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda

PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu (722523) naplaćena je 757.011,55 KM ili 94,62 % planiranog iznosa za 2025. godinu, što je za 2,91 % veće u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini (735.576,35). Osnovica za obračunavanje ove PVN je m^3 zahvaćene vode. Najveći obveznici kod ove vrste PVN su komunalna preduzeća koja korisnike snabdijevaju vodom. U programu naplate vodnih naknada evidentirano je 63 komunalnih preduzeća i 1 (ostali) društava koji vrše zahvatanje i distribuciju vode potrošačima.

PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda za flaširanje voda i mineralnih voda, uzgoj ribe u ribnjacima, za navodnjavanje i druge namjene (722524) naplaćena je u ukupnom iznosu 185.948,93 KM ili 92,97 % od planiranog iznosa za 2025. godinu, što predstavlja 6,51 % više od ostvarenih prihoda po ovoj vrsti naknade u prethodnoj godini (174.567,37KM).

PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda za industrijskih procese, uključujući termoelektrane (722525) naplaćena je u ukupnom iznosu od 766.198,71 KM ili 95,77 % od planiranog iznosa za 2025. godinu, što predstavlja skro isto ostvarenje prihoda po ovoj vrsti naknade u prethodnoj godini (765.681,17KM). U ovu grupu obveznika spadaju pravna lica koja zahvataju vodu za vlastite potrebe iz vodotoka, vlastitih bunara i drugih izvora.

PVN za korištenje voda za proizvodnju električne energije (722526) naplaćena je u iznosu od 178.916,66 KM ili 51,10 % u odnosu na planirane za 2025. godinu ili za 9,10 % više u odnosu na naplaćene u prethodnoj godini (163.987,60KM).

U narednoj tabeli navedena su preduzeća – **hidroelektrane** koje imaju dugovanja po osnovu PVN zaključno sa 31.12.2025. godine:

R.B.	NAZIV OBAVEZNIKA	DUG (KM)
1.	MHE V – I doo Vitez	-3.920,05
2.	FEko – Energy doo Zenica	-2.499,67
3.	Elektro Grupa dd Gorni Vakuf	-1.166,41

PVN za vađenje materijala iz vodotoka

PVN za vađenje materijala iz vodotoka (722527) naplaćena je u iznosu od 13.160,35 KM ili 65,80 % u odnosu na planirane za 2025. godinu ili za 84,85 % manje u odnosu na prethodnu godinu (86.874,48KM).

U toku 2015. godine na snagu je stupila Uredba kojom je regulisana procedura davanja prava na vađenje materijala iz vodotoka (˝Službene novine Federacije BiH˝, broj 58/15). U skladu

sa Uredbom AVP Sava je u 2025. godini potpisala ugovore i izdala isto toliko vodnih akata za vađenje materijala na 8 lokacija. Jedan dio materijala je u skladu sa ugovorima, izvađen u toku 2025. godine i iznos zaduženja je uplaćen. Ugovori za vađenje materijala iz vodotoka nisu u potpunosti realizovani zbog loših hidroloških uslova i nemogućnosti uvođenja izvođača u posao.

Služba za prikupljanje vodnih naknada, tokom cijele 2025. godine, je bila u usmenoj ili pismenoj komunikaciji sa obveznicima dajući uputstva o načinu obračunavanja i plaćanja vodnih naknada, šaljući opomene za neplaćanje, nedostavljanje izvještaja i dr. Podaci o količinama dobiveni putem obrazaca koje dostavljaju obveznici unošeni su u program, a od strane kantonalnih trezora zaprimani su podaci o plaćanjima (uspostavljena je softverska povezanost). Tako da AVP Sava ima uspostavljenu bazu podataka o količinama zahvaćene/isporučene vode, teretu zagađenja, izvađenom materijalu iz vodotoka kao i plaćanjima vodnih naknada.
Nastavljena je kontinuirana saradnja sa vodnom inspekcijom koja kod obveznika, pored ostalog, kontroliše i plaćanja vodnih naknada i u direktnoj je saradnji sa Službom za prikupljanje vodnih naknada.
Sa 31.12.2025. godine ukupna potraživanja po osnovu PVN, a koji pripadaju AVP Sava (40% od ukupnog znosa dugovanja obveznika plaćaja PVN) iznose 5.186.352,27 KM. Od ukupnog iznosa potraživanja, ista su knjižena na dva konta, i to: 131113 potraživanja za vodne naknade koja se odnose na potraživanja do 5 godina starosti i 131351 sumnjiva i sporna potraživanja koja se odnose na potraživanja preko pet godina starosti.

Unutar konta 131113 iznos (40%) od 1.377.323,92 KM se odnosi na sljedeće vrste prihoda:
- 722522 (PVN za zaštitu voda) u iznosu od 832.990,44 KM
- 722523 (PVN za korištenje voda – komun. preduzeća) u iznosu od 152.241,94 KM
- 722524 (PVN za korištenje voda – flaširanje vode) u iznosu od 63.196,80 KM
- 722525 (PVN za korištenje voda – industrija i termoel.) u iznosu od 175.311,98 KM
- 722526 (PVN korištenje voda – hidroelektrane) u iznosu od 52.050,47 KM
- 722527 (PVN za vađenje mat.iz vodotoka) 101.532,29 KM

Unutar konta 131351 iznos (40%) od 3.809.028,35 KM se odnosi na sljedeće vrste prihoda:
- 722522 (PVN za zaštitu voda) u iznosu od 3.227.863,11 KM
- 722523 (PVN za korištenje voda – komun. preduzeća) u iznosu od 313.056,81 KM
- 722524 (PVN za korištenje voda – flaširanje vode) u iznosu od 12.078,74 KM
- 722525 (PVN za korištenje voda – industrija i termoel.) u iznosu od 255.429,30 KM
- 722526 (PVN korištenje voda – hidroelektrane) u iznosu od 390,99 KM
- 722527 (PVN za vađenje mat.iz vodotoka) 209,40 KM

Pregled ostvarenja prihoda od vodnih naknada po kantonima i vrstama u 2025. godini može se vidjeti iz naredne tabele:

PREGLED
OSTVARENJA PRIHODA OD VODNIH NAKNADA PO VRSTAMA I KANTONIMA U 2025. GODINI

VRSTA VODNE NAKANDE	***Usko-sanski kanton***	***Posavski kanton***	***Tuzlanski kanton***	***Zeničko-dobojski kanton***	***Bosansko-podrinjski kanton***	***Srednjo-bosanski kanton***	***Sarajevski kanton***	***Dio Kantona 10 (Općina Drvar)***	***UKUPNO (2 do 9)***
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***
Registracija vozila - 722521	618.772,12	97.205,80	1.404.892,44	1.124.391,91	72.501,98	696.047,49	1.591.623,51	16.716,28	**5.622.151,53**
Zaštita voda – 722522	128.390,52	26.358,23	1.132.635,36	472.498,67	22.359,84	156.934,62	368.314,85	680,63	**2.308.172,72**
Korištenje voda za vodoopskrbu- 722523	86.171,31	7.454,72	134.972,73	99.158,21	5.631,97	62.634,08	360.562,83	425,70	**757.011,55**
Korištenje voda-ostalo - 722524	17.101,32	1.981,99	5.119,71	48.733,37	1.875,20	79.518,59	31.610,75	8,00	**185.948,93**
Korištenje voda-industrija - 722525	4.124,05	41,67	385.469,14	331.815,15	813,76	18.607,39	25.327,55		**766.198,71**
Korištenje voda-hidroelektrane - 722526	17.884,89	72,23	3.312,68	8.305,99	2.997,37	142.737,74	3.605,76		**178.916,66**
Vađenje mat. iz vodotoka - 722527	50,80	2.005,28	24,56	7.246,03	562,33	3.269,24	2,11		**13.160,35**
Opća vodna naknada -722529	831.073,09	163.014,15	2.685.280,75	1.862.853,85	183.592,12	1.153.050,57	5.577.689,57	12.843,76	**12.469.397,86**
UKUPNO:	**1.703.568,10**	**298.134,07**	**5.751.707,37**	**3.955.003,18**	**290.334,57**	**2.312.799,72**	**7.958.736,93**	**30.674,37**	**22.300.958,31**

Ostali neoporezivi prihodi
Iz ostalih izvora prihoda u 2025. godini ostvareno je ukupno 662.615,48 KM, što predstavlja 220,87 % u odnosu na planirani iznos za 2025. godinu.

Ostali neoporezivi prihodi (720000) u iznosu od 662.615,48 KM su naplaćeni iz sljedećih izvora:

- Prihodi po osnovu naplaćenih kamata od kredita radnika (721212) 35,97 KM
- Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra (721220) 15.756,24 KM
- Dividenda primljena od učešća u kapitalu – Zavod za vodoprivredu" dd Sarajevo (721350) 136.096,81 KM
- Prihodi od izdavanja vodnih akata (722613) 27.653,82 KM
- Naplata refundacije bolovanja radnika (722614) 26.166,41 KM
- Refundacija i povrat sredstava (7226141) 456.906,23 KM
  (Povrat neutrošenih sredstava općina Visoko 450.000,00 KM i refundacija troškova radnika AVP Sava ostvarenih zbog prisustvovanja sastancima Savske komisije)

Ostvareni primici
Ostvareni primici od finansijske imovine su u ukupnom iznosu od 3.012,03 KM; a odnose se na naplaćene otplate po stambenom kreditu datim radnicima u poslijeratnim godinama. Jedan radnik je u potpunosti izmirio sva svoja dugovanja iz stambenog kredita prema AVP Sava.

II OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA U 2025. GODINI

Ukupno ostvareni rashodi AVP Sava u 2025. godini iznose 16.349.185,27 KM. U nabavku stalnih sredstava utrošeno je 440.479,88 KM, a u otplatu kredita je realizovano 162.753,79 KM što ukupno čini iznos od 16.952.418,94 KM. Utrošena sredstva u nabavku stalnih sredstva i otplatu kredita ne predstavljaju rashode nego čine izdatke.

Ostvareni rashodi sa utrošenim sredstvima za nabavku stalnih sredstava i otplatu kredita predstavljaju ukupnu realizaciju Plana i Finansijskog plana AVP Sava za 2025. godinu u iznosu od 16.952.418,94 KM ili 51 % u odnosu na planirani iznos za 2025. godinu. Realizacija ugovorenih, a nerealizovanih radova i usluga nastaviće se u 2026. godini i finansirat će se iz akumuliranih sredstava viška prihoda nad rashodima iz prethodnih godina.

U nastavku teksta daje se finansijska realizacija Plana i Finansijskog plana AVP Sava za 2025. godinu sa sljedećim kolonama: rednim brojem, ekonomskim kodom, naziv rashoda/izdataka, planirani i realizovani iznos i procenat izvršenja.

Red.br./ stavka plana	EKONOMSKI KOD	RASHODI I IZDACI	PLAN ZA 2025. U KM	IZVRŠENJE PLANA 2025. GOD. U KM	IZVRŠENJE PLANA 2025. GOD. U %
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	611100	Bruto plaće i naknade plaća	4.300.000,00	3.914.352,92	91
	611200	Naknade troškova zaposlenih	546.350,00	446.625,68	82
1.	**611000**	**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**4.846.350,00**	**4.360.978,60**	**90**
2.	**612000**	**Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi**	**538.500,00**	**321.227,49**	**60**
	613100	Putni troškovi	100.000,00	83.108,66	83
	613200	Izdaci za energiju	395.000,00	244.020,22	62
	613300	Izdaci za komunikacije i komunalne usluge	100.000,00	70.775,76	71
	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	410.000,00	287.517,37	70
	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	40.000,00	27.287,58	68
	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	20.000,00	19.353,95	97
	613700	Izdaci za tekuće održavanje	480.000,00	378.187,70	79
	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	36.000,00	20.085,55	56
	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	574.000,00	425.376,11	74
3.	**613000**	**Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge**	**2.155.000,00**	**1.555.712,90**	**72**
4.	**614000**	**Tekući transferi i drugi tekući rashodi**	**25.161.845,09**	**10.461.114,71**	**42**
5.	**616000**	**Izdaci za kamate**	**20.000,00**	**13.133,54**	**66**
6.	**617000**	**Tekuća rezerva**	**292.009,25**	**32.923,92**	**11**
		Ukupni rashodi (1+2+3+4+5+6):	**33.013.704,34**	**16.745.091,16**	**51**
7.	**821000**	**Izdaci za nabavku stalnih sredstava**	**157.000,00**	**44.573,99**	**28**
8.	**823000**	**Otplata kredita**	**200.000,00**	**162.753,79**	**81**
		Ukupni rashodi (od 1. do 8.):	**33.370.704,34**	**16.952.418,94**	**51**
1.	**611000**	**PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH**	**4.846.350,00**	**4.360.978,60**	**90**
	611100	Bruto plaće i naknade plaće	4.300.000,00	3.914.352,92	91
	611110	Neto plate	2.600.000,00	2.597.941,77	100

	611130	Doprinosi na teret zaposlenih	1.700.000,00	1.316.411,15	77
	611200	Naknade troškova zaposlenih	546.350,00	446.625,68	82
	611211	Prevoz na posao i sa posla	75.000,00	56.117,40	75
	611213	Naknada troškova smještaja	3.100,00	3.055,00	99
	611214	Naknada troškova odvojenog života	1.250,00	1.250,00	100
	611221	Naknada za topli obrok tokom rada	230.000,00	225.227,52	98
	611224	Regres za godišnji odmor	60.000,00	56.158,00	94
	611225	Otpremnina zbog odlaska u penziju	82.000,00	39.680,56	48
	611226	Jubilarne nagrade, darovi za djecu, praznične nagrade i dr.	35.000,00	32.002,20	91
	611227	Pomoć u slučaju smrti	30.000,00	18.810,00	63
	611228	Pomoć u slučaju teže invalidnosti i bolesti	30.000,00	14.325,00	48
2.	**612000**	**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**538.500,00**	**321.227,49**	**60**
3.	**613000**	**Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge**	**2.155.000,00**	**1.555.712,90**	**72**
	613100	Putni troškovi	100.000,00	83.108,66	83
	613110	Putni troškovi u zemlji	30.000,00	29.727,60	99
	613120	Putni troškovi u inostranstvu	60.000,00	49.310,33	82
	6131201	Putni troškovi u inostranstvo za potrebe poslovanja Agencije	20.000,00	19.834,13	99
	6131202	Putni troškovi u inostranstvo (članovi dunavske i savske komisije i drugih državnih tijela)	40.000,00	29.476,20	74
	613190	Ostale naknade putnih i drugih troškova	10.000,00	4.070,73	41
	613200	Izdaci za energiju	395.000,00	244.020,22	62
	613211	Izdaci za električnu energiju	375.000,00	236.680,46	63
	6132111	Izdaci za električnu energiju Agencije	75.000,00	72.459,33	97
	6132112	Izdaci za električnu energiju crpnih i vodomjernih stanica	300.000,00	164.221,13	55
	613216	Izdaci za gas	20.000,00	7.339,76	37
	613300	Izdaci za komunikacije i komunalne usluge	100.000,00	70.775,76	71
	613311	Izdaci za telefon, telefaks i teleks	40.000,00	26.535,14	66

	6133111	Troškovi za telefon, telefaks i teleks za potrebe rada Agencije	15.000,00	10.775,31	72
	6133112	Troškovi za telefon, telefaks i teleks za potrebe rada centra odbrane od poplava, čuvarskih kuća i vodomjernih stanica	15.000,00	12.550,57	84
	613113	Troškovi internet usluga za potrebe AVP Sava i backup sistema prognoze poplava Sava FFWS	10.000,00	3.209,26	32
	613312	Izdaci za internet i održavanje web portala	18.000,00	7.895,38	44
	613313	Izdaci za mobilni telefon	5.000,00	4.393,43	88
	613314	Poštanske usluge	18.000,00	17.420,16	97
	613316	Ostale usluge iz oblasti komunalija	3.500,00	863,00	25
	613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	8.500,00	7.665,77	90
	613323	Izdaci za usluge odvoza smeća	7.000,00	6.002,88	86
	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	410.000,00	287.517,37	70
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal			
	613416	Sitan inventar	1.000,00	185,00	19
	613417	Kancelarijski materijal	24.000,00	15.178,83	63
	613418	Auto gume i HTZ oprema	7.000,00	1.021,47	15
	613423	Laboratorijski materijal	350.000,00	256.433,16	73
	613431	Izdaci za obrazovni materijal	10.000,00		
	613484	Materijal za čišćenje	18.000,00	14.698,91	82
	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	40.000,00	27.287,58	68
	613512	Dizel gorivo za prevoz	30.000,00	23.763,38	79
	613523	Registracija motornih vozila	10.000,00	3.524,20	35
	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	20.000,00	19.353,95	97
	613611	Unajmljivanje prostora ili zgrade	20.000,00	19.353,95	97
	613700	Izdaci za tekuće održavanje	480.000,00	378.187,70	79
	613722	Usluge popravaka i održavanja opreme	50.000,00	23.530,82	47
	613723	Usluge popravke i održavanja vozila	30.000,00	23.943,40	80
	613727	Ostale usluge opravke i održavanja	400.000,00	330.713,48	83

	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	36.000,00	20.085,55	56
	613813	Osiguranje vozila (kasko i obavezno osiguranje)	11.000,00	8.593,52	78
	613814	Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje	6.000,00	4.200,00	70
	613815	Osiguranje imovine	6.000,00		
	613822	Izdaci platnog prometa	13.000,00	7.292,03	56
	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	574.000,00	425.376,11	74
	613911	Usluge medija	25.000,00	5.012,96	20
	613912	Usluge štampanja	10.000,00	7.792,20	78
	613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	20.000,00	13.609,80	68
	613914	Usluge reprezentacije	65.000,00	29.897,30	46
	6139141	Usluge reprezentacije za redovno poslovanje Agencije	15.000,00	10.721,30	71
	6139142	Usluge reprezentacije za potrebe prezentacije projekata, obilježavanja Svjetskog dana voda i dr.	42.500,00	11.938,00	28
	6139143	Usluge reprezentacije za potrebe održavanja sastanaka EG za zaštitu od poplava ICPDR	7.500,00	7.238,00	97
	613915	Ostale stručne usluge	6.000,00		
	613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	70.000,00	44.141,22	63
	613920	Usluge za stručno obrazovanje	20.000,00	16.025,02	80
	613930	Izdaci za stručne usluge	90.000,00	89.233,10	99
	613940	Izdaci za medicinske i laboratorijske usluge	60.000,00	27.581,90	46
	613970	Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada	163.000,00	151.281,81	93
	6139701	Naknada članovima Upravnog odbora	80.000,00	80.024,78	100
	6139702	Naknada članovima Nadzornog odbora	60.000,00	52.228,84	87
	6139703	Ugovori o autorstvu	3.000,00		
	6139704	Ugovori o djelu	20.000,00	19.028,19	95

	613980	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada	35.000,00	31.947,67	91
	613990	Ostale usluge i dadžbine	10.000,00	8.853,13	89
4.	**614000**	**Tekući transferi i drugi tekući rashodi**	**25.161.845,09**	**10.461.114,71**	**42**
	614819	**OSTALI TEKUĆI RASHODI - RASHODI SEKTORA VODA**	**25.161.845,09**	**10.461.114,71**	**42**
A.	**6148191**	**UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE**	**3.118.305,44**	**1.616.711,51**	**52**
A.1.	**61481911**	**IZRADA STRATEŠKO - PLANSKE DOKUMENTACIJE**	**1.900.000,00**	**599.022,45**	**32**
A.1.1.	614819111	Ažuriranje Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022-2027.)	600.000,00	599.022,45	100
A.1.2.	614819112	Ažuriranje preliminarne procjene rizika od poplava na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH	300.000,00		
A.1.3.	614819113	Studija stanja podzemnih voda vodnog područja rijeke Save u Federacije BiH i procjena rizika po kvalitet i rezerve podzemnih voda	1.000.000,00		
A.2.	**61481912**	**MONITORING VODA**	**874.953,00**	**804.409,75**	**92**
A.2.1.	614819121	Automatski hidrološki monitoring sistem na vodnom području rijeke Save u FBiH	610.000,00	564.435,51	93
A.2.2.	614819122	Hidrometrijska mjerenja na vodnom području rijeke Save u FBiH (4 serije)	55.000,00	39.922,74	73
A.2.3.	614819123	Angažovanje ovlaštene laboratorije za posloveuzorkovanja voda za potrebe hitne intervencije u slučaju incidentnih zagađenja	10.000,00	98,50	1
A.2.4.	614819124	Ihtiološko istraživanje sliva rijeke Save u Federaciji BiH u 2025. godini	199.953,00	199.953,00	100

A.3.	**61481913**	**INFORMACIONI SISTEM VODA (ISV)**	**343.352,44**	**213.279,31**	**62**
A.3.1.	614819131	Održavanje informacionog sistema voda u AVP Sava	139.852,44	139.852,44	100
A.3.2.	614819132	AI chabot sistem u AVP Sava – korištenje licence na godišnjem nivou	7.000,00	4.201,47	60
A.3.3.	614819133	Nadogradnja ISV sistema u skladu sa potrebama AVP Sava (zajednička nabavka sa AVP Jadranskog mora Mostar)	45.000,00		
A.3.4.	614819134	Troškovi održavanja sistema prognoze od poplava	120.000,00	62.252,20	52
A.3.4.1.	6148191341	Troškovi održavanja platforme za prognoznu poplava MIKE	90.000,00	41.319,99	46
A.3.4.2.	6148191342	Troškovi održavanja hidrološke platforme WISKI	30.000,00	20.932,21	70
A.3.5.	614819135	Troškovi održavanja backup i sigurnosnog sistema AVP Sava (Fortinet i antivirus)	7.500,00	6.973,20	93
A.3.6.	614819136	Unapređenje WISKI WEB PUBLIC aplikacije za prikaz hidrolioških podataka	24.000,00		
B.	**6148192**	**TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE**	**8.622.835,31**	**4.051.914,00**	**47**
B.1.	**61481921**	**ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI U VLASNIŠTVU FEDERACIJE BiH**	**2.635.100,75**	**2.249.598,38**	**85**
B.1.1.	614819211	Troškovi pripreme i tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Federacije BiH	2.635.100,75	2.249.598,38	85
B.1.1.1.	6148192111	Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Srednje Posavine	849.040,96	759.062,95	89
B.1.1.2.	6148192112	Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Odžačke Posavine	1.095.948,09	1.078.458,94	98
B.1.1.3.	6148192113	Tekuće održavanje zaštitnog vodnog objekta CS Đurići - Vučilovac na području Brčko Distrikta	100.500,00	79.811,05	79
	6148192114	Tehničko osmatranje brana i akumulacija Hazna i Vidara u Gradačcu	40.000,00	38.844,00	

B.1.1.4.					97
B.1.1.5.	6148192115	Tehnička zaštita objekata sistema odbrane od poplava i laboratorije za vode AVP Sava - Butile	40.000,00	32.627,22	82
B.1.1.6.	6148192116	Troškovi odbrane od poplava na područjima koja su u nadležnosti AVP Sava	200.000,00	116.612,73	58
B.1.1.7.	6148192117	Sanacija i aktivnosti na otklanjanju posljedica štetnog djelovanja voda na objektima u vlasništvu FBiH (FOP član 7)	150.000,00	34.633,17	23
B.1.1.8.	6148192118	Pripremne mjere i radovi na objektima u vlasništvu FBiH (FOP član 5)	150.000,00	99.936,62	67
B.1.1.9.	6148192119	Tehnički prijem za izvedene radove rekonstrukcije zaštitnog vodnog objekta - Savskog odbrambenog nasipa na području Srednje Posavine	9.611,70	9.611,70	100
B.2.	**61481922**	**PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I RADOVI ODBRANE OD POPLAVA NA POVRŠINSKIM VODAMA I KATEGORIJE**	**5.801.734,56**	**1.785.771,80**	**31**
B.2.1.	**614819221**	**Izrada projektne dokumentacije**	**105.635,27**		
B.2.1.1.	6148192211	Inoviranje projektne dokumentacije i izrada elaborata za radove na obezbjeđenju proticajnog profila na vodotocima I kategorije	50.000,00		
B.2.1.2.	6148192212	Izrada projektne dokumentacije - čišćenje korita rijeke Bosne u Zenici, na lokaciji od Energopetrolove pumpe do petlje na magistralnoj cesti M17, u			
B.2.1.3.	6148192213	Izrada projektne dokumentacije za uređenje dijela korita rijeke Spreče na lokalitetu Oključak-Industrijska zona u Općini Doboj Istok	4.190.94		

B.2.1.4.	6148192214	Izrada Glavnog projekta: Sanacija obala rijeke Une u Bihaću na potezu Bakšaiški i Vrkašićki most			
B.2.1.5.	6148192215	Izrada projektne dokumentacije za zaštitu obale Une od erozije na 6 lokaliteta u Gradu Bosanska Krupa	9.358.83		
B.2.1.6.	6148192216	Izrada projektne dokumentacije za regulaciju korita rijeke Tinje u Srebreniku uzvodno od mosta Salihovića u MZ Tinja Donja – nastavak	5.148.00		
B.2.1.7.	6148192217	Izrada glavnog projekta za čišćenje i uredjenje korita rijeke Drine na dionici vodotoka od Ustikoline do Goražda u svrhu razvoja turizma na prostoru Bosanskopodrinsjog kantona			
B.2.1.8.	6148192218	Izrada glavnog projekta za obaloutvrde u naseljima Rudenice i Velecevo i uredjenje lijeve obale rijeke Sane u naselju Donji Kamičak sa sanacijom brane u opcini Kjuč	10.939.50		
B.2.1.9.	6148192219	Izrada Glavnog projekta za sanaciju brane Župica u Drvaru	10.998.00		
B.2.1.10.	61481922210	Izrada Glavnog projekta sanacije parapetnog zida na odbrambenom nasipu uz rijeku Bosnu u naselju Neteka, opcina Odžak	15.000.00		
B.2.2.	**614819222**	**Preventivni radovi na odbrani od poplava**	**5.696.099.29**	**1.785.771,80**	**31**
B.2.2.1.	6148192221	Čišcenje i uređenje vodotoka I kategorije na području Federacije BiH	250.000.00		
	6148192222	Uređenje desne obale rijeke Bosne u Maglaju nizvodno od Gradskog mosta do ušća rijeke Jablanice u rijeku Bosnu u dužini od 2900 m. - realizacija IV	420.000.00		

B.2.2.2.					
B.2.2.3.	6148192223	Uređenje korita rijeke Tinje na lokaciji buduće industrijske zone u Gradu Srebrenik – nastavak radova	300.000,00		
B.2.2.4.	6148192224	Sanacija obale rijeke Tinje u MZ Špionica, Grad Srebrenik	130.000.00		
B.2.2.5.	6148192225	Sanacija korita rijeke Tinje u MZ Špionica, Grad Srebrenik	200.000,00		
B.2.2.6.	6148192226	Zaštita obala rijeke Usore u Tešnju u naselju Kalošević na četiri lokacije ukupne dužine 1500 m, općina Tešanj (Dionica 1 – Lijeva obala uzvodno od mosta L=109 m)	180.000,00		
B.2.2.7.	6148192227	Uređenje korita rijeke Bosne u Zavidovićima	699.066,08	699.043,25	100
B.2.2.8.	6148192228	Uređenje vodotoka rijeke Bosne kroz Žepče	798.947,32	798.947,15	100
B.2.2.9.	6148192229	Nastavak izvođenja radova na izgradnji regulacije korita rijeke Željeznice u MZ Otes/MZ Osjek nizvodno od P23 prema ušću u rijeku Bosnu, Općina Ilidža	470.000,00	287.781,40	61
B.2.2.10.	61481922210	Regulacija rijeke Spreče u Lukavcu, dionica uzvodno od koksarinog mosta do regulisanog dijela u dužini od 450 m	950.000,00		
B.2.2.11.	61481922211	Uređenje korita rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu-Uskoplju	300.000,00		
B.2.2.12.	61481922212	Izgradnja obaloutvrde na desnoj obali rijeke Une u naselju Pokoj II faza, Grad Bihać			
B.2.2.13.	61481922213	Obezbjeđenje proticajnog profila korita rijeke Spreče u gradu Gračanica, MZ Gračanica na lokaciji od mosta za Sočkovac do bazena Terme u dužini od 98m	400.000,00		
B.2.2.14.	61481922214	Obezbjeđenje proticajnog profila rijeke Bosne na lokalitetu Malešići na potezu	300.000,00		

		između dva mosta ns regionslnoj cesti dionica Donja Vogošća - Malešići,			
B.2.2.15.	61481922215	Regulacija rijeke Vrbas u naselju Pavić polje, općina Gornji Vakuf - Uskoplje (zajedno sa stavkom C.2.11.)	120.000,00		
B.2.2.16.	61481922216	Obezbjeđenje proticajnog profila korita rijeke Spreče u Gradu Gračanica, MZ Pribava na lokaciji Jasenovac - Prijedor u dužini od 550 m (zajedno sa stavkom C.2.30.)	178.085,89		
B.3	**61481923**	**STRUČNE USLUGE NA REALIZACIJI POSLOVA AGENCIJE**	**186.000,00**	**16.543,82**	**9**
B.3.1.	614819231	Priprema programa radova, elaborata, stručnih mišljenja, podzakonskih akata i dr.	71.000,00	6.832,80	10
B.3.2.	614819232	Revizija tehničke dokumentacije	20.000,00		
B.3.3.	614819233	Stručni nadzor na realizaciji projekta AVP Sava	90.000,00	9.711,02	11
B.3.4.	614819234	Stručni poslovi po nalogu inspekcije	5.000,00		
C.	**6148193**	**OSTALI TEKUĆI RASHODI – RASHODI SEKTORA VODA**	**13.420.704,34**	**4.792.489,20**	**36**
C.1.	61481931	PRENESENI UGOVORENI RADOVI I USLUGE IZ 2024. GODINE KOJI SE FINANSIRAJU IZ VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA	4.052.654,99	3.467.008,55	86
C.1.1.	614819311	Vršenje usluga revizije na projektu: Izrada projektne dokumentacije za obezbjeđenje proticajnog profila rijeke Sanice na lokaciji 200 m nizvodno i 150	462,15	462,15	100
C.1.2.	614819312	Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektu: Regulacija lijeve obale rijeke Bosne u Maglaju, dionica Škola-Gradski most	4.680,00	4.680,00	100

C.1.3.	614819313	Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem rad. na projektu: Nastavak izvođenja rad. na izgradnji reg korita rijeke Željeznice na Ilidži u MZ Otes/MZ Osjek na dionici od P27 do P23	3.422,25	3.422,25	100
C.1.4.	614819314	Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektu: Izvođenje radova na zaštiti od erozije Zelenih otoka u Bosanskoj Krupi - nastavak radova	6.844,50	6.844,50	100
C.1.5.	614819315	Vršenje usluga nadzora nad izvođ. rad. na projek: Zaštita i uređenje desne obale rijeke Sane u Ključu, dionica uzvodno od vodenice i novoizgrađene brane Zgon u dužini cca 200 m	4.212,00	4.212,00	100
C.1.6.	614819316	Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektu: Obezbjeđenje proticanog profila rijeke Spreče u Gračanici na Lokaciji 2 - MZ Donja Orahovica na dionici iz Miričine u dužini od 650,83 m nizvodno od očišćenog dijela	4.797,00	4.797,00	100
C.1.7.	614819317	Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektu: Zaštita lijeve obale rijeke Usore u naselju Jelah u Tešnju, dionica nizvodno od mosta za Prnjavor	6.844,50		
C.1.8.	614819318	Vršenje usluga nadzora na projektu: Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Zavidovićima, dionica od P20 do P8 u dužini cca 370 m	6.435,00	6.435,00	100
C.1.9.	614819319	Vršenje usluga nadzora na projektu: Vađenje materijala iz vodotoka rijeka Drina, Vrbas i Una na više lokaliteta na području općina Goražde, Foča u FBiH	4.563,00	936,00	21

C.1.10.	6148193110	Vršenje usluga nadzora na projektu: Vađenje materijala iz vodotoka rijeke Bosne na više lokaliteta na području općina Ze-Do kantona	6.435,00	6.435,00	100
C.1.11.	6148193111	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za uređenje desne obale rijeke Bosne u naselju Mulići, Grad Visoko	6.645,60		
C.1.12.	6148193112	Izrada Glavnog projekta: Zaštita desne obale rijeke Usore u Tešnju na lokaciji paralelno sa jezerom "Jelen" i Uređenje desne obale rijeke Usore u Tešnju u naselju Mrkotić uzvodno od jezera u dužini od 350 m	9.506,25	7.605,00	80
C.1.13.	6148193113	Izrada Glavnog projekta: Uređenje korita rijeke Bosne u Ilijašu na dionici: od mosta na autocesti (granica naselje Kadarići-Luka) uzvodno do mosta na lokalnoj saobraćajnici prema naselj Boča i uređenja korita rijeke Bosne u Ilijašu na dionici: Od postojeće uređene dionice na ušća potoka Gnionica . nizvodno do mosta na autocesti u naselju Obala u MZ Podlugovi	2.545,92		
C.1.14.	6148193114	Izrada Glavnog projekta: Sanacija desne obale rijeke Tinje u Srebreniku u mjestu Tinja Donja na dijelu uzvodno od mosta kod stadiona NK Mladost Tinja do ušća potoka koji ide iz obližnje šume, Regulacija korita rijeke Tinje uSrebreniku na lokaciji od džamije u MZ Bjelave do Klisure, Regulacija korita rijeke Tinje u Srebreniku na lokaciji uzvodno od Kiseljačkog mosta do firme Ingram	3.018,60		

C.1.15.	6148193115	Izrada Glavnog projekta: Parapetni zid Medenjak - Trnova na rijeci Sani u Sanskom Mostu i Sanacija nasipa na lijevoj obali rijeke Sane u Sanskom Mostu nizvodno od Karića mosta i dogradnja istog u dužini od 200 m	12.870,00		
C.1.16.	6148193116	Izrada Glavnog projekta: Sanacija obale - izrada obaloutvrde desne obale rijeke Sanice u Ključu u naselju Vrelo - KČ 1894, KO Sanica u dužini cca 100 m i Uređenje ušća Humičkog potoka u rijeku Sanu u Ključu u naselju Humići u dužini 50 m	7.488,00	5.990,40	80
C.1.17.	6148193117	Izrada Glavnog projekta: Zaštita saobraćajnica od poplava - put Drenova Glavica uz Unu u Bosanskoj Krupi, ulica Unska - Halkići u Bosanskoj Krupi i ulica Unska-Manda u Bosanskoj otoci	7.944,30	6.355,44	80
C.1.18.	6148193118	Izrada Glavnog projekta: Zaštita od voda na lokalitetu između Bakšaiškog i Vrkašićkog mosta, Uređenje lijeve obale Une u Bihaću na lokaciji Golubićko polje gdje je planirana izgradnja međunarodnog aerodroma Bihać i Sanacija lijeve obale rijeke Unac na lokaciji objekta Manastir Rmanj	15.795,00		
C.1.19.	6148193119	Izrada projektne dokumentacije za obezbjeđenje proticajnog profila rijeke Sanice na lokaciji 200 m nizvodno i 1500 m uzvodno od mosta kod benzinske pumpe „Čavkunović"	924,30	924,30	100
C.1.20.	6148193120	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Zavidovićima, dionica nizvodno od izvedenog dijela	817.855,67	809.972,75	99

C.1.21.	6148193121	Regulacija lijeve obale rijeke Bosne u Maglaju, dionica Škola-Gradski most	248.854,09	248.852,33	100
C.1.22.	6148193122	Nastavak izvođenja radova na izgradnji regulacije korita rijeke Željeznice na Ilidži u MZ Otes/MZ Osjek na dionici od P27 do P23	269.917,63	269.844,61	100
C.1.23.	6148193123	Izvođenje radova na zaštiti od erozije Zelenih otoka u Bosanskoj Krupi - nastavak radova	448.545,17	443.318,18	99
C.1.24.	6148193124	Zaštita i uređenje desne obale rijeke Sane u Ključu, dionica uzvodno od vodenice i novoizgrađene brane Zgon u dužini cca 200 m	214.110,00	211.937,05	99
C.1.25.	6148193125	Obezbjeđenje proticajnog profila rijeke Spreče u Gračanici na Lokaciji 2 - MZ Donja Orahovica na dionici od izlaza iz Miričine u dužini od 650,83 m nizvodno od očišćenog dijela	239.955,30	239.812,12	100
C.1.26.	6148193126	Završetak regulacije Bosne nizvodno od petlje Butile i prolaz distributivnog gasovoda ispod korita rijeke Bosne	66.031,00	64.999,35	98
C.1.27.	6148193127	Zaštita lijeve obale rijeke Usore u naselju Jelah u Tešnju, dionica nizvodno od mosta za Prnjavor	358.897,50	85.968,87	24
C.1.28.	6148193128	Sanacija obala rijeke Tinje u MZ Bjelave, Grad Srebrenik	206.825,92	145.004,45	70
C.1.29.	6148193129	Nadzor na projektu Sanacija obala rijeke Tinje u MZ Bjelave, Grad Srebrenik	4.212,00	4.212,00	100
C.1.30.	6148193130	Regulacija rijeke Bosne na području općine Novi Grad, potez nizvodno od petlje Butila na sarajevskoj obilaznici	176.971,54		
C.1.31.	6148193131	Izrada Glavnog projekta: Izrada pragova u koritu rijeke Tinje u cilju poboljšanja vodosnabdjevanja Grada Srebrenika	1.275,30	1.275,30	100

C.1.32.	6148193132	Nabavka opreme i materijala za potrebe provođenja mjera aktivne odbrane od poplava	499.917,60	499.917,60	100
C.1.33.	6148193133	Nadzor na hidrografskom snimanju korita rijeke Save u Federaciji BiH	6.903,00	6.903,00	100
C.1.34.	6148193134	Sanacija objekta Centra odbrane od poplava (COP) Prud na području Odžačke Posavine	36.811,14	36.804,96	100
C.1.35.	6148193135	Nadzor na sanaciji objekta Centra odbrane od poplava (COP) Prud na području Odžačke Posavine	5.265,00	5.265,00	100
C.1.36.	6148193136	Ažuriranje studije hidromorfoloških pritisaka i procjene njihovih uticaja za vodotoke preko 10 km2 površine sliva na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH	119.995,20	119.995,20	100
C.1.37.	6148193137	Ažuriranje studije procjene tereta zagađenja vodnih resursa koja potiču sa deponija krutog otpada na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH	11.232,00	11.232,00	100
C.1.38.	6148193138	Sistematski pregled radnika	10.330,00	10.330,00	100
C.1.39.	6148193139	Nabavka usluga geodetskog snimanja poprečnih profila na lokacijama hidroloških automatskih stanica na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH	99.216,00	98.164,18	99
C.1.40.	6148193140	Nabavka padavinskih/kišomjernih stanica	69.613,83	69.613,83	100
C.1.41.	6148193141	Nabavka mikrobioloških podloga i potrošnog materijala za izvođenje MPN metode (BAS EN ISO 9308-2:2015)	6.756,75	6.756,75	100
C.1.42.	6148193142	Nabavka bioloških i hemijskih indikatora za mikrobiologiju	5.458,44	5.458,44	100
C.1.43.	6148193143	Nabavka i isporuka potrošnog materijala za postojeći instrument VIS	9.670,05	9.670,05	100

		SPEKTROFOTOMETAR HT 200 sa reaktorom			
C.1.44.	6148193144	Validacija i servisiranje postojećeg instrumenta VIS SPEKTROFOTOMETAR HT 200 sa reaktorom i servisom multimetarskog seta HQ seria	1.451,38	1.451,38	100
C.1.45.	6148193145	Nabavka biološkog materijala za izvođenje testa toksičnosti (Daphnija Magna)	1.150,11	1.150,11	100
C.2.	**61481932**	**NOVI RADOVI, NABAVKA ROBA I USLUGA KOJI SE FINANSIRAJU IZ VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA**	**9.368.049,35**	**1.325.480,65**	**14**
C.2.1.	614819321	Glavni projekat izrade pragova u koritu rijeke Usore u cilju poboljšanja vodosnabdijevanja općine Tešanj	25.000,00		
C.2.2.	614819322	Uređenje desne obale rijeke Bosne u Maglaju nizvodno od Gradskog mosta (zajedno sa B.2.2.2.)	580.000,00		
C.2.3.	614819323	Regulacija rijeke Željeznice u Otesu na dionici od P16-P23, općina Ilidža (zajedno sa B.2.2.9.)	1.400.000,00		
C.2.4.	614819324	Regulacija rijeke Spreče u Lukavcu uzvodno od koksarinog mosta, dinica PP1-PP13 dužine 450 m (zajedno sa B.2.2.10.)	500.000,00		
C.2.5.	614819325	Uređenje korita rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu - Uskoplju do profila P17 (zajedno sa B.2.2.11.)	150.000,00		
C.2.6.	614819326	Nastavak uređenja desne obale rijeke Bosne u Zenici, poslovna zona Zenica Jug	1.600.000,00	124.118,57	8
C.2.7.	614819327	Uređenje korita rijeke Plive u Jajcu - dovršetak izgradnje praga broj 12	700.000,00		
C.2.8.	614819328	Hidrografsko snimanje korita rijeke Save u Federaciji BiH	299.688,01	299.688,01	100

C.2.9.	614819329	Obezbjeđenje proticajnog profila Spreče u Gračanici, lokacija od ušća u Lohinjsku rijeku do OŠ u Donjoj Lohinji u dužini od 1200 m	460.000,00		
C.2.10.	6148193210	Regulacja desne obale rijeke Vrbas u Donjem Vakufu u dužini od 100	500.000,00		
C.2.11.	6148193211	Regulacija rijeke Vrbas u naselju Pavić polje, općina Gornji Vakuf- Uskoplje	100.000,00		
C.2.12.	6148193212	Uređenje desne obale rijeke Usore u Tešnju u naselju Mrkotić pored jezera u dužii od 400 m	500.000,00		
C.2.13.	6148193213	Nabavka padavinskih/kišomjernih i hidroloških stanica	100.000,00		
C.2.14.	6148193214	Nabavka analitičke opreme: GC/FPD, TOC/TN i IC za potrebe Laboratorije za vode	500.000,00	108.225,00	22
C.2.15.	6148193215	Nabavka opreme potrebne za rad Laboratorije za vode	138.000,00	99.823,23	72
C.2.16.	6148193216	Nabavka klime uređaja za Laboratoriju za vode	20.000,00	18.133,83	91
C.2.17.	6148193217	Nabavka terenskog motornog vozila	150.000,00	120.000,00	80
C.2.18.	6148193218	Nabavka uređaja za analizu metala ICP/MS	400.000,00		
C.2.19.	6148193219	Sanacija erodirane obale u naselju Crnalići, općina Ključ	100.000,00		
C.2.20.	6148193220	Sanacija pristupnih puteva uz nasipe na području Posavskog kantona, područje Odžačka Posavina	196.667,00	196.667,00	100
C.2.21.	6148193221	Sanacija kanala Svilaj-Potočani na dionci od km 4+115,92 do km 4+497,56, područje Odžačka Posavina	222.582,61	222.582,61	100
C.2.22.	6148193222	Radovi na kruni Savskog odbrambenog nasipa u urbanom području Grada Orašja	136.644,30	136.242,40	100

C.2.23.	6148193223	Igradnja instalacije plinske mreže za dovod specijalnih plinova u Laboratoriji za vode	34.211,97		
C.2.24.	6148193224	Servisna podrška i održavanje implementiranog sistema upravljanja rizicima u Laboratoriji za vode	32.292,00		
C.2.25.	6148193225	Nabavka računarske opreme	29.250,00		
C.2.26.	6148193226	Usluge zbrinjavanja opasnog otpada	20.000,00		
C.2.27.	6148193227	Procjena rizika na radnim mjestima u AVP Sava	35.100,00		
C.2.28.	6148193228	Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova	296.699,35		
C.2.29.	6148193229	Zaštita zemljišta na Velikoj otoci u Ripču	100.000,00		
C.2.30.	6148193230	Obezbjeđenje proticajnog profila korita rijeke Spreče u gradu Gračanica, MZ Pribava na lokaciji Jasenovac - Prijedor (B.2.2.16.)	41.914,11		
5.	**616000**	**IZDACI ZA KAMATE**	**20.000,00**	**13.133,54**	**66**
6.	**617000**	**TEKUĆA REZERVA**	**292.009,25**	**32.923,92**	**11**
7.	**821000**	**IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA**	**157.000,00**	**44.573,99**	**28**
	821311	Kancelarijski namještaj	7.000,00		
	821312	Kompjuterska oprema	50.000,00		
	821351	Laboratorijska oprema	80.000,00	40.514,09	51
	821410	Ostala stalna sredstva	20.000,00	4.059,90	20
8.	**823000**	**OTPLATA KREDITA**	**200.000,00**	**162.753,79**	**81**
		SVEUKUPNO (1.DO 8.)	**33.370.704,34**	**16.952.418,94**	**51**

III OSTVARENI FINANSIJSKI REZULTAT

Iz prezentiranih finansijskih pokazatelja: prihoda, primitaka, rashoda i izdataka može se vidjeti da je AVP Sava ostvarila sljedeći ukupni finansijski rezultat u 2025. godini:

Ostvareni prihod u 2025.godini	**22.963.573,79 KM**
Ostvareni rashod u 2025. godini	**16.349.185,27 KM**
Finansijski rezultat	**6.614.388,52 KM**
+ Primici u 2025.godini	**3.012,03 KM**
- **Izdaci za 2025.godinu**	**603.233,67 KM**
UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT	**6.014.166,88 KM**

Dakle, ukupan finansijski rezultat za 2025. godinu iznosi 6.014.166,88 KM viška prihoda nad rashodima.

IV OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH RASHODA I IZDATAKA U 2025. GODINI

Plaće i naknade troškova zaposlenih (ekonomski kod 611000)

Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u 2025. godini su isplaćene u iznosu 4.360.978,60 KM ili 90% od planiranog iznosa.

Za bruto plate i naknade plate zaposlenih isplaćeno je 3.914.352,92 KM. Bruto plaće zaposlenih su isplaćivane u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju ovu materiju i internim aktima AVP Sava (Pravilnik o radu i unutrašnjoj orgnizaciji i sistematizaciji radnih mjesta). U 2025. godini redovno je isplaćeno 12 plaća. Isplaćena je i pomoć radnicima po Odluci Upravnog odbora VP Sava, a u skladu sa zaključkom Vlade Federacije BiH u ukupnom iznosu od 336.300,00 KM.

Sa 31.12.2025. godine u AVP Sava je bilo zaposleno ukupno 75 radnika. U strukturi zaposlenih, sa 31.12.2025. godine u AVP Sava ima 65 radnika sa VSS, 1 radnik sa VŠS, 6 radnika sa SSS, 1 VKV radnika i 2 NK. AVP Sava ima područne urede sa sjedištima u: Zenici, Jajcu i Bihaću. U Uredu u Zenici su zaposlena dvije radnice, u Uredu u Jajcu tri radnika i u Uredu u Bihaću dva radnika.

Sektor Laboratorije za vode je dislociran od sjedišta AVP Sava i nalazi se u Butilama, u prostorijama koje su vlasništvo AVP Sava. U Laboratoriji za vode je zaposleno 15 radnika.

Isplata naknada troškova zaposlenih je isplaćena u iznosu od 446.625,68 KM, odnosno 82 % od planiranih sredstava. Sve naknade su isplaćene u skladu sa zakonskim propisima i internim aktima AVP Sava. Tako je naknada prevoza na posao i sa posla isplaćivana u iznosu od 53,00 KM do 31.07.2025. godine, a od 01.08.2025.godine u iznosu od 60,00 KM, odnosno 44,50 KM u Zenici. Naknada za međugradski prevoz na posao i sa posla isplaćivana je u skladu sa Pravilnikom o radu i unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u visini povratne mjesečne karte međugradskog prevoza na osnovu potvrde ovlaštenog prevoznika). Naknada za smještaj je isplaćena u mjesečnom iznosu od 611,00 KM, a naknada za odvojen život u mjesečnom iznosu od 250,00 KM.

Naknada za topli obrok tokom rada je isplaćena u visini od 1% od prosječne plaće isplaćene u Federaciji u posljednja tri mjeseca, regres u visini 70% prosječne ostvarene plaće u AVP Sava, naknada za vjerske praznike u visini do 30% prosječne mjesečne plaće u Federaciji BiH po posljednjem objavljenom podatku, otpremnina zbog odlaska u penziju u visini 6 neto plaća radnika koje su mu isplaćene u prethodnih šest mjeseci (isplaćene su otpremnine za tri

radnika), naknada za vjerske praznike u visini 30% prosječne mjesečne plaće koju objavljuje Federalni zavod za statisiku za mjesec kada poslodavac daje poklon, naknada troškova sahrane u visini tri prosječne neto plaće u Federaciji BiH za prethodna tri mjeseca (isplaćene četiri naknade), novčana pomoć u slučaju teške bolesti u visini tri prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji BiH ili u visini troškova prema dokumentaciji (isplaćene tri naknade).

Doprinos poslodavca i ostali doprinosi (ekonomski kod 612000)
Ostvareni doprinosi poslodavca i ostali doprinosi su isplaćeni u iznosu od 321.227,49 KM ili 60% od planiranog iznosa. Ovi doprinosi predstavljaju zakonsku obavezu obračunavanja i isplata doprinosa uz plaću i padaju na teret poslodavca.

Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (ekonomski kod 613000)
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge su isplaćene u ukupnom iznosu od 1.555.712,90 KM ili 72% od planiranog iznosa. U nastavku teksta je obrazloženje značajnijih troškova ekonomskog koda 613000.

Putni troškovi u zemlji podrazumijevaju putne troškove radnika ostvarenih na službenom putovanju za poslovanje AVP Sava. Domaće dnevnice su u 2025. godini iznosile 25,00 KM. Putni troškovi u inostranstvu se uglavnom ostvaruju zbog imenovanja velikog broja radnika AVP Sava u međunarodnim komisijama. Članovi Savske komisije i ICPDR-a (Dunavske komisije) odlaze dva puta godišnje na sastanke u inostranstvu (proljetni i jesenji) i sve troškove ovih službenih putovanja snosi AVP Sava.

Izdaci za energiju podrazumijevaju plaćanje struje za poslovnu zgradu AVP Sava, Laboratoriju Butila, Urede u Jajcu i Zenici kao i za rad Crpnih stanica u poplavnim područjima Srednja Posavina i Odžačka Posavina. Također se jedan dio ovih troškova odnosi i na plaćanje struje za rad vodomjernih stanica. U 2025. godini je povećan trošak električne energije crpnih stanica zbog povećanja cijene električne energije kao i povećanja vodostaja rijeke Save u poplavnim područjima Odžačka Posavina i Srednja Posavina. Iz tog razloga u više navrata je vršeno uključivane crpnih stanica koje su zbog velikog kapaciteta veliki potrošači električne energije.

Izdaci za gas podrazumijevaju plaćanje troškova utrošenog gasa za potrebe Laboratorije u Butilama.

Izdaci za telefon, telefaks i teleks uključuju troškove telefona u AVP Sava, kao i troškove telefona za potrebe rada centara za odbranu od poplava i vodomjernih stanica. Upotreba fiksnih i mobilnih telefona je regulisana posebnim Odlukama direktora kojim je utvrđeno ograničenje korištenja istih. Svako prekoračenje korištenja istih se refundira na blagajnu AVP Sava. Korištenje mobilnih telefona je ograničeno na 200,00 KM za direktora, 50,00 KM za rukovodice Sektora i 30,00 KM za vozača.

Izdaci za vodu i kanalizaciju uključuju troškove vode za direkciju Agencije, Ured u Zenici, laboratoriju u Butilama, COP u Srednjoj posavini i nabavku vode za piće.

Značajni troškovi su ostvareni na ekonomskim kodovima 613400 i 613423, a tiču se nabavke *materijala i sitnog inventara i laboratorijskog materijala*. Ovi troškovi su ostvareni za nabavku materijala, reagenasa, potrošnog materijala i sitnog inventara za rad Laboratorije za vode za obavljanje poslova monitoringa voda.

Troškovi zakupnine podrazumijevaju zakupninu za područne Urede u Jajcu i Bihaću.

Usluge popravke i održavanja opreme se odnose na održavanje održavanje računara, printera, kopir aparata i drugih mašina kao i održavanje opreme u Laboratoriji za vode.

Usluge popravke i održavanja vozila se odnose na servisiranje i održavanje vozila u vlasništvu AVP Sava.

Ostale usluge opravke i održavanja se odnose na troškove održavanja poslovnih prostorija. Od 01.01.2019. godine, AVP Sava je vlasnik poslovnog prostora u ul. Hamdije Ćemerlića 39, dakle dio poslovne zgrade „Vodoprivreda". Kao suvlasnik poslovne zgrade, zaključen je Ugovor o održavanju zgrade sa vlasnikom ostalog dijela zgrade „Zavod za vodoprivredu" d.d. Sarajevo o održavanju zgrade. U ovim troškovima su također uključeni i troškovi održavanja zgrade Laboratorija u Butilama i Područnog ureda u Zenici.

Usluge medija podrazumijevaju troškove nastale realizacijom ugovora sa JP Radio-televizija BPK Goražde i Federalnom novinskom agencijom (FENA).

Usluge štampanja se odnose na troškove štampanja časopisa „Voda i mi", U 2025. godini su odštampana i distribuirana dva broja časopisa „Voda i mi" . Treći broj je pripremljen u 2025. godini i započela je štampa časopisa. Distribucija časopisa je izvršena u januaru 2026. godine.

Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću su usluge koje su za AVP Sava resurs za podizanje javne svijesti o značaju voda, pa je u tom smislu finansirano održavanje FB stranice AVP Sava, a podržan je i EKOBIS 2025 (međunarodni sajam koji je održan u Bihaću, a čija je svrha upravo podizanje javne svijesti zaštite okoliša pa samim tim i voda). Jedan dio sredstava je usmjeren i u realizaciju ugovora sa kantonalnom TV SA.

Usluge reprezentacije u 2025. godini su pored potreba Agencije za redovno poslovanje, realizovane i za održavanje i obilježavanje Svjetskog dana voda (22.Mart). Troškovi reprezentacije su ostvareni i za organizaciju i održavanje Konferencije posvećenu izradi i procedurama donošenja godišnjeg plana i Finansijskog plana AVP Sava na kojoj su učešće uzeli gradonačelnici i načelnici gradova i općina sa svojim saradnicima sa cijelog područja sliva rijeke Save. Troškovi reprezentacije su ostvareni i za organizaciju i održavanje sastanka Stručne grupe za upravljanje zagađanjem ICPDR.

Izdaci za stručne usluge se odnose na stručne i konsultantske usluge za kojim AVP Sava ima potrebu u cilju redovnog izvršavanja svojih obaveza.
Usluge objavljivanja tendera i oglasa podrazumijevaju ostvarene troškove kod objavljivanja svih zakonom određenih akata u Službenih novinama Federacije BiH, pri čemu je najznačajniji trošak ostvaren zbog procedura javnih nabavki. Troškovi na ovom ekonomskom kodu se ostvaruju i zbog zakonske obaveze o objavljivanju svih postupaka za izdavanje prethodne vodne saglasnosti u dnevnim novinama.

Usluge za stručno obrazovanje podrazumijevaju utrošak srestava za dodatne edukacije za radnike. Kontinuirana edukacija radnika u različitim oblastima se pokazale neophodnim za kvalitetniji i stručniji pristup poslu radnika AVP Sava.
Izdaci za stručne usluge podrazumijevaju izdatke za:

- advokatske troškove u ukupnom iznosu od 45.922,19 KM, i to: advokat Danijela Saller Osenk u iznosu od 42.322,19 KM i ZAK Hakija Kurtović 3.600,00 KM.
- usluge održavanja softvera za javne nabavke, usluge održavanja 5 softvera u finansijsko-računovodstvenoj službi (softver za knjigovodstvo, softver stalnih srestava, softver za obračun plaća, softver za praćenje finansijske realizacije Plana i Finansijskog plana i softver za ulazne fakture) i troškove održavanja softvera za vodne naknade u ukupnom iznosu 34.301,81 KM
- troškove eksterne komercijalne revizije u iznosu od 7.020,00 KM
- Izrada Plana procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara sa Planom evakuacije za Laboratoriju u iznosu 1.989,00 KM.

Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog rada podrazumijevaju: Naknade članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora. Po Odluci Premijera Federacije BiH, visina naknade za predsjednika Upravnog/Nadzornog odbora isplatila se u visini jedne prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH u posljednja tri mjeseca prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a članovima Upravnog/Nadzornog odbora u visini od 80% od iznosa mjesečne naknade predsjedniku Upravnog/Nadzornog odbora, za prvih 11 mjeseci 2025. godine. Za mjesec decembar 2025. godine, po Odluci Premijera Federacije BiH, predsjedniku Upravnog odbora AVP Sava isplaćena je naknada uvisini 1,25 prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH u posljednja tri mjeseca prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a članovima UO AVP Sava u visini od jedne prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH u posljednja tri mjeseca prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku

Ugovori o djelu se odnose na: troškovi po osnovu putnih naloga članova Upravnog i Nadzornog odbora, troškove prevoda i lektorisanja Izmjena Okvirnog plana 2024.-2026. godina koji je dostavljen Vladi Federacije BiH i Ugovor za stručne usluge asistencije u segmentu geomehaničke eksperize.

Ostali tekući rashodi – rashodi sektora voda (ekonomski kod 614819)

U ovom dijelu izvještaja prezentiraće se izvršenje planiranih radova i aktivnosti koje je u skladu sa Zakonom o vodama Federacije BiH (član 29., 155. i 156.) AVP Sava dužna izvršavati i usmjeravati prikupljena sredstva koja su joj raspoređena ovim Zakonom. Obrazloženja izvršenih radova i aktivnosti prezentiraće se metodologijom koja je utvrđena Planom i Finansijskim planom AVP Sava za 2025. godinu.

A. Upravljanje vodama na vodnom području rijeke Save

A.1. Izrada strateško-planske dokumentacije

A.1.1. Ažuriranje Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022-2027.)

U julu 2025. godine Agencija za vodno područje rijeke Save (AVP Sava) zaključila je ugovor o nabavci usluga Ažuriranje Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022–2027.) sa Grupom ponuđača koju čine Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo i Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo, u ukupnom ugovorenom iznosu od 1.198.044,90 KM. Predmet ugovora obuhvata ažuriranje važećeg Plana upravljanja vodama,

u skladu sa odredbama Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovine, relevantnim podzakonskim aktima, kao i zahtjevima Okvirne direktive o vodama Evropske unije.
U skladu sa članom 38. Zakona o vodama Federacije BiH, tokom 2025. godine provedene su početne i pripremne aktivnosti koje predstavljaju temelj za izradu novog planskog ciklusa Plana upravljanja vodama za period 2028–2033, s posebnim naglaskom na transparentnost procesa, učešće javnosti i međusektorsku saradnju. AVP Sava je, u januaru 2025. godine, objavila Obavještenje o početku pripreme Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH za planski period 2028–2033, čime je formalno započet proces izrade Plana i osigurana informisanost javnosti i relevantnih institucija.
U okviru realizacije ugovorenih aktivnosti u 2025. godini urađeno je sljedeće:
-izrađen je Početni izvještaj, koji sadrži metodološki okvir izrade Plana, pregled dostupnih podataka, definisane korake i faze izrade, kao i dinamički plan realizacije aktivnosti;
-pripremljena je i objavljena anketa „Značajna pitanja upravljanja vodama", kao ključni instrument za uključivanje javnosti i zainteresovanih strana u ranoj fazi procesa izrade Plana, s ciljem identifikacije glavnih problema, izazova i prioriteta u oblasti upravljanja vodama;
-na osnovu prikupljenih podataka i preliminarnih analiza, pripremljen je nacrt dokumenta „Značajna pitanja upravljanja vodama", kojim se definišu ključni pritisci, rizici i upravljačka pitanja relevantna za stanje voda na vodnom području rijeke Save;
-započeta je izrada dokumenta „Ekonomska analiza korištenja voda", koji ima za cilj sagledavanje ekonomskih aspekata upravljanja vodama, uključujući analizu troškova i koristi, strukturu korištenja voda;
-započeta je izrada Smjernica za izdavanje vodnih akata, kojim će se utvrditi jasni i ujednačeni kriteriji i uslovi za zaštitu hidromorfoloških karakteristika vodotoka u postupcima izdavanja vodnih akata;
-pripremljeni su, distribuirani i obrađeni upitnici institucijama iz drugih ključnih sektora (energetika, poljoprivreda, prostorno planiranje, zaštita prirode i dr.), kao i institucijama iz sektora voda, s ciljem sagledavanja postojećih potreba, načina saradnje i razmjene podataka, te unapređenja međusektorske koordinacije;
-započeta je izrada Studije osnovnih potreba sektora voda u kontekstu vertikalne i horizontalne međusektorske saradnje, koja će poslužiti kao podloga za jačanje institucionalnih kapaciteta i efikasnije upravljanje vodnim resursima;
-izrađen je i dostavljen periodični izvještaj o realizaciji projekta, kojim je izvršen pregled realizovanih aktivnosti i dinamike izvršenja ugovora;
-započeta izrada Karakterizacijskog izvještaja;
-započeta je priprema Akcionog plana monitoringa transporta riječnog sedimenta;
-održan je niz koordinacionih i radnih sastanaka sa Grupom ponuđača, na kojima su razmatrane pojedinačne tematske cjeline, otvorena pitanja i dalji koraci u realizaciji projekta.
Ukupna finansijska realizacija projekta u 2025. godini iznosila je 599.022,45 KM, što je u skladu sa planiranom dinamikom realizacije ugovora i predviđenim finansijskim sredstvima.

A.1.2. Ažuriranje preliminarne procjene rizika od poplava na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH

Odredbe EU Direktive o procjeni i upravljanju rizicima od poplava 2007/60/EZ su transponirane u Uredbu o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/09). Usvajanjem Uredbe je uspostavljen okvir za procjenu i upravljanje poplavnim rizicima sa ciljem smanjivanja posljedica štetnog djelovanja voda u Federaciji BiH za ljudsko zdravlje, okoliš, kulturnu baštinu i privrednu aktivnost.

Uredbom je propisana priprema i donošenje planova upravljanja poplavnim rizikom za vodna područja u Federaciji BiH (čl. 15. i 16.), kojem prethodi priprema preliminarne procjene rizika od poplava, te izrada mape opasnosti od poplava i mape poplavnog rizika.
Svrha plana upravljanja rizikom od poplava je uspostavljanje odgovarajućih ciljeva za upravljanje poplavnim rizicima za poplavna područja utvrđena na osnovu preliminarne procjene poplavnog rizika, prema članu 6. Uredbe, sa fokusom na smanjivanju mogućih štetnih posljedica poplava.
Dana 08.04.2024. godine Vlada Federacije BiH je usvojila prvi Plan upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2024-2029). Samim tim stvoreni su preduslovi da započne II ciklus izrade tj. ažuriranje ovog izuzetno značajnog dokumenta.
Kao prvi korak u tom pravcu potrebno je izvršiti ažuriranje Preliminarne procjene rizika od poplava. Ovo je ujedno i jedna od mjera definisana Planom upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2024-2029.).
Pošto je Preliminarna procjena rizika od poplava urađena 2013. godine potrebno ju je značajno doraditi. Kod ažuriranja ovog dokumenta koristiće se iskustva stečena u I ciklusu u svjetlu novih saznanja (nalaza dobivenih kroz izradu mapa opasnosti od poplava i mapa poplavnog rizika te izradu plana upravljanja rizikom od poplava kao i iskustva zemalja članica EU). Potrebno je izvršiti ažuriranje upitnika dostavljenog lokalnim zajednicama, metodologije i vrijednosti pojedinih faktora rizika, uzeti u obzir i ostale vrste poplava – pluvijalne i urbane, uticaj klimatskih promjena, te provjeriti stanje 68 APSFR koji su obuhvaćeni I ciklusom te utvrditi da li su i u kojoj mjeri problemi riješeni.
Sadržaj Preliminarne procjene rizika od poplava definisan je članom 4. EU Direktive o procjeni i upravljanju rizicima od poplava.
Nakon što je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u maju 2024. godine) dalo saglasnost na Plan i Finasijski plan AVP Sava za 2024. godinu, pokrenuta je zajednička javna nabavka sa AVP Jadransko more, a u skladu sa odredbama člana 4. Sporazuma o ažuriranju preliminarne procjene rizika od poplava na vodnom području rijeke Save i Jadranskog mora u Federaciji BiH. AVP Sava je bila odgovorni nosilac aktivnosti na provođenju zajedničke javne nabavke predmetnih usluga. Nakon odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, uslijedila je žalba jednog od ponuđača, zbog čega u 2024. godini nije potpisan ugovor niti otpočela realizacije ove aktivnosti. Iz tog razloga je ova aktivnost predložena za Plan i Finansijski plan AVP Sava za 2025. godinu.
U toku 2025. godine je ponovo provedena zajednička javna nabavka nakon čega je izabran najpovoljniji ponuđač sa kojim je krajem 2025. godine sklopljen ugovor o realizaciji predmetnih aktivnosti, ali nije bilo vremena da se realizuju planirana sredstva. Sredstva za ovu stavku koja su planirana u 2025. godini biće prenesena i realizovana u 2026. godini.

A.1.3. Studija stanja podzemnih voda vodnog područja rijeke Save u Federacije BiH i procjena rizika po kvalitet i rezerve podzemnih voda

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo je u 2017. godini pokrenula aktivnosti na uspostavi monitoringa podzemnih voda (MPV) na vodnom području rijeke Save na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH). U periodu 2017- 2022. godine izvedeno je i stavljeno u funkciju 20 pijezometara za provođenje monitoringa podzemnih voda. Nakon perioda osmatranja ukazala se potreba za analizom postojećih podataka i prijedlogom daljeg provođenje MPV, zbog čega je AVP Sava u 2023. godini finansirala izradu elaborata "Evaluacija rezultata monitoringa podzemnih voda na vodnom području rijeke Save u FBiH sa analizom usklađenosti sa direktivom EU" (Elaborat).

Ovaj Elaborat je sagledao sve do sada realizovane aktivnosti na uspostavi MPV i dao kratak prikaz hidrogeoloških karakteristika i prisutnih podzemnih vodnih tijela na vodnom području rijeke Save u FBiH, pregled monitoringa koji se trenutno obavlja, kao i koncept MPV preporučen od strane Evropske Unije u okviru Okvirne direktive o vodama (ODV) (2000/60/EEC) i Direktive o zaštiti podzemnih voda od zagađenja i pogoršanja kvaliteta (DZPV).

Budući da je u skladu sa odredbama ODV potrebno definisati početno stanja podzemnih voda vodnog područja i obezbjediti najmanje moguće promjene dobrog stanja podzemnih voda, za uticaje koji se ne mogu objektivno izbjeći usljed prirode ljudskih aktivnosti ili zagađivanja, urađenim Elaboratom je kao naredni korak predložena izrada "Studije stanja podzemnih voda vodnog područja rijeke Save u Federacije BiH i procjena rizika po kvalitet i rezerve podzemnih voda".

Ovom Studijom bi se na osnovu postojećih rezultata, pojedine granice podzemnih vodnih tijela trebale korigovati, dakle potrebno je izvršiti delineaciju podzemnih vododjelnica, izvršiti procjenu "rizika" za svako podzemno vodno tijelo (PVT) i za grupe PVT. U cilju određivanja parametara i mreže operativnog monitoringa ovom Studijom će se izvršiti grupisanje u skladu sa ODV i povezanim direktivama za podzemne vode, definisati početno stanje režima nivoa podzemne vode za izdvojena PVT, ili grupe PVT, odrediti rezerve (količine) podzemne vode, za svako pojedino PVT koje se koristi za organizovano vodosnabdijevanje gradova, ili grupe povezanih podzemnih vodnih tijela i utvrditi funkcionalnu vezu sa režimom nivoa podzemne vode. Nivo podzemne vode se ne može jednostavno poistovijetiti sa količinama podzemne vode ili rezervama, bez kompletnog sagledavanja hidrogeoloških uslova PVT, jer je moguće doći do pogrešnih zaključaka o trendovima odnosno pritiscima na kvantitativno stanje podzemnih voda. Neophodno je utvrditi obim crpljenja podzemnih voda pojedinih PVT, kojim se ne narušava obim neophodan za potrebe životne sredine. Takođe, Studijom je potrebno odrediti PVT za koja će se utvrditi manje strogi ciljevi iz člana 4. Studijom su planirana su i terenska mjerenja (sadržaja O_2, elektroprovodljivosti i sl.). Za površinske vodotoke koji imaju aktivnu vezu sa karstnim vrelima kaptiranim za vodosnabdjevanje definisat će se zone poniranja i posebno naglasiti mogući nepoželjni efekti ove pojave.

Ova Studija je planirana kao osnova za izradu Projekta monitoringa kvantitativnog i kvalitativnog stanja podzemnih vodnih tijela, sa programom monitoringa koji je njegov sastavni dio, posebno za svaki podsliv rijeke Save na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Postupak javne nabavke za izradu Studije pokrenut je nakon što je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u maju 2024. godine dalo saglasnost na Plan i Finansijski plan AVP Sava za 2024. godinu. Nakon objave tendera, tokom 2024. godine izjavljeno je više žalbi, zbog čega nije došlo do zaključenja ugovora niti početka realizacije planirane aktivnosti.

Ured za razmatranje žalbi BiH donio je 2025. godine rješenje kojim se postupak javne nabavke poništava u cjelosti, nakon čega je jedan od ponuđača pokrenuo upravni spor radi poništenja predmetnog rješenja. Upravni spor je još u toku.

S obzirom na doneseno rješenje URŽ-a o poništenju tendera u cjelini i činjenicu da je upravni spor u toku, odustaje se od daljih aktivnosti na pokretanju ove Studije do donošenja pravosnažne presude u predmetnom postupku.

A.2. Monitoring voda

A.2.1. Automatski hidrološki monitoring sistem na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH

Hidrološki monitoring na vodnom području rijeke Save na teritoriji Federacije BiH je u nadležnosti "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo te se kontinuirano provodi u okviru redovnih aktivnosti AVP Sava iz više segmenata, a prvi u nizu je prikupljanje podataka na terenu. Spomenuta aktivnost se provodi putem sistema automatskih stanica (hidroloških, padavinskih, tj. meteoroloških i stanica za praćenje nivoa podzemne vode) sa kontinuiranim praćenjem hidroloških i hidrometeoroloških parametara i putem vizuelnog praćenja vodostaja očitanjem vodomjernih letvi. Hidrološkim i meteorološkim monitoringom na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH su obuhvaćeni vodotoci I i II kategorije. U sistemu ISV-a prikupljaju se podaci sa ukupno 134 stanica (hidrološke – za praćenje vodastaja površinskih voda - 87, hidrološke - za praćenje nivoa voda u dovodnim kanalima na objektima crpnih stanica na području Odžačke i Srednje Posavine - 3, hidrološke - za praćenje nivoa vode u pijezometrima u tijelu brana Vidara i Hazna -4, kao i hidrološke - za praćenje nivoa vode u jezeru Vidara i Hazna - 2, te padavinske - 19, stanice za mjerenje nivoa podzemnih voda - 28).

Zadatak monitoringa voda (hidrološki automatski monitoring), između ostalog, jeste upravljanje i održavanje mreže automatskih hidroloških, padavinskih stanica i stanica za mjerenje nivoa podzemne vode.

Prikupljanje podataka putem automatskih stanica ima izuzetan značaj za praćenje formiranja valova velikih voda sa kontinuiranim uvidom u promjene vodostaja, kao i za registrovanje minimalnih vodostaja na vodotocima. Prikupljeni podaci se koriste na više načina i to u realnom vremenskom trenutku, kako kod pojave poplava, a naknadno za mnogobrojne hidrološke analize, definisanje režima voda, bilansiranje voda, definisanje ekološki prihvatljivog protoka. Korištenje ovih podataka u cilju informisanja javnosti i drugih institucija putem web aplikacija, LED displeja na terenu i slično, obuhvata značajan segment hidrološkog monitoringa.


Monitoring mreža je dizajnirana na način da se omogući koherentan i sveobuhvatan pregled kvantitativnog statusa površinskih voda, kao i da se iz podataka omogući prognoziranje dugoročnih promjena i trendova.


Značajan segment korištenja prikupljenih podataka u realnom vremenu sa automatskih stanica predstavlja i korištenje ovih podataka za potrebe regionalne platforme za prognozu poplava na cijelom slivu rijeke Save i nacionalnog sistema za rano upozoravanje i prognozu poplava na slivu rijeka Une sa Sanom, Vrbas, Bosne i Drine. Rad sistema za prognozu poplava bez podataka sa ovih stanica bi bio praktično neupotrebljiv.


Također, podaci u realnom vremenu sa ovih stanica se koriste i za razvijeni HIS sistem u okviru Međunarodne Komisije za rijeku Savu (ISRBC) kao i za Europski sistem upozorenja na poplave (EFAS), te za sistem HIS Dunava u okviru Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR).

Uspostavom prognoznih matematskih modela, sistem automatskog hidrološkog monitoringa na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH dobija na svom punom značaju, a odgovornost za rad ovog sistema i kvalitet podataka se također podiže na jedan veći nivo.

Sve aktivnosti po ovom ugovoru planirane za 2025. godinu su završene, a plaćanja su vršena putem mjesečnih situacija.

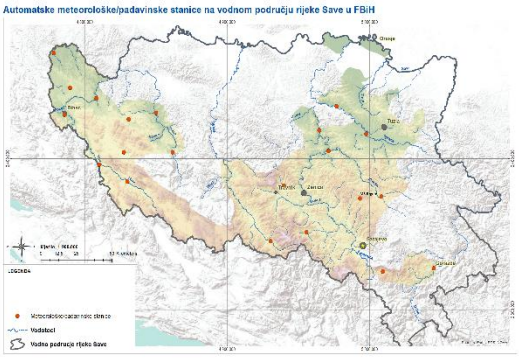

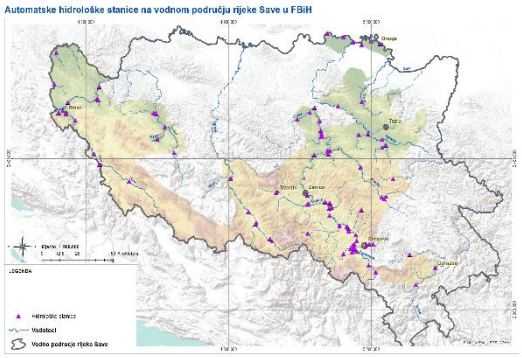

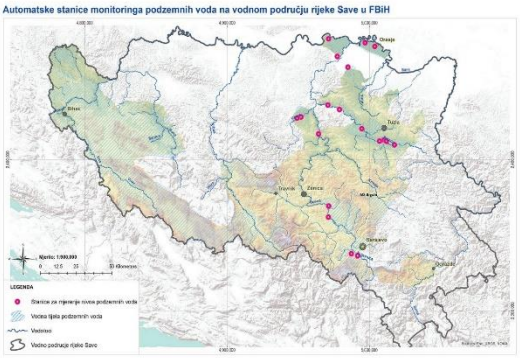

A.2.2. Hidrometrijska mjerenja na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH (4 serije)

Jedna od obaveza i potreba Agencije za vodno područje rijeke Sava jeste provođenje monitoringa voda, što podrazumijeva i redovna hidrometrijska mjerenja na vodotocima. Ove aktivnosti se kontinuirano provode svake godine, već dugi niz godina, u skladu s raspoloživim finansijskim sredstvima. Hidrometrijska mjerenja pružaju osnovne podatke o hidrauličkim i hidrometričkim karakteristikama vodotoka, uključujući protok, brzinu i vodostaj, koji su neophodni za sveobuhvatnu analizu i modeliranje hidroloških sistema. Ovi podaci su osnova za donošenje inženjerskih odluka u oblastima planiranja, projektovanja, upravljanja vodnim resursima i zaštite od ekstremnih hidroloških događaja, poput poplava i suša.

Prema uputstvima Svjetske meteorološke organizacije, za definisanje i provjeru linije proticaja, što je jedan od glavnih razloga provođenja mjerenja protoka, potrebno je godišnje izvršiti minimalno četiri serije hidrometrijskih mjerenja. Ova mjerenja potrebno je izvršiti pri malim, prosječnim i povišenim vodostajima, kao i pri ekstremnim hidrološkim pojavama ukoliko budu zabilježene (suše, poplave).

Na osnovu ugovora za period 2024–2026. godina, predviđeno je izvođenje ukupno 12 serija hidrometrijskih mjerenja (po četiri serije godišnje) na 54 vodomjerne stanice. Dodatno, predviđeno je provođenje šest serija mjerenja (po dvije serije godišnje) na 15 vodomjernih stanica i četiri serije mjerenja, u navedenom periodu od tri godine, na jednoj vodomjernoj stanici (HS Ljubnići na kojoj je instaliran uređaj za mjerenje protoka), a koje se nalaze na području Kantona Sarajevo, gdje aktivnosti hidrometrijskih mjerenja na godišnjem nivou realizuje i Federalni hidrometeorološki zavod Sarajevo. Takođe, na dvije lokacije na slivu rijeke Une, na kojima je ugrađen uređaj za mjerenje protoka, predviđeno je provođenje šest serija mjerenja (po dvije serije godišnje).

Tokom 2025. godine realizovane su tri serije hidrometrijskih mjerenja (ukupno 201 mjerenja), u skladu i prilagođeno hidrološkim uslovima na terenu.

Dostavljen je završni izvještaj za 2025. godinu u kojem su sumirani svi rezultati mjerenja u toku godine.
U nastavku su prikazane fotografije mjerenja provedenih na hidrološkoj stanici Olovske Luke na rijeci Stupčanici (mjerenje vršeno ultrasoničnim uređajem dana 27.05.2025. godine) i hidrološkoj stanici Bliha na rijeci Bliha (mjerenje vršeno hidrometrijskim krilom dana 05.11.2025. godine), kao i prikaz rezultata obrade navedenih mjerenja.



Mjerenje proticaja HS Olovske Luke, rijeka Stupčanica (27.05.2025.), vršeno ultrasoničnim uređajem

Discharge Measurement Summary

Date Measured: Tuesday, May 27, 2025

Site Information		Measurement Information	
Site Name	HS Olovske Luke	Party	
Station Number	62	Boat/Motor	
Location	r.Stupčanica	Meas. Number	

System Information		System Setup		Units	
System Type	RS-S5	Transducer Depth (m)	0.03	Distance	m
Serial Number	3794	Salinity (ppt)	0.0	Velocity	m/s
Firmware Version	4.10	Magnetic Declination (deg)	3.0	Area	m2
Software Version	3.50			Discharge	m3/s
				Temperature	degC

Discharge Calculation Settings				Discharge Results	
Track Reference	Bottom-Track	Left Method	Sloped Bank	Width (m)	8.95
Depth Reference	Vertical Beam	Right Method	Sloped Bank	Area (m2)	4.9
Coordinate System	ENU	Top Fit Type	Power Fit	Mean Speed (m/s)	0.213
		Bottom Fit Type	Power Fit	Total Q (m3/s)	1.050

Measurement Results

Tr		Time			Distance				Mean Vel		Discharge							%
#		Time	Duration	Temp.	Track	DMG	Width	Area	Boat	Water	Left	Right	Top	Middle	Bottom	Total	MBTotal	Measured
1	L	10:36:33 AM	0:03:43	15.8	9.24	8.18	9.18	4.8	0.041	0.229	0.00	0.00	0.19	0.76	0.14	1.090	--	70.0
2	R	10:40:36 AM	0:01:30	15.5	8.80	7.85	8.85	4.9	0.098	0.213	0.03	0.00	0.18	0.72	0.12	1.053	--	68.2
3	L	10:42:21 AM	0:01:49	14.8	8.67	7.96	8.96	5.1	0.080	0.206	0.02	0.01	0.18	0.72	0.12	1.045	--	68.9
4	R	10:44:22 AM	0:01:33	14.7	8.90	7.82	8.82	4.9	0.096	0.206	0.02	0.00	0.17	0.70	0.12	1.011	--	69.3
			Mean	15.2	8.90	7.95	8.95	4.9	0.079	0.213	0.02	0.00	0.18	0.73	0.13	1.050	0.000	69.1
			Std Dev	0.4	0.21	0.14	0.14	0.1	0.023	0.009	0.01	0.00	0.01	0.02	0.01	0.028	0.000	0.7
			COV	0.0	0.024	0.018	0.016	0.022	0.287	0.044	0.606	1.055	0.033	0.032	0.067	0.027	0.000	0.010


Exposure Time: 0:08:35

Tr1=20250527103633r.rivr; Tr2=20250527104034r.rivr; Tr3=20250527104219r.rivr; Tr4=20250527104421r.rivr;

Comments

Tr1=20250527103633r.rivr - ; Tr2=20250527104034r.rivr - ; Tr3=20250527104219r.rivr - ; Tr4=20250527104421r.rivr -

Tabelarni prikaz rezultata mjerenja na HS Olovske Luke, rijeka Stupčanica (27.05.2025.)




Dijagram „dubina-brzina", HS Olovske Luke, rijeka Stupčanica (27.05.2025.)



Mjerenje proticaja HS Bliha, rijeka Bliha (05.11.2025.), vršeno hidrometrijskim krilom

Stranca:	Klijent: AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE					Visina na letvi (h): 12	
Datum:	Broj Ugovora /Narudžbe:					Početak mjerenja:	
05.11.2025.g.	Naziv profila: HS Bliha, rijeka Bliha					Kraj mjerenja:	
Šifra projekta:	Lokacija profila (koordinate)					Temperatura	pH
D-1316	X:			y:			
Širina profila	Broj elise			Vrijeme početka mje 12,50		Metoda mjerenja prema standardu ISO	
8.3	4-52127			Vrijeme završetka 13,10		748	
Početak mjerenja od:	1. Lijeve obale 2. Desne obale		Broj obrtaja n				
Stacionaža (m)	Dubina h (m)	Interval mjerenja t (sec)	0,1 m od površine	0,2h od površine	0,6h od površine	0,8h od površine	0,1 m od dna
0.00	0.00	30			0		
0.50	0.12	30			42		
1.00	0.13	30			56		
1.50	0.15	30			61		
2.00	0.14	30			65		
2.50	0.14	30			67		
3.00	0.16	30			69		
3.50	0.16	30			60		
4.00	0.16	30			61		
4.50	0.15	30			53		
5.00	0.15	30			52		
5.50	0.17	30			54		
6.00	0.16	30			53		
6.50	0.15	30			58		
7.00	0.14	30			42		
7.50	0.15	30			43		
8.00	0.14	30			36		
8.30	0.00	30			0		

Prikaz hidrometrijskog lista, HS Bliha, rijeka Bliha (05.11.2025.)

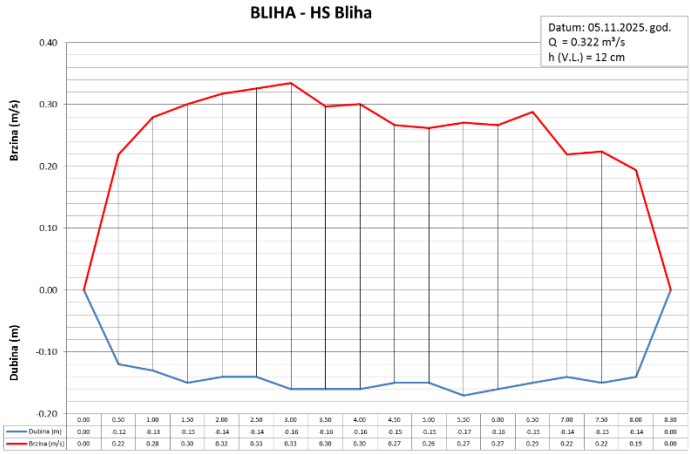

Prikaz dijagrama „dubina-brzina", HS Bliha, rijeka Bliha (05.11.2025.)

A.2.3. Angažovanje ovlaštene laboratorije za poslove uzorkovanja voda, za potrebe hitnih intervencija u slučaju incidentnih zagađenja

Zbog hitnosti djelovanja, vezano za zagađenje rijeke Korane, u 2025. godini je angažirana najbliža laboratorija za uzimanje i analizu fizičko-hemijskih parametara kvaliteta vode, što je u skladu s Pravilnikom o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenata na vodama i obalnom vodnom zemljištu ("Službene novine Federacije BiH", broj 71/09, 102/18, 70/24). Pismeni nalog Federalnog vodnog inspektora broj UP1-14-21-2-04235/2025-14-1 od 21.07.2025. godine je zaprimljen naknadno na protokol AVP Sava dana 23.07.202. godine. Shodno navedenom, AVP Sava je angažirala Zavod za javno zdravstvo USK Bihać za uzorkovanje i analizu fizičko-hemijskih parametara kvaliteta vode. Agenciji je Zavod za javno zdravstvo USK Bihć dostavio izvještaj o ispitivanju vode - Izvještaj broj 7749/25 od 22.07.2025. godine koji je potom proslijeđen Fedralnoj upravi za inspekcijske poslove i Službi za urbanizam, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove, Unsko–sanski kanton, Cazin. Detalji vezano za ovu stavku, opisani su u Izvještaju o poslovanju Agencije za 2025. godinu, u dijelu Poslovi i aktivnosti Sektora laboratorije za vode (Sektor 60).

A.2.4. Ihtiološka istraživanja sliva rijeke Save u Federaciji BiH u 2025. godini

Agencija za vodno područje rijeke Save je tokom 2025. godine, nakon provedenog postupka javne nabavke, ugovorila izradu Ihtioloških istraživanja sliva rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine. Istraživanja su provedena u skladu sa projektnim zadatkom i važećom metodologijom, a obuhvatila su ukupno 160 vodnih tijela površinskih voda na slivu rijeke Save u Federaciji BiH.

Tokom terenskih i laboratorijskih istraživanja evidentirano je 17 vrsta riba koje pripadaju pet porodica, dok je ukupan ihtiološki uzorak na svim istraživanim lokalitetima iznosio 3.510 jedinki. Svi uzorci su determinisani do nivoa vrste, pri čemu su za svaku jedinku utvrđena morfometrijska i meristička svojstva, kao i starost i pol, što omogućava pouzdanu procjenu strukture ribljih populacija.

Radi sagledavanja stanja ribljih zajednica i procjene uticaja antropogenih pritisaka, ihtiološki uzorci su grupisani u ekološke gilde. Rezultati analize zastupljenosti pojedinih ekoloških zona na istraživanim vodotocima ukazuju da najveći broj lokaliteta, njih 60 (37,0%), pripada zoni lipljena, zatim 46 lokaliteta (29%) pripada zoni pastrmke, dok 53 lokaliteta (33%) pripadaju zoni mrene. Ovakva raspodjela ukazuje na raznolikost hidroloških i ekoloških uslova na području sliva rijeke Save u Federaciji BiH.

Dodatno, za sve istraživane lokalitete izračunati su Shannon–Wienerov indeks diverziteta (Shannon i Wiener, 1949) i Simpsonov indeks (Krebs, 1999), čime je omogućena kvantitativna procjena biološke raznolikosti i stabilnosti ribljih zajednica.

Tokom provođenja istraživanja u okviru ovog projekta nije konstatovana prisutnost invazivnih vrsta riba, što predstavlja značajan pokazatelj očuvanosti autohtonog ihtiološkog fonda na istraživanom području.

Svi relevantni podaci prikupljeni tokom istraživanja sistematizovani su i uneseni u bazu podataka AVP Sava, čime je osigurana njihova dostupnost za potrebe daljnjih analiza, izvještavanja, izrade planskih dokumenata i praćenja stanja voda.

Istraživanja su u potpunosti završena u skladu sa ugovorenim obavezama, a za realizaciju predmetne nabavke isplaćen je ugovoreni iznos u visini od 199.953,00 KM.

A.3. Informacioni sistem voda (ISV)

A.3.1. Održavanje Informacionog sistema voda u AVP Sava

Održavanje informacionog sistema voda u AVP Sava podrazumjeva redovne aktivnosti održavanja sistema na godišnjem nivou, u cilju ispravnog i funkcionalnog rada sistema, a u skladu sa obavezama AVP Sava prema Zakonu o vodama.
Održavanje tokom 2025. godine je aktivnost za koju je provedena procedura nabavke usluga krajem 2023. godine za trogodišnji period 2024.-2026. godina, u cilju obezbjeđenja uslova za kvalitetan rad sistema kroz redovne aktivnosti održavanja sistema.
Održavanje sistema obuhvata nekoliko cjelina (komponenti):

- održavanje ESRI ArcGIS softverskih licenci na godišnjem nivou, koje čine osnovnu platformu ISV-a;
- održavanje i dopuna razvijenih WEB aplikacija za unos i ažuriranje alfanumeričkih podataka (u cilju ispunjavanja obaveza prema ODV EU, EU Direktivi o poplavama, INSPIRE direktivi) Vodni katastri, Vodna knjiga, Vodno dobro, RBMP i FRMP (Planovi upravljanja vodama, Planovi upravljanja rizicima od poplava i Erozija i bujični vodotoci);
- održavanje razvijenih WEG GIS preglednika: Karta za interne korisnike, Javna karta, Vodno dobro GIS i drugih GIS preglednika integrisanih unutar web aplikacija za unos podataka;
- održavanje javne web aplikacije za generiranje izvještaja o pripadnosti određene lokacije (katastarske čestice) vodnom dobru, poplavnom području i zaštićenim područjima;
- održavanje i WEB aplikacije za CISV (Centralni informacioni sistem voda) koji je razvijen za praćenje realizacije Strategije upravljanja vodama i Komunalne infrastrukture;
- administriranje i održavanje ArcSDE prostornih baza podataka u AVP Sava, kao i komponenti sistema za pripremu i objavljivanje javno dostupnih WFS i WMS servisa za dostavu podataka.


AVP Sava za potrebe rada i funkcioniranja Informacionog sistema voda (ISV) kao osnovu koristi ESRI ArcGIS softversku platformu. Obzirom da se radi o softverskoj platformi koja predstavlja osnovu ISV-a to je potrebno vršiti kontinuirano održavanje licenci (upgrade licenci na nove verzije softvera) postojećih softvera na godišnjem nivou. Trenutna verzija Desktop ArcGIS programske opreme (licenci) tokom 2025. godine je verzija softvera ArcGIS 10.8.2, nove verzije softvera se isporučuju kroz održavanje licenci ESRI ArcGIS softvera. Verzija ESRI ArcGIS Serverske programske opreme je verzija 10.9.1 koja trenutno predstavlja osnovu za korisničku platformu serverske infrastrukture.


RB	Opis robe ili usluge	Jedinica mjere	Primarna licenca	Sekundarna licenca
Održavanje Esri GIS softvera				
1	ArcGIS Desktop Advanced (Concurrent lic.)	kom	1	
2	ArcGIS Desktop Standard (Concurrent lic.)	kom	1	
3	ArcGIS Desktop Basic (Concurrent lic.)	kom	1	2
4	ArcGIS Desktop ext. 3D Analyst (Concurrent lic.)	kom	1	


5	ArcGIS Desktop ext. Spatial Analyst (Concurrent lic.)	kom	1	1
6	ArcGIS Desktop ext Data Interoperability (Concurrent Licenca)	kom	1	
7	ArcGIS Enterprise Standard (Server licenca (1S/4CPU)	kom	1	

Da bi ISV mogao normalno funkcionisati i na taj način zadovoljavati potrebe AVP Sava, potrebno je nastaviti održavati razvijene WEB GIS korisničke aplikacije za unos i ažuriranje alfanumeričkih podataka, kao i održavanje i administriranje prostorne baze podataka ArcSDE.Održavanje podrazumjeva nadogradnju, ažuriranje licenciranih softvera, podršku u otklanjanju eventualnih nedostataka i poteškoća u radu i moguća je samo od strane ovlaštenih zastupnika kompanije ESRI (USA). Također, u okviru održavanja ISV sistema AVP Sava provodi se i održavanje i dopuna (na osnovu zahtjeva korisnika) postojećih razvijenih WEB GIS korisničkih aplikacija za unos i ažuriranje alfanumeričkih podataka. Održavanje i administriranje prostornih baza podataka ArcSDE u AVP Sava podrazumjeva kontrolu rada, optimizaciju rada baza, redovan backup, rješavanje eventualnih problema na razvijenom logičkom i fizičkom modelu baze (vodebih, vodno dobro, RBMP i FRMP, rastervode, CISV, vodna knjiga).
Tokom 2025. godine su uspješno razvijeni i dopunjeni moduli RBMP i FRMP sa dijelovima za pohranu podataka iz oblasti Plana upravljanja poplavnim rizikom, modul za mape opasnosti i rizika od poplava. Nadograđen je i modul upravljanja riječnim bazenom dijelovima koji ispunjavaju zahtjeve Direktive o urbanim otpadnim vodama – Prečišćavanje komunalnih otpadnih voda. Pripremljen je i Modul RBMP – WFD Reporting čija je uloga izvještavanje prema EU, WISE i EIONET sistemu, kao i redizajniran Modul Vodna knjiga za pohranu podataka o izdatim vodnim aktima. Tokom 2025. godine Modul vodna knjiga je nadograđen sa novim aplikativnim rješenjima nakon korištenja sistema od strane korisnika i njihovih zahtjeva. Sve je to u potpunosti implementirano i operativno.
Održavanje ISV-a je neophodno, kao podrška u konstantnom radu sistema u svim uslovima, da bi se sve veći obim i raznovrsnost podataka koji se prikupljaju mogao na adekvatan način obraditi i pohraniti, te preko raspoloživih alata i preglednika približiti javnosti u cilju promovisanja pozitivne slike u Sektoru voda. Značajan segment rada ISV sistema je i ispunjavanje obaveza definisanih u okviru međunarodne saradnje (Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav - ICPDR, Međunarodna komisija za rijeku Savu - ISRBC), usklađivanje i harmonizacija formata podataka prema INSPIRE direktivi, ispunjavanje obaveza prema Infrastrukturi prostornih podataka i Nacionalnom geoportalu prostornih podataka uspostavom razmjene podataka putem servisa, itd.



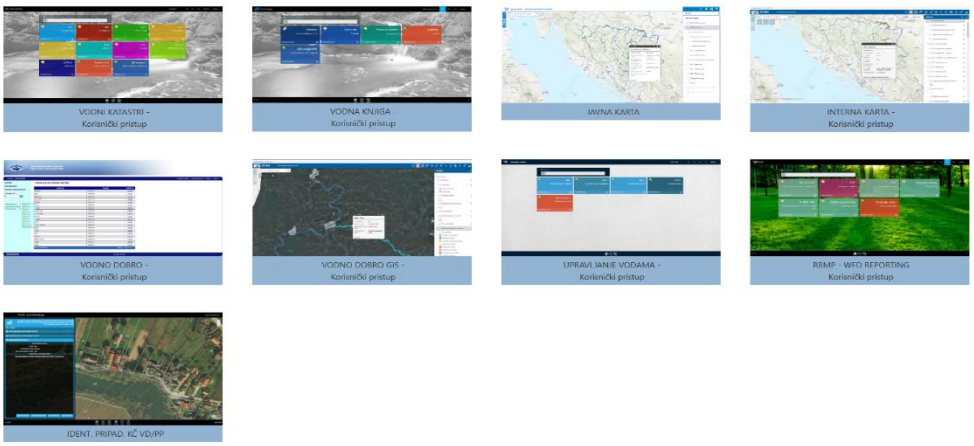

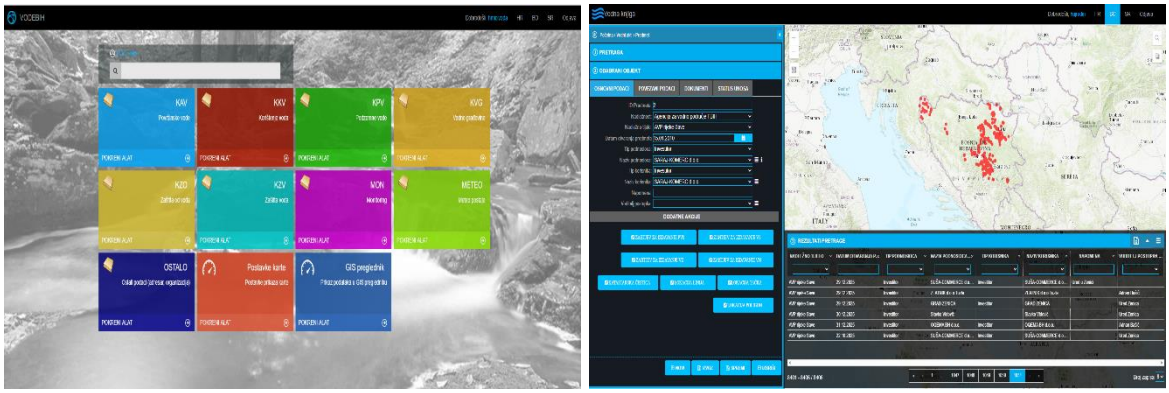

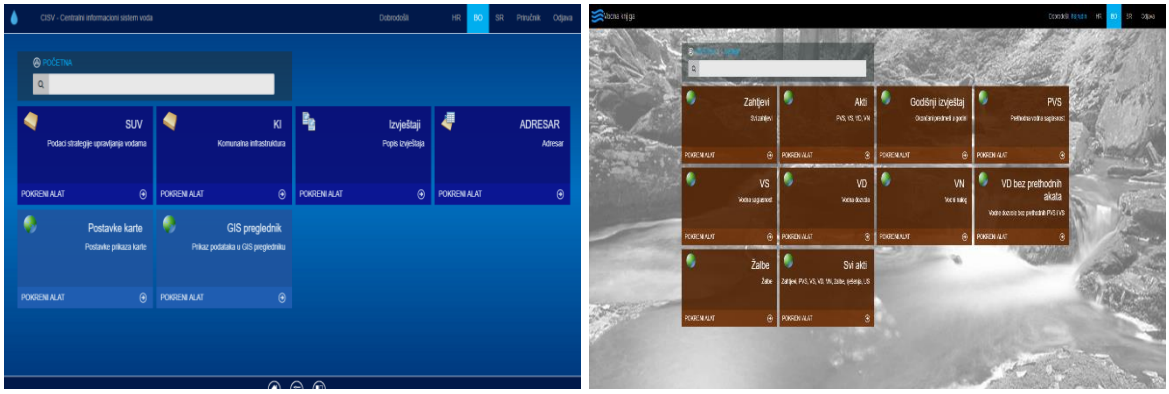

Stalno educiranje i trening uposlenika, kroz korisničke obuke je kontinuiran proces koji se provodi, kako bi uposlenici Agencije mogli kvalitetno koristiti i upravljati razvijenim alatima i modulima u svom svakodnevnom radu. Održana je radionica/trening na temu pripreme i izrade dashboard i story maps rješenja u cilju izrade određenih alata za potrebe Modula Vodna knjiga i Zaštite voda.

U ugovornom periodu za 2025. godinu su realizovane, uspješno provedene sve planirane aktivnosti.

A.3.2. AI chatbot sistem u AVP Sava – korištenje licence na godišnjem nivou


Tokom 2024. godine u AVP Sava implementirano je inovativno i napredno chatbot rjepenje bazirano na metodama i alatima vještačke inteligencije (AI) pruža korisničku podršku za potrebe Agencije za vodno područje rijeke Save u Sarajevu, a korištenje sistema je na osnovu mjesečne licence koja je vrijedila od 01.08.2024. godine pa narednih 12 mjeseci.

Od dana zaključivanja ugovora, za potrebe Agencije za vodno područje rijeke Save u Sarajevu, uspješno je postavljena glavna baza podataka za klijenta. Tokom implementacije, pažljivo su procesirani i sigurno pohranjeni sljedeći javno dostupni dokumenti, čime je osigurana visoka razina integriteta i dostupnosti podataka:

- Specifični podaci za AVPS Sava u Sarajevu:
  - https://www.voda.ba/kontakt
  - https://www.voda.ba/agencija
- Pravilnik o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenata na vodama i obalnom vodnom zemljištu
- Pravilnik o monitoringu u područjima podložnim eutrofikaciji i osjetljivim na nitrate
- Pravilnik o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka
- Pravilnik o uspostavi i upravljanju informacionim sistemom voda
- Pravilnik o načinu i uslovima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra
- Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata
- Zakon o vodama
- Federalni operativni plan odbrane od poplava

i drugi relevantni, raspoloživi dokumenti (Pravilnici, Uredbe, …)

Large Language Model (LLM) je istreniran na navedenim podacima, a zatim je pokrenuta AWS instanca koja omogućava pristup chatbotu. Postavljena je stranica i widget, koji su dostupni na sljedećem linku: https://botko.ba/vode-sarajevo-dev/.
Obzirom da je sistem baziran na korištenju licence određenog tipa, u cilju korištenja za naredni (jednogodišnji) period izvršeno je produženje korištenja sistema obnavljanjem odgovarajućeg Professional paketa – (Basic plus) (licence) za naredni period od godinu dana. Provodeći procedure javne nabavke usluga u prvom krugu sredinom jula mjeseca 2025. godine, došlo je do poništenja postupka nabavke, tako da je tek u drugom ponovljenom postupku javne nabavke usluga provedena procedura (oktobar 2025. godine), kada je i izvršeno ugovaranje za produženje korištenja licence za period 01.11.2025. do 31.10.2026. godine (godina dana).

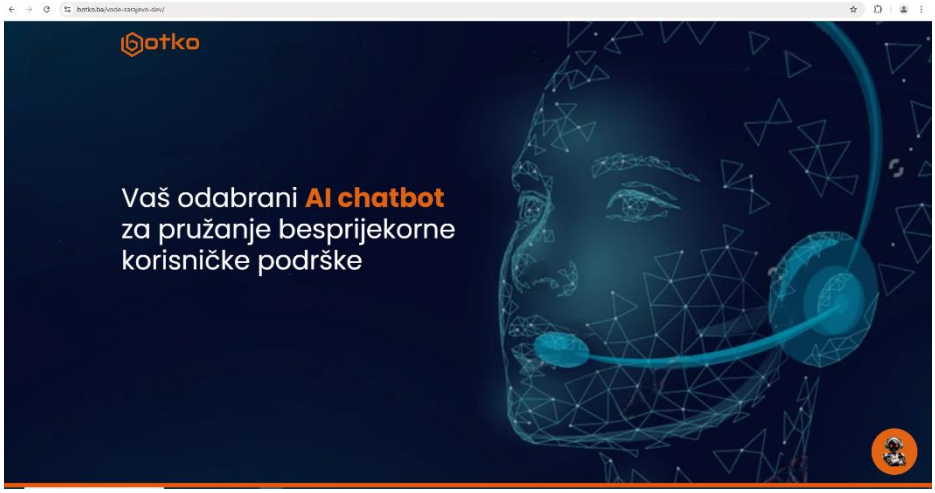

Pripremljeni su materijali koji detaljno opisuju način pristupa, korištenja i ocjenjivanja sistema. Ovi materijali su dostupni uposlenicima AVP Sava uz link za korištenje i prateće reference.

A.3.3. Nadogradnja ISV sistema u skladu sa potrebama AVP Sava (zajednička nabavka AVP Jadranskog mora Mostar)

Ova aktivnost je u planu javnih nabavki AVP Sava opisana sa slijedećim elementima:
Redni broj nabavke 48
Ekonomski kod: A.3.3. 614819133
Naziv i opis predmetne nabavke:
Nadogradnja ISV sistema u skladu sa potrebama AVP Sava i AVP Jadransko more (zajednička nabavka usluga)
Vrsta nabavke: Usluge
Vrsta postupka: Otvoreni postupak sa okvirnim sporazumom


Ova aktivnost je zajednička javna nabavka usluga nadležnih Agencija u Federaciji BiH, AVP Sava Sarajevo i AVP Jadransko more Mostar, čiji je planirani početak postupka bio sredina 2025. godine. Prvi korak za pokretanje zajedničke nabavke je potpisan Sporazum o zajedničkoj nabavci usluga između AVP Sava i AVP JM u kojem se definiraju svi potrebni elementi zajedničke nabavke. Na pripremi tog sporazuma nastali su problemi, zbog toga što je došlo do izmjena pravilnika o zajedničkim javnim nabavkama, a te izmjene nisu bile u dovoljnoj mjeri kvalitetno pripremljene te su prouzrokovale niz usaglašavanja između provoditelja zajedničke nabavke. Procedura pripreme sporazuma je trajala do sredine mjeseca novembra 2025. godine.
Nakon što je usaglašen i potpisan sporazum o zajedničkoj javnoj nabavci, prisupilo se provođenju javne nabavke usluga po otvorenom postupku, a nocilac provođenja nabavke je bila AVP Sava Sarajevo.
Do kraja decembra, tačnije 26.12.2025. godine donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, te je na redu priprema okvirnog sporazuma i priprema pojedinačnih ugovora sa odabranim ponuđačem.

A.3.4. Troškovi održavanja sistema prognoze poplava

U okviru ove stavke urađene su sljedeće aktivnosti:

A.3.4.1. Troškovi održavanja platforme za prognozu poplava MIKE

AVP Sava je tokom 2021. godine završila aktivnosti na uspostavi nacionalne prognostičke platforme za prognozu poplava koja je bazirana na softveru MIKE.
Obzirom da se radi o softverskoj platformi koja predstavlja osnovu sistema prognoze poplava potrebno je vršiti kontinuirano održavanje postojećih licenci MIKE softvera na godišnjem nivou, što podrazumjeva ažuriranje novih verzija licencnog softvera. Da bi platforma i sistemi prognoze poplava mogli normalno funkcionisati i na taj način zadovoljavati potrebe AVP Sava, također je potrebno održavati razvijene hidrološko/hidrauličke prognozne modele poplava na podslivovima rijeka Una sa Sanom, Vrbas, Bosna i Tinja.

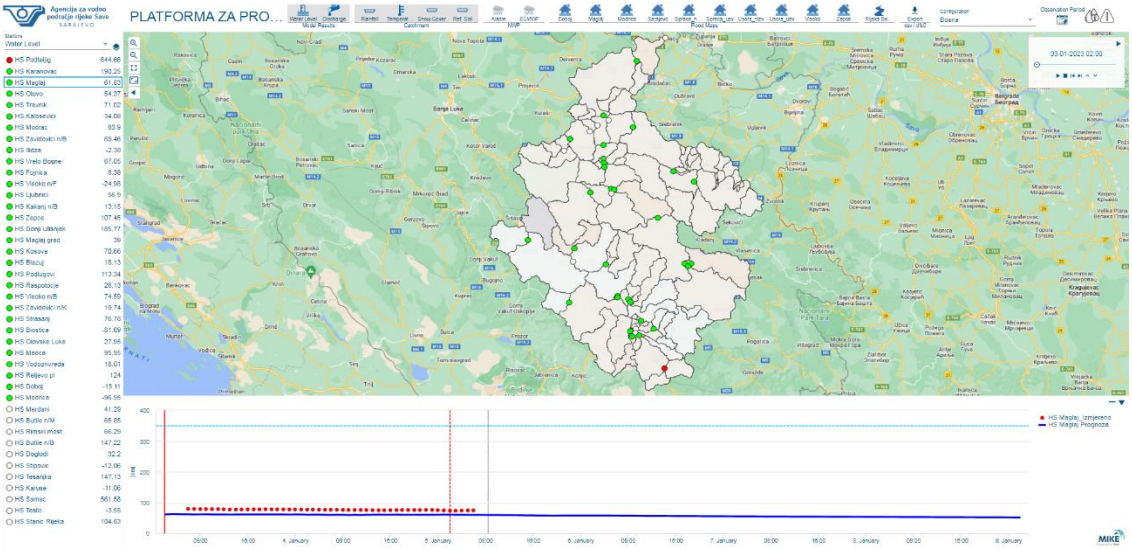

Nacionalna platforma za prognozu poplava

Održavanje podrazumjeva kontinuirano održavanje licenci softverskog alata/paketa Mike Hydro River, kao i tehničku pomoć u eventualnom zastoju ili problemima u radu navedene platfotme/sistema od strane ovlaštenih izvršilaca. Također, ovim održavanjem su obuhvaćene i manje korekcije na sistemu u cilju unificiranja, odnosno usklađivanja između pojedinih prognoznih modela (model za podsliv rijeke Bosne treba u određenim segmentima uskladiti i dovesti na nivo modela za podsliv rijeke Une sa Sanom) i isto je moguće samo od ovlaštenih zastupnika kompanije DHI (Danska), što je za područje Hrvatske i BiH dobavljač PRONEKO d.o.o. Zagreb.

Krajem 2023. godine, sklopljen je novi ugovor za period 2024.-2026. godina, sa istim ciljem s tim što su kroz novi ugovorni period korigovane aktivnosti odnosno smanjio se broj intervencija na sistemu obzirom da su se kroz raniji period mnoge aktivnosti realizovale. Ugovor je podrazumijevao dvije komponente obaveza, a to su:

1. ODRŽAVANJE LICENCE MIKE DHI SOFTVERA (mrežna licenca za jednog korisnika verzija)

- MIKE+ (HD, Control, DB, RR, SHE, DA, AD + ST, GST, ACS)
- MIKE OPERATIONS (MO Web application, MO Scenarios, MO Planning)
- MIKE WORKBENCH
- MIKE +2D (Overland flow, FM UL)
- MO WEB Aplications

Održavanje licence MIKE DHI softvera podrazumjeva standardnu tehničku podršku za korištenje softvera MIKE DHI (na godišnjem nivou) koja uključuje Help Desk prijavu problema, isporuku softverskih zakrpa, isporuku softverskih nadogradnji, rješavanje nedostataka, praćenje incidenata, nadzor i izvještavanje.

2. ODRŽAVANJE I TEHNIČKA PODRŠKA RADU PLATFORME/SISTEMA ZA PROGNOZU POPLAVA

Preventivno održavanje platforme

Preventivno održavanje platforme treba da omogući kontinuirano i temeljito praćenje redovnog rada aplikacijske platforme/sistema za prognozu poplava Una/Sana, Vrbas, Bosna.
U okviru preventivnog održavanja platforme/Sistema za prognozu poplava ovlašteni isporučioc treba da, u saradnji sa uposlenicima AVP Sava, vrši redovnu kontrolu rada aplikacijske platforme/sistema za prognozu poplava Una/Sana, Vrbas, Bosna – dva puta mjesečno. Ova redovna kontrola rada platforme/sistema poplava obuhvata pregled svih komponenti sistema: pregled i import real-time podataka kao i NWP podataka, simulacije modela (MO i WORKBANCH), prikaz rezultata prognoze (MO WEB).
Krajnji cilje redovne kontrole rada platforme/sistema jeste kontinurirano funkcionisanje sistema, odnosno izvršavanje svih poslova na uvozu podataka kao i izvršavanje svih simulacija za četiri podsistema a to su: UnaSana model, Vrbas model, Bosna model i Tinja model.


Manji problem/incident

Sistem nije uspješno završio sve potrebne i planirane poslove. Rješavanje ovakvog problema/incidenta će biti otklonjeno tokom same kontrole/inspekcije sistema ili najkasnije do kraja radnog dana u kojem se provodi kontrola/inspekcija.

Kritični problem/incident

Sistem nije uspješno završio sve potrebne i planirane poslove, neispravan import podataka u sistem, nedostatak podataka sa stanica iz nadležnosti drugih institucija (FHMZ, RHMZRS, DHMZ) modeli nisu završili planirane simulacije, nema rezultata prognoze. Rješavanje ovakvog problema/incidenta će biti otklonjeno nakon same kontrole/inspekcije sistema ili najkasnije u roku od 3 radna dana.

Tokom 2024. godine provedeno je 24 redovne inspekcije sistema, otklonjeno je 6 manjih problema kao i 1 kritični problem. Za svaku provedenu redovnu inspekciju sistema konsultant je pripremio i dostavio Izvještaj o provedenoj inspekciji.
Krajem godine, tačnije nakon zaršetka svih aktivnosti na projektu: Nadogradnja i unaprijeđenje postojećeg hidrološko-hidrauličkog i prognostičkog modela rijeke Bosne u okviru postojećeg sistema prognoze poplava u AVP Sava, realizovane su i aktivnosti na uspostavi nove verzije softvera MIKE 2023, što je podrazumijevalo premještanje komplet sistema uključujući i bazu podataka i softver na novu serversku mašinu. Nova mašina pripremljena je od strane uposlenika AVP Sava, a instalacija softvera, konfiguracija sistema i setapiranje izvršile su kolege iz Danskog Instituta za vode DHI. Realizacijom ove dvije prethodno navedene aktivnosti uz redovno održavanje sistema, napravio se veliki iskorak ka uspostavljanju stabilne i pouzdane Nacionalne platforme za prognozu poplava bazirane na MIKE softveru.

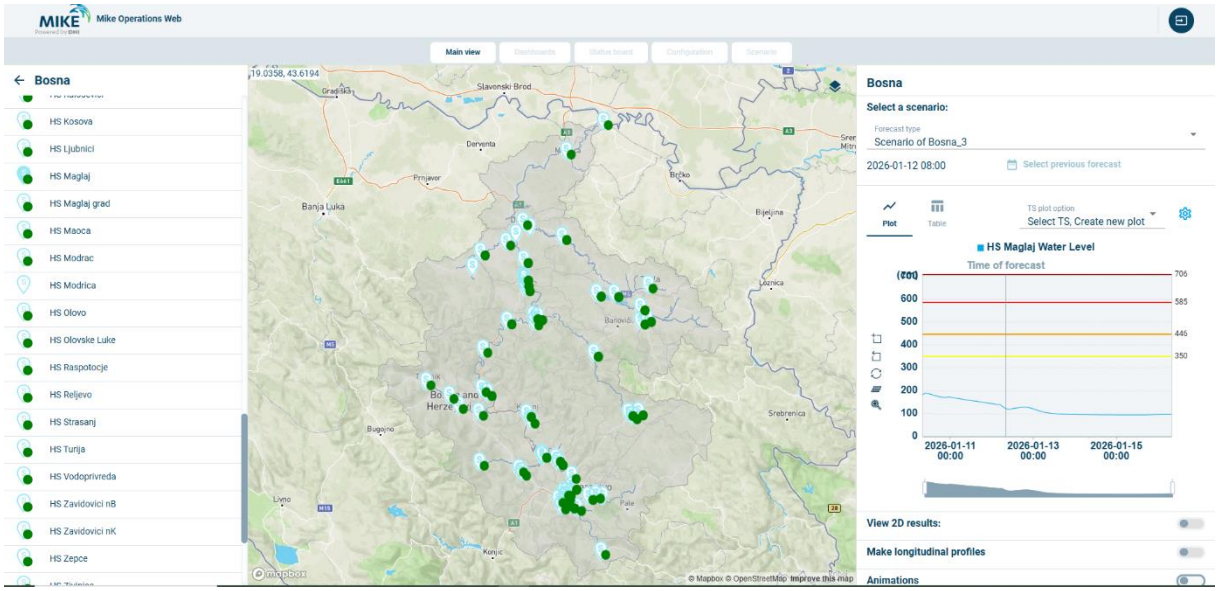

Novi izgled nacionalne platforme za prognozu poplava (MIKE Operations web 2023)

Tokom 2025. godine provedene su 24 redovne inspekcije sistema, otklonjeno je 2 manja problema kao i 1 kritični problem. Za svaku provedenu redovnu inspekciju sistema konsultant je pripremio i dostavio Izvještaj o provedenoj inspekciji (2 puta mjesečno).

Kontrola 10 nasumičnih vremenski serija

#	Time series (lokacija u databazi)	Datum zadnjeg ažuriranja	Datum zadnjeg trenutka u vremenskoj seriji
1	/AVPS/Discharge/BAH4070_HS Maglaj Poljice	23/12/2025 12:15	23/12/2025 11:00:00
2	/Forecast/WL/80591_Slavonski Brod	23/12/2025 12:19	28/12/2025 12:00:00
3	/Model input/Pobs/P_2102_BAM.dfs0 [BAM]	23/12/2025 07:32	23/12/2025 07:00:00
4	/Model input_Bosna_v3/Pobs/Karanovac_P	23/12/2025 08:00	23/12/2025 06:00:00
5	/Model input_Bosna_v3/WL/HS Olovo WL_abs	23/12/2025 08:00	23/12/2025 05:00:00
6	/Model Input_Vrbas/Pobs/61215_Borova_Ravan_P_hourly.dfs0 - 1 - Borova_Ravan_P	23/12/2025 07:35	23/12/2025 07:00:00
7	/Model Input_Vrbas/Q/Majevac_Q	23/12/2025 07:35	23/12/2025 06:00:00
8	/Telemetry/FHMZ/Pobs/0312_ROV_Rovna	23/12/2025 12:15	23/12/2025 12:00:00
9	/Telemetry/RHMZRS/Rainfall/0911_MAN_Manjaca	23/12/2025 12:15	23/12/2025 11:40:00
10	/Telemetry_UTB_Bosna/Discharge/4142_HS Vodoprivreda	23/12/2025 12:19	23/12/2025 10:20:00


Funkcionisanje sistema, import podataka kao i meteo i hidrološka prognoza evidentiraju se u Sedmičnom zapisniku (excel fajl) koji se vodi još od 2021. godine, a nalazi se na fileserveru u sektorskim folderima sektora 70 i sektora 10.

Realizovano je 123.020,00 KM (2024. godine, što uključuje i licence za trogodišnji period kao i održavaje i tehničku podršku radu platforme) i 41.320,00 (2025. godine) od ukupnog ugovorenog iznosa za 3 godine od 297.660,00 KM.
Može se konstatovati da su sve aktivnosti koje su planirane da se urade tokom trajanja ugovora za 2025. godinu, uspješno provedene.

A.3.4.2. Troškovi održavanja hidrološke platforme WISKI

Krajem 2023. godine, provedena je procedura nabavke usluga za novi trogodišnji period 2024.-2026. godina za usluge Održavanja hidrološke platforme WISKI.
Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo, za potrebe rada i funkcionisanja prikupljanja, praćenja, obrade, analize, upravljanja i distribucije podataka o vrijednostima vodostaja, proticaja, količine oborina, temperature zraka i drugih podataka koji se prikupljaju na automatskim stanicama na terenu, u okviru Informacionog sistema voda (ISV) kao osnovu koristi WISKI softversku platformu. Obzirom da se radi o softverskoj platformi koja predstavlja osnovu hidrološkog sistema potrebno je vršiti kontinuirano održavanje licenci postojećeg softvera na godišnjem nivou, što podrazumjeva ažuriranje tj. update novih verzija licencnog softvera, kao i unapređenje aplikativnih rješenja koja su uspostavljena.
WISKI softverski paket je donacija Sektoru voda u BiH od strane Svjetske banke kroz projekat: „West Balkans Drina River Basin Management Project Contract No.: BA/RS/MN-WBDRBMP-DC-G-18-02-a", a održavanje i nadogradnja takvih softvera u narednom periodu, kao osnove hidrološkog sistema dijela cjelokupnog ISV-a, je obaveza korisnika AVP Sava po Zakonu o vodama.

U skladu s ugovorom za period 2024–2026. godina, predviđene su aktivnosti održavanja softverske licence i podrške za razvijene WEB korisničke aplikacije tokom svih 36 mjeseci trajanja ugovora. Također, ugovorom je obuhvaćena edukacija korisnika, odnosno trening zaposlenika Agencije za vodno područje rijeke Save, u trajanju od sedam dana raspoređenih kroz tri godine.

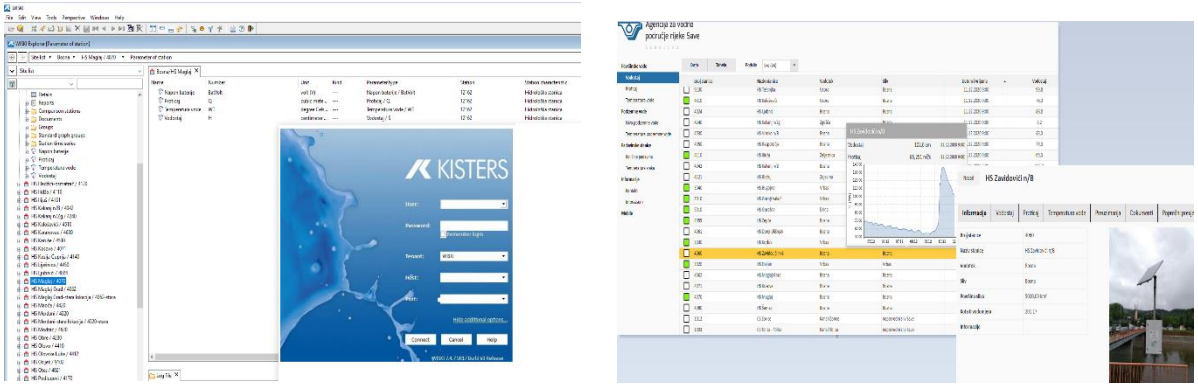

Prikaz WISKI softvera sa web aplikacijom Wiski Web Public

Održavanje ovog sistema obaveza je AVP Sava, što se uspješno i realizuje. Tokom 2025. godine bilo je nekoliko zahtjeva od strane korisnika (AVP Sava) prema proizvođaču ovog softvera, putem Kisters Customer ServiceDesk-a, koji se koristi za održavanje i tehničku podršku. Zahtjevi za intervencijama su bili različite prirode (low, high, medium), sve je bilo u okviru redovnog održavanja, te su isti uspješno i realizovani.
Početkom 2025. godine, tačnije 19. i 20. februara, održan je trening korisnika Wiski softvera tj. radnika AVP Sava Sarajevo. Stručnjak za WISKI softver, sa višegodišnjim iskustvom u radu, održao je dvodnevnu obuku koja je obuhvatila pregled aktuelne konfiguracije WISKI sistema, rad sa stanicama, parametrima i vremenskim serijama, upravljanje i analizu podataka, kontrolu kvaliteta te korištenje alata BIBER. Takođe, obrađene su osnovne i napredne funkcionalnosti SKED modula.

A.3.5. Troškovi održavanja backup i sigurnosnog sistema AVP Sava (Fortinet i antivirus)

Na serverima i korisničkim računarima u "Agenciji za vodno područje rijeke Save" Sarajevo je instaliran antivirusni softver za zaštitu od zloćudnog softvera, kojem je istekla licenca u drugoj polovini septembra 2025. godine. Pored antivirusnog softvera, za zaštitu i kontrolu sistema unutar mreže koji su izloženi internetu koristi se sigurnosni uređaj - firewal (FortiGate FG-100F) za koji se licenca također obnavlja na godišnjem nivou. Da bi serverska i korisnička infrastruktura bila i dalje zaštićena od zloćudnih softvera i da bi se obezbjedilo produženje ovih licenci, provedena je procedura javne nabavke roba u cilju produženja licenci za antivirusnu zaštitu, kao i za korištenje licence za firewal uređaj, za narednu godinu

Antivirusni softver i firewall se koriste za zaštitu sigurnosti lokalne mreže, podataka i serverske infrastrukture koja je u AVP Sava izuzetno zahtjevna i napredna te je tako treba adekvatno zaštititi i obezbijediti da funkcioniše nesmetano i bez zastoja.

Na serverima i korisničkim računarima u AVP Sava je instaliran antivirusni softver za zaštitu od zloćudnog softvera i trenutno se koriste ESET Endpoint Protection Advanced za zaštitu od zloćudnog softvera, a za zaštitu i kontrolu unutar mreže se koristi sigurnosni uređaj - firewal (FortiGate FG-100F) – Unified Threat Protection (UTP). Licence za obje vrste zaštite se obnavljaju na godišnjem nivou.



FORTINET

IMPORTANT: YOU MUST IMMEDIATELY REGISTER THE CONTRACT WITH THE CONTRACT REGISTRATION CODE FOUND ON THIS PAGE.FAILURE TO REGISTER WITHIN 365 DAYS OF THE SERVICE ISSUE DATE COULD RESULT IN SERVICE EXPIRATION.

Service Entitlement Summary

Issue Date : August 29, 2024
Purchase Order Number :
Contract Registration Code :

Support / Maintenance / Subscription Services Included

Qty	Part Number	Description
1	FC-10-F100F-950-02-12	1 Year coverage for FortiGate 100F include: Hardware Advanced HW Firmware & General Updates Enhanced Support Premium Telephone Support Premium Advanced Malware Protection FortiGuard IPS Service FortiGuard URL, DNS & Video Filtering Service AntiSpam

A.3.6. Unapređenje WISKI WEB PUBLIC aplikacije za prikaz hidroloških podataka

Jedno od ključnih aplikativnih rješenja koje je proizvođač razvijao i značajno unaprijedio u posljednjih nekoliko godina jeste Wiski Web Public aplikacija. S obzirom na to da se radi o potpuno inovativnom pristupu prezentaciji i prikazu podataka, u 2025. godini bilo je neophodno izvršiti nadogradnju naše platforme (Wiski Web Public aplikacija) i prilagoditi je novim tehnološkim rješenjima kako bi ista u narednom periodu bila operativna i funkcionalna. Početkom 2025. godine smo obavješteni od strane proizvođača softvera da će postojeća WISKI WEB Public javno dostupna aplikacija, dostići kraj svog životnog ciklusa 31.12.2025. Nakon pažljivog razmatranja, donesena je odluka stručnog tima kompanije Kisters, da se obustavi daljnje održavanje i podrška u radu ove javne aplikacije. Početkom 2026. godine, trenutna verzija Wiski Web Public prestat će biti podržana – više se neće razvijati niti održavati te neće biti kompatibilna s novim verzijama WISKI softvera. Da bi se osigurali kontinuitet funkcionalnosti odnosno nesmetan rad i sigurnost našeg sistema, bilo je potrebno izvršiti prelazak na novu WISKI WEB aplikaciju.

S obzirom da je javna nabavka usluga Unapređenja postojeće WISKI WEB PUBLIC aplikacije za prikaz hidroloških podataka, iz planiranog pregovaračkog postupka prebačena u otvoreni

postupak javne nabavke, priprema projektnog zadatka za takvu vrstu nabavke je trajala duže, pa iz tog razloga realizacija se nije uspjela okončati do kraja 2025. godine.

Započeta je procedura javne nabavke usluga Unapređenje postojeće WISKI WEB PUBLIC aplikacije za prikaz hidroloških podataka (Odluka o pokretanju 21.05.2025. godin), priprema i izrada tenderske dokumentacije je iz ranije navedenih razloga trajala do 11.12.2025. godine (otvaranje ponuda). Trenutno je Ugovor dostavljen odabranom ponuđaču na potpis. Rok za završetak aktivnosti je šest mjeseci od dana potpisivanja, tako da se realizacija istih očekuje u 2026. godini.

B. Tekuća i investiciona ulaganja u vodne objekte

B.1. Zaštitni vodni objekti u vlasništvu Federacije BiH

B.1.1. Troškovi pripreme i tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Federacije BiH

B.1.1.1. Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Srednje Posavine

Vršenje radova odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Srednje Posavine je u skladu sa odredbama Uredbe o planovima odbrane od poplava ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/09) i Federalnog operativnog plana odbrane od poplava ("Službene novine Federacije BiH", broj 97/15).
Faze odbrane od poplava predviđaju:

- pripremne mjere i radove
- operativne odbrambene aktivnosti
- završne mjere i radove

Faza pripremnih mjera i radova obuhvata redovno-tekuće održavanje izgrađenih vodnih objekata i postrojenja, upravljanje i kontrola stanja izgrađenih zaštitnih objekata i postrojenja, pojačano tekuće održavanje - sanacija oštećenih vodnih objekata, smještaj i održavanje odbrambene opreme i dr.
Tekuće održavanje na poplavnom području Srednja Posavina se organizuje i provodi na slijedećim zaštitnim vodnim objektima:

- nasip uz rijeku Savu (Vučilovac-Bosanski Šamac, L= 32,955 km),
- crpne stanice na savskom nasipu: Tolisa (sedam pumpi kapaciteta 15,5 m³/s),
- centar odbrane od poplava u Orašju,
- čuvarske kuće: Grebnice, Kopanice i Tolisa,
- nasuta brana Vidara: građ. visina 21 m sa betonskim ekranom, dužina brane u kruni 240 m, širina u kruni 5 m, tip evakuacionih organa je šahtni u akumulaciji i sa bočnim preljevom za velike vode ukupnog proticajnog kapaciteta 80 m³, i
- nasuta brana Hazna: građ. visina 20 m, dužina brane u kruni 142 m, širina u kruni 5 m, tip evakuacionih organa je šahtni u akumulaciji i sa bočnim preljevom za velike vode ukupnog proticajnog kapaciteta 80 m³.

Za poslove tekućeg održavanja pobrojanih objekata sklopljen je ugovor između AVP Sava i Izvršioca ovih radova i aktivnosti.
Izvršilac je tokom trajanja ugovora dostavljao mjesečne izvještaje o stanju zaštitnih vodnih objekata na poplavnom području Srednje Posavine. Mjesečni izvještaji su sadržavali i dnevnike rada pumpara sa crpnih stanica i vodočuvara.

Radove na košenju nasipa te brana Hazna i Vidara, kao i šljunčanja krune nasipa, odnosno pristupne ceste uz nasip, odobrio je glavni rukovodilac odbrane od poplava.
Radovi na tekućem održavanju zaštitnih vodnih objekata na području Srednje Posavine su realizovani u skladu sa predmjerom radova, dinamikom realizacije dostavljenom od strane izvođača radova uz potrebna odobrenja od strane AVP Sava. Nadzorni organ na navedenim radovima, koji je iste pratio tokom čitave godine, nije imao značajnijih primjedbi na kvalitet i rokove izvršenih radova.
Sve aktivnosti koje je bilo potrebno izvršiti u sklopu Ugovora, kao i plaćanja istih su okončani u toku 2025 godine.



Savski odbrambeni nasip (prije i nakon provedenog košenja)



CS Tolisa



COP Orašje



Savski odbrambeni nasip i pristupni put uz nasip nakon izvršenih radova ravnanja i šljunčanja



Brana Vidara



Brana Hazna

B.1.1.2. Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Odžačke Posavine

Faza pripremnih mjera i radova obuhvata tekuće održavanje izgrađenih vodnih objekata i postrojenja, upravljanje i kontrola stanja izgrađenih zaštitnih objekata i postrojenja, sanacija oštećenih objekata, smještaj i održavanje odbrambene opreme, kako bi stalno bili u funkciji za koju su namijenjeni.

Tekuće održavanje na poplavnom području Odžačka Posavina se organizuje i provodi na slijedećim zaštitnim vodnim objektima:

- crpne stanice "Zorice I i II" (pet pumpi kapaciteta 9,6 m³/s) i "Svilaj" (dvije pumpe kapaciteta 2,0 m³/s),
- centar odbrane od poplava "Prud",
- čuvarske kuće "Novi Grad", "Zorice" i "Svilaj",
- nasip uz rijeku Savu ("Prud-Kadar", L= 27,125 km),
- lijevi odbrambeni nasip uz rijeku Bosnu ("Prud-Neteka", L=7,8 km),
- obodni kanali: "Svilaj-Potočani" (L=10,0 km), "Gornji obodni kanal" (L=2,317 km), "Donji obodni kanal" (L=2,3 km) i "Bosna-Bukovica" (L=6,6 km).

Za poslove tekućeg održavanja pobrojanih objekata sklopljen je ugovor između AVP Sava i Izvršioca ovih radova i aktivnosti.

Izvršilac je tokom trajanja ugovora dostavljao mjesečne izvještaje o stanju zaštitnih vodnih objekata na poplavnom području Odžačke Posavine. Mjesečni izvještaji su sadržavali dnevnike rada pumpara sa crpnih stanica i vodočuvara.

Glavne radove: početak košenja, dionice šljunčanja krune nasipa i dionice za izmuljivanje kanala odobrio je glavni rukovodilac odbrane od poplava.



Održavanje savskog odbrambenog nasipa



Šljunčanje nasipa (savskog i bosanskog)



Izmuljivanje kanala Bosna-Bukovica

Radovi na tekućem održavanju zaštitnih vodnih objekata na području Odžačke Posavine su realizovani u skladu sa predmjerom radova, dinamikom realizacije dostavljenom od strane izvođača radova uz potrebna odobrenja od strane AVP Sava. Nadzorni organ na navedenim radovima, koji je iste pratio tokom čitave godine, nije imao primjedbi na kvalitet i rokove izvršenih radova.
Sve aktivnosti i plaćanja po ovoj stavci su okončane u toku 2025. godine.

B.1.1.3. Tekuće održavanje zaštitnog vodnog objekta CS Đurići-Vučilovac na području Brčko Distrikta

Realizacija radova na tekućem održavanju zaštitnog vodnog objekta CS Đurići–Vučilovac AVP Sava vrši zajedno sa ostalim sufinansijerima: JU Vode Srpske i Brčko Distrikt. AVP Sava provodi postupak javne nabavke u skladu sa odredbama Sporazuma o upravljanju i sufinansiranju

održavanja crpne stanice "Đurići"–Vučilovac za period 2023.-2025. godina. Prema odredbama člana 4. Sporazuma o upravljanju i sufinansiranju održavanja crpne stanice "Đurići"–Vučilovac za period 2023.-2025. godina, sve aktivnosti koje se provode u cilju upravljanja i održavanja ovog zaštitnog vodnog objekta trebaju biti usaglašene i finansirane u utvrđenom omjeru između tri sufinansijera (AVP Sava – 67%, Brčko Distrikt – 18% i Vode Srpske – 15%).
Radovi tekućeg održavanja se izvode na sljedećim objektima:

- crpna stanica sa vanjskom pripadajućom površinom, crpnim bazenom, cjevovodom i izlaznim bazenom,
- dovodni kanal od sabirnog kanala do crpnog bazena i odvodni kanal od izlaznog bazena do rijeke Save,
- sabirni kanal u pripadajućoj dužini,
- "Novi gravitacioni ispust" sa dovodnim kanalom od sabirnog kanala i odvodnim kanalom do rijeke Save,
- "Stari gravitacioni ispust" sa dovodnim kanalom od sabirnog kanala i odvodnim kanalom do rijeke Save i
- čuvarska kuća sa pripadajućom površinom.

U cilju lakšeg provođenja ove aktivnosti zaključen je Okvirni sporazum za predmetne radove na period trajanja navedenog Sporazuma. Na osnovu pomenutog Okvirnog sporazuma sklopljen je pojedinačni ugovor za izvođenje radova tekućeg održavanja zaštitnog vodnog objekta CS Đurići- Vučilovac na području Brčko distrikta za 2025. godinu koji je u skladu sa potrebama na terenu realizovan, a sa 31.12.2025. godine i okončan.
Sve aktivnosti i plaćanja po ovoj stavci u skladu sa planiranim iznosom su okončane u toku 2025. godine.

B.1.1.4. Tehničko osmatranje brana i akumulacija Hazna i Vidara u Gradačcu

Nasute brane "Vidara" i "Hazna" spadaju u zaštitne vodne objekte u vlasništvu Federacije BiH. Smještene su u općini Gradačac i pripadaju sistemu odbrane od poplava poplavnog područja Srednja Posavina.
Odlukom Vlade Federacije BiH (akt broj 274/2001 od 14.06.2001. godine) određene su kao zaštitni vodni objekti u vlasništvu Federacije BiH koji služe za zaštitu od voda ljudi i imovine na području općina Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje i Gradačac preneseni su na korištenje i upravljanje Javnom preduzeću za "Vodno područje rijeke Save" Sarajevo. „Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo je odredbama Zakona o vodama definirana kao pravni sljedbenik navedenog javnog preduzeća.
U cilju provjere stabilnosti i funkcionalnosti brana, te da bi se osigurali uslovi da brane služe svojoj svrsi dugi niz godina, vrši se tehničko osmatranje brana. Također, budući da brane po svojoj visini spadaju u visoke brane, zakonska obaveza je vršiti tehničko osmatranje.
Na osnovu rezultata osmatranja obezbjeđuje se:

- provjera da li se projektom predviđeni uslovi ostvaruju ili ne (u cjelini ili lokalno);
- stjecanje saznanja o ponašanju objekta u okviru projektom predviđenih uslova;
- preduzimanje dopunskih mjera osmatranja, sanacije ili osiguranja ugroženog dijela objekta ako su neke mjerene veličine nepovoljnije od projektom predviđenih ili to ugrožava sam objekat ili okolinu objekta.

U konkretnom slučaju brane "Vidara" i "Hazna" se kontinurano osmatraju od 1999. godine, tj. uspostavljen je sistem tehničkog osmatranja koji obuvata:

1. Geodetske metode osmatranja,
2. Fizikalne metode osmatranja,

3. Analiza stanja brane.




Brana Vidara




Brana Hazna

Ugovor o tehničkom osmatranju brana i akumulacija Hazna i Vidara, po otvorenom postupku, sklopljen je sa firmom „Rudarski institut" d.d. Tuzla na period od 2024. - 2026. godine.
Sve aktivnosti po ovoj stavci planirane za 2025. godinu su okončane.

B.1.1.5. Tehnička zaštita objekata sistema odbrane od poplava i laboratorije za vode AVP Sava

U skladu sa Zakonom o zaštiti ljudi i materijalnih dobara "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo bila je obavezna da uspostavi tehničku zaštitu pojedinih objekata u vlasništvu Federacije BiH koji su joj po posebnoj Odluci Vlade predati na upravljanje, kao i Laboratorije za vode koja se nalazi u vlasništvu AVP Sava. Tehnička zaštita je uspostavljena instalacijom protivprovalnog alarmnog sistema 2010. godine koji je povezan na dojavni operativni centar ovlaštene agencije prema Zakonu o agencijama za zaštitu ljudi i imovine.
Tehnička zaštita predstavlja zakonsku obavezu i potrebno je provesti postupak javne nabavke usluga Tehničke zaštite objekata sistema odbrane od poplava i Laboratorije za vode. S tim u vezi po proceduri propisanoj Zakonom o javnim nabavkama (ZJN) i Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz aneksa II dio B ZJN-a sklopljen je ugovor za period od 01.03.2024. do 01.03.2027. godine. U tom pravcu vrše se kontinuirane aktivnosti osiguranja od provale, krađa, sabotaža na objektima sistema odbrane od poplava (crpnim stanicama, čuvarskim kućama, centrima odbrane od poplava na poplavnim područjima Srednja i Odžačka Posavina). Svi objekti su opremljeni video nadzorom i protivprovalnim uređajima. Održavanje sistema i hitne intervencije po potrebi vrše se od strane ovlaštene zaštitarske agencije.
Sve aktivnosti i plaćanja po ovoj stavci su okončane u toku 2025. godine.

B.1.1.6. Troškovi odbrane od poplava na područjima koja su u nadležnosti AVP Sava

U slučaju hidroloških stanja kada dolazi do proglašenja redovne ili vanredne odbrane od poplava na poplavnim područjima sa izgrađenim zaštitnim vodnim objektima u Posavskom kantonu javljaju se troškovi u cilju zaštite ljudskih života i materijalnih dobara od posljedica plavljenja. Nakon prolaska plavnog vala ti se troškovi fakturišu od strane pravnog lica koje sprovodi aktivnosti na odbrani od poplava na ovim područjima.

Krajem mjeseca marta i početkom aprila 2025. godine, zbog povišenih nivoa rijeke Save, na snazi su bile mjere redovne odbrane od poplava na područjima Odžačke i Srednje Posavine.

Prilikom provođenja mjera aktivne odbrane od poplava na ovim područjima sa izgrađenim zaštitinim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH nastali su troškovi u iznosu od 49.060,44 KM sa PDV-om za područje Odžačke Posavine i 67.552,29 KM sa PDV-om za područje Srednje Posavine. Isti su isplaćeni, na osnovu dostavljenih elaborata, pravnim licima koja provode mjere aktivne odbrane od poplava.

Nakon tog perioda tokom 2025. godine nisu zabilježeni povećani nivoi rijeke Save koji bi uzrokovali proglašenje mjera redovne ili vanredne odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Posavskog kantona, odnosno provođenja mjera aktivne odbrane na poplavnim područjima Odžačka i Srednja Posavina.

B.1.1.7. Sanacije i aktivnosti na otklanjanju poslijedica od štetnog djelovanja voda na objektima u vlasništvu Federacije BiH (FOP član 7)

Sanacija klizišta na savskom odbrambenom nasipu na području Odžačke Posavine, lokalitet Kopačević rampa-2025

Sredinom mjeseca marta 2025. godine došlo je do pojave dva manja klizišta na savskom odbrambenom nasipu na lokalitetu ušća obodnog kanala Svilaj-Potočani u rijeku Savu na stacionaži savskog odbrambenog nasipa km 17+040 (Kopačević rampa) sa vodne strane u ukupnoj dužini od cca 30 m.

Pošto su se očekivale intenzivnije padavine i povećani vodostaji rijeke Save, obzirom da nije bilo moguće izvršiti potpunu sanaciju nasipa, javila se potreba za urgentno djelovanje u smislu iznalaženja privremenog tehničkog rješenja kojim bi se spriječila dalja devastacija tijela nasipa. Tijela klizišta su prekrivena nepropusnim folijama radi zaštite od atmosferskih padavina a u cilju sprečavanja dalje devastacije tijela nasipa, do stvaranja povoljnih hidrometeorolških uslova za potpunu sanaciju savskog odbrambenog nasipa na predmetnom lokalitetu. Na „prednasipu", koji se nalazi na tom lokalitetu, vrećema sa pijeskom je izvršeno dodatno nadvišenje istog u cilju zaustavljanja preljevanja vode iz rijeke Save kojim se postiglo da nožica nasipa (na kojem se nalaze klizišta) nema dodira sa vodom. Procijedna voda koja se nakupljala u prostoru između savskog nasipa i navedenog prednasipa, pumpama se izbacivala u rijeku Savu.

Za potrebe potune sanacije istog, od strane firme Vodoprivreda „POSAVINA" d.o.o. Odžak, dostavljena je dokumentacija usklopu koje je dato tehničko rješenje kao i predmjer i predračun potrebnih radova.

Sa firmom Vodoprivreda „POSAVINA" d.o.o. Odžak je (po javnom oglasu o otvorenom postupku objavljenom dana 15.09.2023. godine broj Obavještenja broj: 1132-1-3-124-3-105/23 pod nazivom: „Vršenje radova odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Odžačke Posavine za period 2024. – 2026. godina") sklopljen Okvirni sporazum za vršenje radova odbrane od poplava na zaštitnim vodnim

objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Odžačke Posavine (akt broj 10-1001-14/23 od 06.11.2023. godine).
Članom 4. Navedenog Okvirnog sporazuma Naručilac "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo i Izvođač tokom ugovornog perioda (2024.-2026.) imaju pravo da zaključuju posljedične (radovi izazvani višom silom) ili pojedinačne ugovore za radove, usluge i nabavke uz korištenje finansijskih elemenata i cijena datih u ponudi Izvođača broj: VP-115-24/23 od 18.10.2023. godine (specifikacija data u prilogu akta).
Na osnovu svega navedenog u skladu sa članom 4. Okvirnog sporazuma za vršenje radova odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Odžačke Posavine pokrenute su aktivnosti na dodjeli Ugovora po Okvirnom sporazumu „Sanacija klizišta na savskom odbrambenom nasipu na području Odžačke Posavine, lokalitet Kopačević rampa-2025" uz korištenje finansijskih elemenata i cijena datih u ponudi Izvođača broj: VP-115-24/23 od 18.10.2023. godine.
Ugovor je potpisan krajem mjeseca augusta sa rokom od 60 radnih dana. Radovi su uspješno i u skladu sa ugovorom okončani unutar ugovorenog roka.



Sanacija klizišta- lokalitet Kopačević rampa, stacionaža savskog odbrambenog nasipa km 17+000

Sanacija ustave Starača, općina Odžak

Na savskom odbrambenom nasipu u općini Odžak, na stacionaži km 3+000, nalazi se ustava Starača. Trenutno stanje objekta je takvo da se istim ne može upravljati na adekvatan način, o čemu je pravno lice angažovano na tekućem održavanju zaštitnih vodnih objekata u vlasništvu Federacije BiH na području Odžačke Posavine svojim dopisima (redovni mjesečni izvještaji tokom 2025. godine) izvještavalo Agenciju. Naime mehanizam za manipulaciju ovog objekta nije, zbog starosti i česte upotrebe, u potpunosti funkcionalan. Posljedica toga je

nekontrolisan ulazak vode iz rijeke Save u branjeno područje, što direktno ugrožava sigurnost stanovništva i poljoprivrednih površina.
Predmetna problematika posebno je došla do izražaja tokom redovne odbrane od poplava u periodu od 29.03.2025. do 08.04.2025. godine, kada je usljed povišenog vodostaja rijeke Save došlo do ulaska vode kroz ustavu u branjeno područje (korito Starače). Također je Područni rukovodioc odbrane od poplava na poplavnom području Odžačka Posavina svojim „Izvještajem o provedenim mjerama odbrane od poplavana poplavnom području Odžačka Posavina u periodu od 29.03.2025. do 08.04.2025. godine" broj: VP-109/25 od 18.06.2025. godine predložio sanaciju predmetne ustave.
Imajući u vidu značaj ustave za odbrambeni sistem i zaštitu od poplava poplavnog područja Odžačka Posavina, neophodno je bilo pokrenuti postupak sanacije predmetnog objekta kako bi se obezbijedilo njegovo pravilno funkcionisanje i spriječile štete većih razmjera. Sredinom mjeseca septembra 2025. godine, putem konkurentskog zahtjeva, pokrenut je postupak za dodjelu ugovora sanacije predmetnog objekta. Ugovor je potpisan sredinom mjeseca oktobra sa rokom od 90 radnih dana od dana uvođenja Izvršioca u posao. U toku 2025. godine realizovano je blizu 80% ukupno ugovorenih radova, a nastavak radova se očekuje početkom 2026. godine.



Radovi na sanaciji ustave Starača u Prudu

B.1.1.8. Pripremne mjere i radovi na objektima u vlasništvu Federacije BiH (FOP član 5)

Pojačano tekuće održavanje – dodatno uklanjanje rastinja sa zaštitnih vodnih objekata na području Srednje Posavine – 2025. godina

Pravno lice (grupa ponuđača „DEJOKOP" d.o.o. Bok, Orašje i "Den Alm Company" d.o.o. Lukavac) angažovano za radove odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Srednje Posavine za Fazu pripremnih mjera i radova u 2025. godini, obratilo se "Agenciji za vodno područje rijeke Save" Sarajevo aktom broj: 23-07-01/25 od 02.07.2025. godine, sa zahtjevom za dobivanje saglasnosti za izvođenje radova međukošnje dijela zaštitnih vodnih objekata na području Srednje Posavine, odnosno dijela savskog odbrambenog nasipa u naseljenim područjima (Orašje, Ugljara, Donja Mahala, Tolisa), tj. na slijedećoj dionici:

- Savski odbrambeni nasip od km 19+760 (180 m od rampe Mirčeta) do km 27+238 (groblje Tolisa).

U pomenutom zahtjevu navedeni su detaljni razlozi potrebe izvođenja radova međukošnje savskog odbrambenog nasipa na navedenoj dionici. Nadzorni organ nad radovima odbrane od poplava - Faza pripremnih mjera - na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Srednje Posavine Posavine u 2025. godini, firma "RADIS" d.o.o. Istočno Sarajevo, je svojim aktom broj: NA-174-07/25 od 04.07.2025. godine, obavijestila AVP Sava da je nakon obilaska terena utvrdila opravdanost zahtjeva Izvođača za navedenim radovima, te predložila da se isti odobre od strane AVP Sava.
Također, AVP Sava je prethodno zaprimila i akt Grada Orašja broj: 01-40-589/25 od 23.06.2025. godine, kojim se prema AVP Sava obratio Gradonačelnik Orašja sa molbom za vanrednim košenjem nasipa na području grada Orašja u kojem su navedeni i razlozi za zatraženo.
Sa grupom ponuđača „DEJOKOP" d.o.o. Bok Orašje i "Den Alm Company" d.o.o. Lukavac je sklopljen Okvirni sporazum za vršenje radova odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Srednje Posavine za period 2024. – 2026. godina (akt broj: 10-1000-11/23 od 02.11.2023. godine).
Članom 4. navedenog Okvirnog sporazuma, Naručilac i Izvođač tokom ugovornog perioda (2024.-2026.) imaju pravo da zaključuju posljedične ili pojedinačne ugovore za radove, usluge i nabavke uz korištenje finansijskih elemenata i cijena datih u ponudi Izvođača broj: 65-10/23 od 12.10.2023. godine.
Na osnovu svega navedenog i u skladu sa članom 4. Okvirnog sporazuma za vršenje radova odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Srednje Posavine, pokrenuta je aktivnost na dodjeli Ugovora za „Pojačano tekuće održavanje - uklanjanje rastinja sa zaštitnih vodnih objekata, područje Srednja Posavina – 2025. godina" uz korištenje finansijskih elemenata i cijena datih u ponudi Izvođača broj: 65-10/23 od 12.10.2023. godine.
Ugovor za predmetne radove potpisan je krajem mjeseca jula 2025. godine, te su svi ugovorom predviđeni radovi uspješno okončani u predviđenom roku.



Savski odbrambeni nasip nakon provedenih radova dodatnog uklanjanja rastinja

Pojačano tekuće održavanje-dodatno uklanjanje rastinja sa zaštitnih vodnih objekata, područje Odžačka Posavina – 2025. godina

Nadzorni organ nad radovima odbrane od poplava - Faza pripremnih mjera - na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Odžačke Posavine "Radis" d.o.o. Istočno Sarajevo u 2025. godini je aktom broj: NA 181-07/25 od 14.07.2025. godine proslijedio "Agenciji za vodno područje rijeke Save" Sarajevo zahtjev pravnog lica angažovanog za radove odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Odžačke Posavine za Fazu pripremnih mjera i radova u 2025. godini Vodoprivreda „POSAVINA" d.o.o. Odžak (akt broj VP-125/25 od 11.07.2025. godine). Navedenim zahtjevom od AVP Sava je zatraženo odobrenje za izvođenje međukošnje zaštitnih vodnih objekata na području Odžačke Posavine u naseljenim područjima Prud, Zorice i Vojskoma, odnosno na dionicama:

- Lijevi odbrambeni nasip uz rijeku Bosnu od km 0+000 do km 1+075 i
- Savski odbrambeni nasip od km 0+000 do km 8+000

U obrazloženju navedenog zahtjeva navedeni su razlozi potrebe izvođenja radova međukošnje zaštitnih vodnih objekata na navedenom području, za koji nadzorni organ dao saglasnost.
Sa ponuđačem Vodoprivreda „Posavina" d.o.o. Odžak je (po javnom oglasu o otvorenom postupku objavljenom dana 15.09.2023. godine broj Obavještenja broj: 1132-1-3-124-3-105/23 pod nazivom: „Vršenje radova odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Odžačke Posavine za period 2024. – 2026. godina") sklopljen Okvirni sporazum za vršenje radova odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Odžačke Posavine (akt broj 10-1001-14/23 od 06.11.2023. godine).
Na osnovu svega navedenog i u skladu sa članom 4. Okvirnog sporazuma za vršenje radova odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Odžačke Posavine pokrenute su aktivnosti na dodjeli Ugovora za Pojačano tekuće održavanje-dodatno uklanjanje rastinja sa zaštitnih vodnih objekata, područje Odžačka Posavina-2025. godina uz korištenje finansijskih elemenata i cijena datih u ponudi Izvođača broj VP-115-24/23 od 18.10.2023. godine.
Ugovor je potpisan početkom mjeseca augusta sa rokom od 15 dana. Radovi su uspješno i u skladu sa ugovorom okončani unutar ugovorenog roka.



Radovi na pojačanom tekućem održavanju

B.1.1.9. Tehnički prijem za izvedene radove rekonstrukcije zaštitnog vodnog objekta – savskog odbrambenog nasipa na području Srednje Posavine

Krajem prošle godine završene su sve aktivnosti na Rekonstrukciji savskog odbrambenog nasipa na području Srednje Posavine na dionici km 31+315 – km 32+950, koje su finansirane od strane AVP Sava.
Obzirom da obuhvat navedene rekonstrukcije obuhvata teritoriju Općine Domaljevac-Šamac većim dijelom, te Grada Orašja manjim dijelom, isti su izdali odvojene građevinske dozvole za dio radova koji se odnosi na njihovo područje. Nakon završetka svih radova, pokrenut je postupak ishodovanja upotrebne dozvole za rekonstruisanu dionicu nasipa, te je kao prvi korak od Općine Domaljevac-Šamac, odnosno Grada Orašje, zatraženo formiranje Komisije za tehnički pregled rekonstruisanog nasipa. Isti su u svojim odgovorima naveli da je uslov za formiranje navedenih komisija uplata troškova rada Komisije u ukupnom iznosu od 9.611,70 KM (Općina Domaljevac-Šamac je za svoj dio zatražila naknadu od 5.461,70 KM, dok je Grad Orašje za svoj dio zatražio naknadu od 4.150,00 KM).
Uzevši u obzir prethodno navedeno, a u cilju nastavka postupka ishodovanja upotrebne dozvole za rekonstruisanu dionicu savskog odbrambenog nasipa, AVP Sava je krajem 2025. godine izvršila uplatu navedenog iznosa Općini Domaljevac-Šamac i Gradu Orašju, te se tehnički pregled rekonstruisanog nasipa očekuje pri sticanju povoljnih vremenskih uslova (proljeće).

B.2. Preventivne aktivnosti i radovi odbrane od poplava na površinskim vodama I kategorije

B.2.1. Izrada projektne dokumentacije

B.2.1.1. Inoviranje projektne dokumentacije i izrada elaborata za radove na obezbjeđenju proticajnog profila na vodotocima I kategorije

Cilj izrade elaborata je zaštita obala rijeka u Federaciji BiH, a na vodnom području rijeke Save. Obzirom da su korita neuređena i nedovoljnog kapaciteta, pri velikim vodama na konkavnim krivinama dolazi do stalnog odnošenja zemljišta. Elaboratima se predlažu tehnička rješenja koja će obezbjediti zaštitu konkavnih obala (najčešće na najurgentnijem lokalitetu) od dalje devastacije. Elaboratima se često predviđa povećanje proticajnog profila što je neminovnost, obzirom na činjenicu da se zbog nedovoljnih finansijskih sredstava za ulaganje u objekte odbrane od poplava, javljaju veća plavljenja, koje pričinjavaju veće štete na stambenim i privrednim objektima i poljoprivrednom zemljištu. U 2025. godini sa ove stavke nisu korištena sredstva, jer se nije ukazala potreba.

B.2.1.2. Izrada projektne dokumentacije - čišćenje korita rijeke Bosne u Zenici, na lokaciji od Energopetrolove pumpe do petlje na magistralnoj cesti M17, u dužini od cca 1200 m - desna obala

Aktom broj 02-45-17310/24/24 od 19.9.2024. godine Grad Zenica je Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo dostavio prijedlog projekata za Plan i Finansijski plan Agencije za 2025. godinu, među kojima je kandidovana i izrada projektne dokumentacije pod nazivom „Čišćenje korita rijeke Bosne, na lokaciji od Energopetrolove pumpe do petlje na magistralnoj cesti M17, u dužini od cca 1200 m – desna obala". Ovaj projekat je uvršten u Plan i Finansijski plan AVP Sava za 2025. godinu pod nazivom stavke „Izrada projektne dokumentacije - čišćenje korita rijeke Bosne u Zenici, na lokaciji od Energopetrolove pumpe do petlje na magistralnoj

cesti M17, u dužini od cca 1200 m - desna obala". U Izvještaju o obilasku lokacija kandidovanih za Plan i Financijiski plan AVP rijeke Save za 2025. godinu, Grad Zenica, broj 50-1127-18/24 od 21.11.2024. godine, konstatovano je da je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju - čišćenje korita rijeke Bosne u cilju povećanja proticajnog profila. Prilikom priprema za izradu projektnog zadatka za predmetni projekat, uvidom u arhivu AVP Sava došlo se do saznanja da za predmetnu lokaciju već postoji urađena projektna dokumentacija naziva „Elaborat Obezbjeđenje proticajnog profila desne obale rijeke Bosne na potezu od željezničkog mosta na ulazu u naselje Blatuša pa nizvodno do mosta – putne petlje na M17", urađen od strane Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo, decembar 2021. godine, te se u skladu sa navedenim odustalo od realizacije ove stavke plana, jer je već ranije realizovana.

B.2.1.3. Izrada projektne dokumentacije za uređenje dijela korita rijeke Spreče na lokalitetu Oključak-Industrijska zona u Općini Doboj Istok

Aktom broj 12-21-4641/24-3 od 26.09.2024. Općina Doboj Istok je kandidovala izradu projektne dokumentacije za uređenje dijela korita na lokalitetu Oključak – industrijska zona. Predmetni lokalitet se nalazi unutar područja sa potencijalno značajnim rizikom od poplava APSFR (prema preliminarnoj procjeni rizika od poplava za vodno područje rijeke Save 2013). Prema rezultatima hidrodinamičkog modela rijeke Spreče urađenog za potrebe izrade mapa opasnosti i rizika od poplava u BiH vidljivo je da je cijelom dužinom predmetna dionica pod uticajem štetnog djelovanja voda rijeke Spreče ranga pojave 1/100. Na navedenoj lokaciji do sada su urađeni zahvati na uzvodnom dijelu u smislu obaloutvrde i osiguranja desne obale, te postoji potreba da se nastavi sa radovima na ovom lokalitetu u cilju postizanja jedne cjelovite zaštite ove lokacije, odnosno desne obale, na kojoj je i industrijska zona. Okolno zemljište je uglavnom poljoprivredno i industrijsko. Orjentaciona dužina predmetne dionice je 350 m. Izrada projektne dokumentacije je neophodan preduslov za sve navedene aktivnosti. Projektna dokumentacija je završena i dostavljena u AVP Sava, a prema planu nabavki revizija projekta je predviđena u prvom kvartalu 2026. godine.

B.2.1.4. Izrada Glavnog projekta: Sanacija obala rijeke Une u Bihaću na potezu Bakšaiški i Vrkašićki most

Aktom broj 04/2-21-5068/24 od 27.09.2024. godine Grad Bihać je Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo dostavio prijedlog projekata za Plan i Finansijski plan AVP Sava za 2025. godinu, među kojima je kandidovana i izrada projektne dokumentacije pod nazivom „Sanacija obala rijeke Une na potezu Bakšaiški most – Vrkašićki most". Ovaj projekat je uvršten u Plan i Finansijski plan AVP Sava za 2025. godinu pod nazivom stavke „Izrada glavnog projekta: Sanacija obala rijeke Une u Bihaću na potezu Bakšaiški i Vrkašićki most". U Izvještaju o obilasku lokacija kandidovanih za Plan i Finansijiski plan AVP rijeke Save za 2025. godinu, Grad Bihać, bez broja od 19.11.2024. godine, konstatovano da je potrebna sanacija erodabilnih dijelova obala na više lokacija u naseljima Bakšaiš i Kralje (tri lokaliteta prioritetno) lijeva obala ispod mosta Bakšaiš, dio desne obale rijeke Une iza porodične kuće cca 20 m dužine i desna obala Une nasuprot Jotanovih otoka, uz napomenu da je za lokaciju lijeve obale ispod mosta Bakšaiš projektna dokumentacija već urađena, a da za preostale dvije lokacije treba izraditi projektnu dokumentaciju. Prilikom priprema za izradu projektnog zadatka za predmetni projekat, utvrđeno je da je i lokacija kod Jotanovih otoka također već ušla u Plan i Finansijski plan AVP Sava za 2024. godinu i u fazi je realizacije. U skladu sa navedenim, pod ovom stavkom je ostala za realizaciju jedna lokacija, tj. dio desne obale rijeke Une iza porodične kuće, dužine cca 20 m. Uvidom u rezultate hidrodinamičkog modela rijeke Une, urađenog za potrebe izrade mapa opasnosti i rizika od poplava u BiH, vidljivo je da predmetna dionica

odnosno stambeni objekti nisu poplavljeni ali se nalaze pod određenim uticajem velikih voda rijeke Une ranga pojave 1/100, na način da linija velikih voda tangira parcele ili objekte. Također, prilikom obilaska lokacije sačinjena je fotodokumentacija na kojoj je vidljivo da postoje zidovi uz susjednu parcelu, te bi rješavanje ovako kratke dionice na samo jednoj parceli moglo dovesti do ugrožavanja stabilnosti zidova na susjednoj parceli. Za rješavanje problematike na predmetnoj parceli bi trebalo obuhvatiti duži potez, uzvodno i nizvodno, kako bi se moglo dati kvalitetno rješenje, a što zavisi od mogućnosti rješavanja imovinsko pravnih odnosa na predmetnom potezu. Prema tome, obzirom da se pokazalo da od tri lokacije koje su kandidovane u sklopu projekta, dvije su već ranije ušle u Plan i Finansijski plan AVP Sava, a treća koju bi trebalo raditi je veoma kratak potez, odnosno dio desne obale rijeke Une iza porodične kuće cca 20 m dužine, te da sam objekat nije ugrožen plavljenjem, a da bi lokalno rješavanje problematike moglo ugroziti susjedne parcele odnosno objekte, odustalo se od realizacije ove stavke plana.

B.2.1.5. Izrada projektne dokumentacije za zaštitu obale Une od erozije na 6 lokaliteta u Gradu Bosanska Krupa

Aktom broj 02-45-17310/24 od 19.09.2024. godine Grad Bosanska Krupa je kandidovao izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova za zaštitu od erozije obala rijeke Une na više lokaliteta u naseljima Drenova Glavica, Bosanska Otoka i Bosanska Krupa. Na ovim lokalitetima su česta izljevanja Une iz korita i erozivni procesi na konkavnim obalama koji su uzrok odnošenja kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta, kao i ugrožavanje stambenih i gospodarskih objekata. Izradom projektne dokumentacije stvaraju se preduslovi za kasnije aktivnosti u cilju sanacije tih lokaliteta. Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo i firma Institut za građevinstvo IG Banja Luka d.o.o. potpisali su Ugovor broj 30-603-52/25 od 8.8.2025. godine koji se odnosi na realizaciju projekta LOT 2: Izrada projektne dokumentacije za zaštitu obale Une od erozije na 6 lokaliteta u Gradu Bosanska Krupa. Institut za građevinstvo IG Banja Luka d.o.o. je službeno obavješten dana 01.12.2025. godine da im rok za realizaciju ističe 06.12.2025. godine uz molbu da projektnu dokumentaciju isporuče u ugovorenom roku. Dana 10.12.2025. na protokol AVP Sava je zaprimljen zahtjev Instituta za građevinstvo IG Banja Luka d.o.o. broj DO-IGBL-IN-PN-3214/25 od 5.12.2025. godine, kojim se traži produženje roka ugovora o izradi predmetne projektne dokumentacije za dodatnih 60 dana. Zbog toga je postupljeno u skladu sa članom 12. ugovora, tj. izvršen je jednostrani prekid ugovora zbog neispunjavanja ugovornih obaveza u utvrđenim rokovima i na utvrđen način. Izrada projektne dokumentacije je ugovorena u 2025. godini, a zbog neispunjavanja ugovorne obaveze ugovor je raskinut. Obzirom da je stavka ostala nerealizovana, planirana sredstva će se u 2026. godini realizovati kao višak prihoda nad rashodima.

B.2.1.6. Izrada projektne dokumentacije za regulaciju korita rijeke Tinje u Srebreniku uzvodno od mosta Salihovića u MZ Tinja Donja – nastavak

Aktom broj 07-948/24 od 30.09.2024. godine Grad Srebrenik je kandidovao izradu projektne dokumentacije za regulaciju korita Tinje u MZ Tinja Donja. Predmetna lokacija nalazi se cca 230 metara uzvodno od mosta Salihovića u naselju Tinja Donja. Potez rijeke Tinje od mosta Salihovića pa uzvodno u dužini cca 230 metara je uređen u ranijem periodu, te bi uređenje ove lokacije predstavljalo nastavak na ranije izvedene radove. Na predmetnoj lokaciji trenutno je ugroženo par stambenih i poslovnih objekata erozijom lijeve obale rijeke Tinje. Obilaskom lokacije utvrđeno je da je korito rijeke Tinje na ovoj dionici veoma zaraslo i poprilično usko, te je vidljivo da je rađena neka vrsta zaštite lijeve obale kamenom, vjerovatno od strane vlasnika parcela. Predmetni lokalitet se nalazi unutar područja sa potencijalno značajnim

rizikom od poplava APSFR (prema preliminarnoj procjeni rizika od poplava za vodno područje rijeke Save 2013). Prema rezultatima hidrodinamičkog modela rijeke Tinje urađenog za potrebe izrade mapa opasnosti i rizika od poplava u BiH vidljivo je da predmetna dionica, tj. lijeva obala nije pod uticajem plavljenja stogodišnjim vodama, dok na desnoj obali dolazi do plavljenja poljoprivrednih površina. Bitno je napomenuti da predmetna lokacija nije razmatrana kroz Aneks 3.2. Pregled predloženih mjera u Neposrednom slivu rijeke Save - UoM 1, izrađenog u okviru projekta „Tehnička pomoć za izradu Planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu". Na osnovu prethodnih konstatacija, te činjenice da se radi o erozijom ugroženim stambenim i poslovnim objektima, konstatuje se da postoji potreba da se nastavi sa uređenjem lijeve obale rijeke Tinje na potezu dužine cca 180 m uzvodno od uređene dionice, sa ciljem zaštite od erozije lijeve obale i objekata u njenoj blizini. Izrada projektne dokumentacije je neophodan preduslov za sve navedene aktivnosti. Projektna dokumentacija je završena i dostavljena u AVP Sava, a prema planu nabavki revizija projekta je predviđena u prvom kvartalu 2026. godine.

B.2.1.7. Izrada glavnog projekta za čišćenje i uređenje korita rijeke Drine na dionici vodotoka od Ustikoline do Goražda u svrhu razvoja turizma na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Aktom broj 04-21-1423-2/24 od 19.09.2024. godine Ministarstvo za privredu Bosansko–podrinjskog kantona Goražde je Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo dostavilo prijedlog projekta za Plan i Finansijski plan AVP Sava za 2025. godinu, pod nazivom „Čišćenje i uređenje korita rijeke Drine, na dionici vodotoka od Ustikoline do Goražda u svrhu razvoja turizma na prostoru Bosansko – podrinjskog kantona Goražde". Ovaj projekat je uvršten u Plan i Finansijski plan AVP Sava za 2025. godinu pod nazivom stavke „Izrada glavnog projekta za čišćenje i uređenje korita rijeke Drine na dionici vodotoka od Ustikoline do Goražda u svrhu razvoja turizma na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde". U okviru zahtjeva za realizaciju projekta je traženo da se izvrši čišćenje i uređenje korita rijeke Drine na šest (6) lokaliteta na dionici vodotoka od Ustikoline do Goražda, i to: Lokalitet 1: Modran – lijeva obala rijeke u Općini Foča FBiH, Lokalitet 2: Ada – na desnoj obali rijeke Drine u Općini Foča FBiH, Lokalitet 3: Izletište ispod „Desetke" kod naselja Perjani – lijeva obala rijeke – Grad Goražde, Lokalitet 4: Sadba – desna obala rijeke – Grad Goražde, Lokalitet 5: Zelena – Zupčići – desna obala rijeke – Grad Goražde, i Lokalitet 6: Hubjeri – desna obala rijeke – Grad Goražde, a kao zahvati koji bi se vršili na prethodno navedenim lokalitetima navodi se uklanjanje niskog rastinja, stabala manjeg promjera, riječnog nanosa, nivelisanje terena te eventualno djelimičnu regulaciju obale rijeke Drine na nekim od navedenih lokaliteta, čime bi se stvorili bolji uslovi za pristupačnost rijeci Drini te korištenje pogodnosti ovog vodotoka za splavarenje, kajakaštvo, rafting, kampovanje, izletnički turizam i drugo. U izvještaju sa obilaska lokaliteta na rijeci Drini nominovanih za Plan i Finansijski plan AVP Sava za 2025. godinu, navodi se da je sa predstavnicima Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona izvršen zajednički obilazak četiri lokaliteta i da se sva četiri nalaze na teritoriji grada Goražda (Lokaliteti: 3, 4, 5 i 6). U izvještaju se navodi da je na lokalitetima potrebno uklanjanje niskog rastinja, uklanjanje stabala manjeg promjera, uklanjanje riječnog nanosa te nivelisane terena za pristupačnost rijeci Drini za kupanje, te da bi se provođenjem pomenutih aktivnosti, nivelisanjem priobalnog dijela stvorili uslovi za korištenje ovog lokaliteta za kupanje, kampovanje, izletišni turizam. Prilikom priprema za izradu projektnog zadatka za predmetni projekat, uvidom u „Studiju o mogućnostima izgradnje kupališta na rijeci Drini, na potezu od Ustikoline do Goražda" koju je uradio Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu d.d. Sarajevo u januaru 2014. godine za Vladu Bosansko–podrinjskog kantona Goražde kao naručitelja, može se

zaključiti da od kandidovanih lokaliteta, lokalitet 6: Hubjeri nije analiziran kroz pomenutu studiju, dok su lokalitet 4: Sadba i lokalitet 5: Zelena ocijenjeni kao lokaliteti koji nisu pogodni za izgradnju plaža i kupališta sa više aspekata. Uvidom u detaljne analize date kroz pomenutu studiju, kroz koju su date smjernice daljih koraka u pravcu mogućnosti korištenja navedenih lokacija za izgradnju plaže i kupališta, gdje se između ostalog navodi da se plaže sa kupalištima planiraju graditi uz korito rijeke Drine, na desnoj i lijevoj obali, uz potrebne intervencije na planiranju terena, čišćenju, eventualnoj izgradnji prilaznih puteva, parkinga, taložnica za nanos u koritu rijeke Drine itd..., AVP Sava je mišljenja da bi se realizacijom projekta čišćenja korita rijeke Drine, a koje podrazumijeva izvođenje radova na sječi drveća i šiblja koje se nalazi u koritu rijeke, uklanjanje panjeva, iskop istaloženog materijala, odnosno uklanjanje formiranih ada i sprudišta u cilju formiranja punog proticajnog profila vodotoka, čime se povećava propusna moć korita i smanjuje opasnost od poplava, smanjio potencijal pomenutih lokacija za izgradnju plaža i kupališta. Zbog navedenog, AVP Sava je mišljenja da se prethodno trebaju realizovati idejni i glavni projekti plaža i kupališta, kako se preporučuje u pomenutoj studiji, nakon čega bi se moglo pristupiti i projektima čišćenja i eventualnog uređenja na pomenutim lokacijama u cilju dodatnog obezbjeđenja projektovanih rješenja za plaže i kupališta. Nakon sastanka u Gradskoj upravi Goražde, 26.08.2025. godine, sa Gradonačelnikom i njegovim saradnicima i direktora AVP Sava i saradnika, utvrđeno je da zbog svega navedenog ovaj projekat nije moguće realizovati u 2025. godini.

B.2.1.8. Izrada glavnog projekta za obaloutvrde u naseljima Rudenice i Velečevo i uređenje lijeve obale rijeke Sane u naselju Donji Kamičak sa sanacijom brane u Općini Ključ

Aktom broj 07-948/24 od 30.09.2024. godine Općina Ključ je kandidovala izradu projektne dokumentacije za izradu obaloutvrde u naseljima Rudenice i Velečevo u cilju zaštite magistralnog puta i uređenje lijeve obale Sane u naselju Donji Kamičak. Lokacija gdje je potrebno predvidjeti obaloutvrdu sa lijeve obale Sane se nalazi neposredno uz magistralni put „M5". Na navedenom lokalitetu se nalazi i jedan stambeni objekat. Pregledom lokacije je ustanovljen potencijalni rizik od negativnog djelovanja rijeke Sane na trup ceste. S tim da treba istaći da u ovom trenutku magistralna cesta nije ugrožena. Međutim s obzirom na važnost magistralne ceste, predlaže se izrade projektne dokumentacije s ciljem izvođenja obaloutvrde na desnoj obali Sane i zaštite magistralne ceste „M5". U naselju Donji Kamičak preko cijele širine vodotoka Sana vidljivi su ostaci brane od kamenog, nasutog materijala koja nema pravilnu geometriju, brana je izgrađena s ciljem da se podigne razina vode i dio vodotoka usmjeri ka vodenici. Zbog devastiranosti brane i kanala koji je usmjeravao dio vodotoka ka vodenici, vodotok, kroz pojavu velikih voda devastira lijevu obalu Sane. Kada je u pitanju vodenica, ista je potpuno uništena i jedini ostaci su zatvaračka komora s taložnikom. Kroz ovaj projekt, kako se radi o turističkom području, Općina Ključ želi poboljšati turističku ponudu s formiranjem brane čime bi se stvorili uvjeti za stvaranje zone kupališta, zatim izgradnjom vodenice s potrebnom infrastrukturom kao i stabilizaciju lijeve obale Sane. Projektnom dokumentacijom treba obuhvatiti sanaciju brane koja uključuje i uređenje kanala prema vodenici i uređenje i stabilizacija lijeve obale rijeke Sane u duljini od 500 m. Izrada projektne dokumentacije je neophodan preduslov za sve navedene aktivnosti. Prezentacija urađene projektne dokumentacije je održana 15.12.2025. u prostorijama općine Ključ. Zaključci sa te prezentacije su postali sastavni dio projektnog zadatka i uputa projektantu kako da završi investiciono-tehničku dokumentaciju. Projektna dokumentacija je završena i dostavljena u AVP Sava, a prema planu nabavki revizija projekta je predviđena u prvom kvartalu 2026. godine.

B.2.1.9. Izrada Glavnog projekta za sanaciju brane Župica u Drvaru

Aktom broj 02-04-3052/24 od 13.08.2024. godine Općina Drvar je kandidovala izradu projektne dokumentacije za sanaciju brane Župica u Drvaru. Prilikom visokih vodostaja brana nema svoju građevinsku funkciju jer su preljev i bučnica devastirani i voda plavi naselje Prekaja, njenu infrastrukturu, poljoprivredno zemljište, stambene objekte i okoliš. U 2008. godini je urađeno idejno rješenje preljeva i bučnice na brani Župica u Drvaru. Tokom proteklih godina dodatno je devastiran preljev i bučnica tako da je potrebno uraditi inovirano rješenje nivoa glavnog projekta kako bi Drvar mogao aplicirati za finansijska sredstva za izvođenje radova na sanaciji brane. Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo i firma Radis d.o.o. potpisali su Ugovor broj 30-603-55/25 od 22.8.2025. godine za LOT 5: Izrada Glavnog projekta za sanaciju brane Župica u Drvaru. Rok po Ugovoru za završetak projekta je bio 20.12.2025. godine. Putem e-maila dana 17.11.2025. godine Radis d.o.o. je dostavio akt broj 2573-11/25 od 11.11.2025. godine, protokolisan pod brojem 30-603-68/25 od 21.11.2025. godine, u kojem traži dostavu postojeće dokumentacije i produženje ugovornog roka. Na navedeni akt, AVP Sava je odgovorila aktom broj 30-603-70/25 od 21.11.2025., kojim ne odobrava produženje roka, obzirom da nisu naveli nijedan razlog zbog kojeg zahtijevaju produženje istog, te se dalje navodi da: "obzirom da je rok za prezentaciju predmetnog projekta bio 20.11.2025., a krajnji rok za izradu projekta 20.12.2025. godine, uz činjenicu da ste Vaš zahtjev za podloge koje su Vam neophodne za izradu predmetnog projekta dostavili 17.11.2025. godine, pet dana prije roka za prezentaciju, mišljenja smo da nije realno da ovaj projekat završite u ugovorenom roku. Shodno tome, molimo Vas da se najprije očitujete da li možete ispuniti ugovoreni rok ili ne." Do kraja 2025. godine, nije bilo odgovora na navedeni akt. Zbog toga je postupljeno u skladu sa članom 12. Ugovora, tj. izvršen je jednostrani prekid ugovora zbog neispunjavanja ugovornih obaveza u utvrđenim rokovima i na utvrđen način. Izrada projektne dokumentacije je ugovorena u 2025. godini, a zbog neispunjavanja ugovorne obaveze ugovor je raskinut. Obzirom da je stavka ostala nerealizovana, planirana sredstva će se u 2026. godini realizovati kao višak prihoda nad rashodima.

B.2.1.10. Izrada Glavnog projekta sanacije parapetnog zida na odbrambenom nasipu uz rijeku Bosnu u naselju Neteka, općina Odžak

Dopisom od strane Općine Odžak krajem mjeseca februara 2025. godine zatraženo je od Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo da predstavnici AVP Sava izađu na teren u cilju rješavanja problema odbrambenog zida u zaseoku Neteka. Istim je navedeno da se predmetni zid, usljed proteka vremena, nalazi u lošem stanju, odnosno da se isti naginje prema vodnoj strani što dovodi do propadanja asfaltnog puta uz predmetni zid.

Od strane ovlaštenog predstavnika AVP Sava, sredinom mjeseca marta 2025. godine, zajedno sa predstavnicima pravnog lica angažovanog na tekućem održavanju zaštitnih vodnih objekata na području Odžačke Posavine kao i predstavnikom Nadzora nad radovima tekućeg održavanja na navedenom području izvršen je obilazak dionice odbrambenog nasipa uz rijeku Bosnu na kome se nalazi predmetni parapetni zid. Vizuelnim pregledom ustanovljeno je da je predmetni parapetni zid (dužine cca 200 m) jednim dijelom nagnut prema vodnoj strani, da je na nekoliko mjesta došlo do odvajanja spojeva na kampadama, te je vidljiva i ispucalost asfaltnog puta uz predmetni parapetni zid.

Radi utvrđenog oštećenja parapetnog zida na bosanskom odbrambenom nasipu u naselju Neteka općina Odžak, neophodno je pristupiti izradi glavnog projekta sanacije predmetnog objekta. Izrada projekta je potrebna radi sagledavanja postojećeg stanja, definiranja tehnički opravdanih sanacijskih rješenja i procjene opsega potrebnih radova kao i procjene investicionih vrijednosti ovih radova. Sanacija je neophodna u cilju osiguranja zaštitne funkcije

nasipa i sprječavanja daljnjeg pogoršanja stanja parapetnog zida, odnosno samog nasipa na kome se zid nalazi.
Ugovor za izradu glavnog projekta je potpisan krajem mjeseca decembra 2025. godine, dok se realizacija istog planira početkom 2026. godine.



Parapetni zid na bosanskom odbrambenom nasipu, naselje Neteka

B.2.2. Preventivni radovi na odbrani od poplava

B.2.2.1. Čišćenje i uređenje vodotoka I kategorije na području Federacije BiH

Sredstva sa ove stavke su predviđena za čišćenje vodotoka, obezbjeđenje proticajnog profila i uređenje vodotoka na lokacijama za koje se ukaže potreba u toku godine, a koji nisu navedeni u Planu i Finansijskom planu. Predviđeni iznos za ove namjene je iznosio 250.000,00 KM. U 2025. godini sa ove stavke nisu korištena sredstva, jer nije bilo adekvatne dokumentacije po kojoj bi se izvodili radovi.

B.2.2.2. Uređenje desne obale rijeke Bosne u Maglaju nizvodno od Gradskog mosta do ušća rijeke Jablanice u rijeku Bosnu u dužini od 2900 m. - realizacija IV i III dionice

Aktom broj 04-45-1-1711-2/23 od 26.09.2024. godine Općina Maglaj je kandidovala projekat uređenja desne obale rijeke Bosne nizvodno od Gradskog mosta – realizacija dionica III i IV. Zbog nedovoljnog kapaciteta riječnog korita, obraslosti korita i većeg pronosa nanosa došlo je do formiranja ada u koritu rijeke Bosne na lokalitetu nizvodno od Gradskog mosta sve do ušća potoka Jandrošac a potom i do ušća rijeke Jablanice u Bosnu. Samim time došlo je do smanjenja proticajnog profila što za posljedicu ima izlijevanja vode iz korita te plavljenje okolnog područja, mezarja i lokalne saobraćajnice. Realizacija III i IV faze radova na uređenju desne obale rijeke Bosne podrazumijeva radove na uređenju desne obale od Gradskog mosta do ušća rijeke Jablanice. U 2024. godine završeni su radovi na regulaciji desne obale rijeke Bosne u dužini od 250 m, i to (nizvodno od gradskog mosta) od „Konaka" do ušća potoka Jandrošac. Naredna faza je podrazumijevala radove na uređenju desne obale rijeke Bosne od ušća potoka Jandrošac do mezarja. Za ovu dionicu je urađena novelacija projektne dokumentacije. Prema navodima predstavnice Općine Maglaj, realizacija ove dionice je prioritet općinske uprave. Sljedeća faza, u dužini cca 737 m, bi bila od mezarja do željezničkog mosta. Izvedenim radovima će se poboljšati hidromorfološke karakteristike korita te smanjila opasnost od izlijevanje vode iz korita, te spriječiti erodiranje obala i zaštitili stambeni i infrastukturni objekti. Bitno je napomenuti da se ovaj projekat nalazi u Planu upravljanja poplavnim rizikom, pozicija 4-8. Realizacija navedenih radova u ugovorenom iznosu od

999.942,66 KM, obezbjeđena je sa stavki B.2.2.2. i C.2.2. počela je dana 19.11.2025. godine, ali su zbog povećanog vodostaja rijeke Bosne radovi obustavljeni do 15.12.2025. godine što je evidentirano u Građevinskom dnevniku. Uz povoljne vremenske prilike, radovi su intenzivirani te su prema Izvještaju nadzora, od 15.12. do 29.12.2025. godine, završeni pripremni radovi na desnoj obali rijeke Bosne na predmetnoj dionici, a u toku su radovi na iskopu materijala III i IV kategorije za izradu profila korita rijeke Bosne. Procjenjuje se da će svi radovi biti završeni do ugovorenog roka (150 radnih dana od dana uvođenja u posao).





Desna obala rijeke Bosne nizvodno od Gradskog mosta (radovi u toku)

B.2.2.3. Uređenje korita rijeke Tinje na lokaciji buduće industrijske zone u Gradu Srebrenik – nastavak radova

Aktom broj 07-948/24 od 30.09.2024. godine Grad Srebrenik je kandidovao projekat nastavka radova na uređenju korita rijeke Tinje na području buduće industrijske zone na lokaciji Previle kako bi zaštitio ovo područje od poplava, kao i od erozije koja je stalna i prijeti formiranjem sve većih meandara i time odnosi zemljište te pomjera trasu rijeke. Navedena lokacija se nalazi nizvodno od novoizgrađenog mosta za buduću industrijsku zonu u naselju Previle, dužine cca 120 m. Na ovoj lokaciji je krajem 2019. godine zbog planirane gradnje pomenutog mosta izvršena regulacija rijeke Tinje na lokaciji mosta i u dužini od cca 100 metara uzvodno od mosta. Nešto nizvodnije, krajem 2019. godine izvršena je i zaštita desne obale od erozije zbog prijetnje urušavanja elektrostuba u planiranoj industrijskoj zoni. Preko namjenskog prijenosa, 2023. godine realizovana je dionica dužine cca 100 m od mosta pa nizvodno. Izvođenjem radova u dužini cca 120 m na predmetnoj dionici, u 2025. godini, izvršilo bi se spajanje sve tri ranije uređene dionice i tako formirala jedna cjelovito uređena dionica duž planirane industrijske zone ukupne dužine cca 400 m. Prirodno korito rijeke Tinje na ovoj lokaciji meandrira, obraslo je rastinjem, zatrpano nanosima i plitko, te su moguća plavljenja okolnih stambenih objekata na lijevoj obali i planirane industrijske zone na desnoj obali, a naročito je prisutna erozija obala. Za ovu lokaciju postoji urađena projektna dokumentacija za potez ukupne dužine cca 1300 metara, obzirom da je ranijih godina kandidovana i ušla u Plan AVP Sava 2018. godine. Treba reći da se predmetni lokalitet nalazi unutar područja sa potencijalno značajnim rizikom od poplava APSFR (prema preliminarnoj procjeni rizika od poplava za vodno područje rijeke Save 2013). Prema rezultatima hidrodinamičkog modela rijeke Tinje urađenog za potrebe izrade mapa opasnosti i rizika od poplava u BiH vidljivo je da je cijelom dužinom predmetna dionica pod uticajem štetnog djelovanja voda rijeke Tinje ranga pojave 1/100, naročito lijeva obala. Također, bitno je napomenuti da je za predmetnu lokaciju, na poziciji 31-1 Aneksa 3.2. Pregled predloženih mjera u Neposrednom slivu rijeke Save - UoM 1, izrađenog u okviru projekta „Tehnička pomoć za izradu Planova upravljanja rizikom od poplava

za Bosnu i Hercegovinu", predložena mjera Implementacija sanacije obale rijeke Tinje na lokaciji buduće industrijske zone u Srebreniku. Na osnovu svega navedenog, te činjenice da se radi o budućoj industrijskoj zoni, kao i naseljenom mjestu sa stambenim objektima na lijevoj obali, gdje su već ranije fazno izvođeni radovi na uređenju korita rijeke Tinje, konstatovano je da postoji potreba da se nastavi sa uređenjem rijeke Tinje na ovoj lokaciji, te time poveća stepen realizacije projekta zaštite predmetnog lokaliteta od plavljenja velikim vodama rijeke Tinje ranga pojave 1/100, kao i od erozionog dejstva rijeke Tinje. Nakon realizacije svih radova predviđenih postojećom projektnom dokumentacijom, očekivani efekat je zaštita kompletne lokacije buduće industrijske zone kao i stambenih objekata od plavljenja velikim vodama povratnog perioda 1/100 godina, kao i zaštita obala od erozionih dejstava rijeke Tinje. Procjenjena vrijednost ove faze radova iznosi 300.000,00 KM. Dana 07.10.2025. godine je od strane Grada Srebrenika došao akt broj 07-815/25 od 29.09.2025. godine kojim je AVP Sava obavještena da zbog nemogućnosti obezbjeđenja potrebnih dozvola za realizaciju projekata Uređenje korita rijeke Tinje na lokaciji buduće industrijske zone i Sanacija obale rijeke Tinje u MZ Potpeć, a što onemogućava realizaciju navedenih projekata do kraja tekuće godine, odustaju od realizacije tih projekata u budžetskoj 2025. godini, i predlažu da se prvobitno planirana sredstva za te projekte preusmjere u realizaciju projekta Sanacija korita rijeke Tinje u MZ Špionica C za koji su odobrena sredstva nedostatna. Obzirom da su u tom trenutku bile završene prve izmjene i dopune Plana i Finansijskog plana AVP Sava za 2025. godinu, sredstva su ostala nerealizovana i koristiće se u 2026. godini kao višak prihoda nad rashodima.

B.2.2.4. Sanacija obale rijeke Tinje u MZ Potpeć, Grad Srebrenik

Aktom broj 07-948/24 od 30.09.2024. godine Grad Srebrenik je kandidovao projekat sanacije obala rijeke Tinje u MZ Potpeć kako bi se zaštitilo ovo područje od poplava, kao i od erozije koja je stalna i prijeti odnošenjem zemljišta te pomjera trasu rijeke. Na ovom lokalitetu nizvodno od mosta u naselju Potpeć, na lijevoj obali, izgrađen je potporni betonski zid u sklopu objekta benzinske pumpe, dok je desna obala korita rijeke Tinje zaštićena hitnim intervencijama u vrijeme poplava privremenim nasipima izgrađenim bez projektne dokumentacije. Na desnoj obali neposredno nizvodno od mosta nalaze se dva privatna stambena objekta i tri pomoćna objekta te pristupni put. Nešto nizvodnije nalazi se naselje sa cca 20 stambenih objekata na desnoj obali. Na predmetnom lokalitetu na desnoj obali 2020. godine od strane grada Srebrenika formiran je zemljani nasip približne visine kao i betonski zid na suprotnoj obali tako da trenutno ne prijeti opasnost od plavljenja, ali je upitna njegova stabilnost i vododrživost. Predmetni lokalitet se nalazi unutar područja sa potencijalno značajnim rizikom od poplava APSFR (prema preliminarnoj procjeni rizika od poplava za vodno područje rijeke Save 2013). Prema rezultatima hidrodinamičkog modela rijeke Tinje urađenog za potrebe izrade mapa opasnosti i rizika od poplava u BiH vidljivo je da je predmetna dionica pod uticajem štetnog djelovanja voda rijeke Tinje ranga pojave 1/100. Prema rezultatima hidrodinamičkog modela, najugroženija je nizvodna dionica, nasuprot BP Jata, gdje je ugroženo cca 20 stambenih objekata na desnoj obali te se predlaže da se radovi pokrenu na ovoj dionici, dužine cca 400 m. Također, bitno je napomenuti da je za predmetnu lokaciju, na poziciji 31-5 Aneksa 3.2. Pregled predloženih mjera u Neposrednom slivu rijeke Save - UoM 1, izrađenog u okviru projekta „Tehnička pomoć za izradu Planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu", predložena mjera Nadvišenje postojećeg nasipa, dužine 180 m. Za ovu lokaciju postoji urađena projektna dokumentacija za potez nizvodno od mosta ukupne dužine cca 1400 metara, obzirom da je ranijih godina kandidovana i ušla u Plan i Finansijski AVP Sava 2019. godine. Na osnovu svega navedenog, te činjenice da se radi o

naseljenom mjestu sa stambenim objektima na desnoj obali, konstatovano je da postoji potreba da se krene u realizaciju projekta na predmetnoj lokaciji, te time obezbijedi kvalitetna i trajna zaštita predmetnog lokaliteta od plavljenja velikim vodama rijeke Tinje ranga pojave 1/100, kao i od erozionog dejstva rijeke Tinje. Nakon realizacije svih radova predviđenih postojećom projektnom dokumentacijom, očekivani efekat je zaštita kompletne lokacije kao i stambenih objekata od plavljenja velikim vodama povratnog perioda 1/100 godina, kao i zaštita obala od erozionih dejstava rijeke Tinje. Procjenjena vrijednost ove faze radova iznosi 130.000,00 KM.
Dana 07.10.2025. godine je od strane Grada Srebrenika zaprimljen akt broj 07-815/25 od 29.09.2025. godine kojim je AVP Sava obavještena da zbog nemogućnosti obezbjeđenja potrebnih dozvola za realizaciju projekata Uređenje korita rijeke Tinje na lokaciji buduće industrijske zone i Sanacija obale rijeke Tinje u MZ Potpeć, a što onemogućava realizaciju navedenih projekata do kraja tekuće godine, odustaju od realizacije tih projekata u budžetskoj 2025. godini, i predlažu da se prvobitno planirana sredstva za te projekte preusmjere u realizaciju projekta Sanacija korita rijeke Tinje u MZ Špionica C za koji su odobrena sredstva nedostatna. Obzirom da su u tom trenutku bile završene prve izmjene i dopune Plana i Finansijskog plana AVP Sava za 2025. godinu, sredstva su ostala nerealizovana i koristiće se u 2026. godini kao višak prihoda nad rashodima.

B.2.2.5. Sanacija korita rijeke Tinje u MZ Špionica C, Grad Srebrenik

Aktom broj 07-948/24 od 30.09.2024. godine Grad Srebrenik je kandidovao projekat sanacije korita rijeke Tinje u MZ Špionica u cilju zaštite odog područja od poplava, kao i od erozije. Ova lokacija se nalazi između dva mosta, željezničkog uzvodno i mosta kod "Binga" nizvodno, ukupne dužine cca 780 m. Na ovoj lokaciji ranije nisu građeni adekvatni vodozaštitni objekti, osim neadekvatnih mjera (nasipi i naslage od betonskih komada) koje su izvođene kao privremena zaštita u vrijeme poplava od strane CZ Srebrenik, dok je na lokaciji nizvodno od mosta kod "Binga" krajem 2021. godine izvršeno čišćenje korita u dužini od cca 500 metara u cilju obezbjeđenja proticajnog profila i smanjenja opasnosti od poplava. Prirodno korito rijeke Tinje na ovoj lokaciji meandrira, obraslo je rastinjem, zatrpano nanosima i plitko. Zbog toga, kao i zbog upitne propusnosti postojećeg mosta u naselju, pri pojavi velikih voda i zbog pojave povećanja vučnih napona, dolazi do neželjenog odnošenja obala i do plavljenja postojećih objekata (naselje od cca 20 stambenih objekata na lijevoj obali), poljoprivrednih površina i putnih komunikacija. Prema informacijama dobijenim od predstavnika Grada Srebrenik, plavljenju naselja na lijevoj obali doprinosi i lokalni potok koji se pod nepovoljnim uglom uliva u rijeku Tinju na lijevoj obali nizvodno od mosta kod "Binga", gdje usljed uspora uzrokovanog visokim vodostajem rijeke Tinje dolazi do povrata vode i izljevanja u zaleđu potoka. Za ovu lokaciju postoji urađena projektna dokumentacija za potez između dva mosta ukupne dužine cca 780 metara, obzirom da je ranijih godina kandidovana i ušla u Plan i Finansijski AVP Sava 2019. godine. Treba reći da se predmetni lokalitet nalazi unutar područja sa potencijalno značajnim rizikom od poplava APSFR (prema preliminarnoj procjeni rizika od poplava za vodno područje rijeke Save 2013). Prema rezultatima hidrodinamičkog modela rijeke Tinje urađenog za potrebe izrade mapa opasnosti i rizika od poplava u BiH vidljivo je da je cijelom dužinom predmetna dionica pod uticajem štetnog djelovanja voda rijeke Tinje ranga pojave 1/100. Također, bitno je napomenuti da je za predmetnu lokaciju, na poziciji 31-18 Aneksa 3.2. Pregled predloženih mjera u Neposrednom slivu rijeke Save - UoM 1, izrađenog u okviru projekta „Tehnička pomoć za izradu Planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu", predložena mjera Implementacija postojećeg projekta uređenja riječne obale cca 750 m. Na osnovu svega navedenog, te činjenice da se radi o naseljenom urbaniziranom

mjestu sa stambenim objektima, konstatuje se da postoji potreba da se izvrši ne sanacija već uređenje rijeke Tinje na kompletnoj lokaciji dužine cca 780 metara, prije svega lijeve obale na kojoj se nalazi naselje, obzirom da su na desnoj strani ugrožene samo poljoprivredne površine i da je, prema dobijenim informacijama, Grad Srebrenik iselio stanovnike iz bespravno izgrađenih objekata na desnoj obali uzvodno od mosta kod "Binga". Nakon realizacije svih radova predviđenih postojećom projektnom dokumentacijom, očekivani efekat je zaštita kompletne lokacije, stambenih objekata, saobraćajne infrastrukture kao i značajnih poljoprivrednih površina od plavljenja velikim vodama povratnog perioda 1/100 godina, kao i zaštita obala od erozionih dejstava rijeke Tinje. Procjenjena vrijednost ove faze radova iznosi 200.000,00 KM. Obzirom da do kraja 2025. godine za ovaj projekat nisu bili riješeni imovinsko-pravni odnosi, niti izdate sve potrebne saglasnosti i dozvole planirana sredstva su ostala nerealizovana i koristiće se u 2026. godini kao višak prihoda nad rashodima.

B.2.2.6. Zaštita obala rijeke Usore u Tešnju u naselju Kalošević na četiri lokacije ukupne dužine 1500 m, općina Tešanj (Dionica 1 – Lijeva obala uzvodno od mosta L=109 m)

Aktom broj 02-45-1-1525-2/24 od 11.09.2024. godine Općina Tešanj je kandidovala projekat uređenja lijeve obale Usore u naselju Kalošević. Navedeni lokalitet se nalazi na lijevoj obali rijeke Usore, na lokaciji koja se nalazi cca 200 m uzvodno od mosta u naselju Kalošević, počev od brane kod mlina pa uzvodno dužine cca 109 m. Radi se o naseljenom području sa uglavnom stambenim objektima te izuzetno prometnom putnom komunikacijom. Tokom ranijih poplavnih događaja prema riječima predstavnika MZ Kalošević navedeni lokalitet je bio pogođen, odnosno dešavalo se izlijevanje vode, kao i određeno erodiranje obale. Obzirom da je Općina Tešanj ovu lokaciju ranije kandidovala kao ugroženu, ista se našla u Planu i Finansijskom AVP Sava za izradu projektne dokumentacije, te je na osnovu toga izrađen glavni projekat „Zaštita obala rijeke Usore u Tešnju u naselju Kalošević na četiri lokacije ukupne dužine 1500 m, općina Tešanj". Obzirom da se radi o faznoj realizaciji projekta, te da su prethodno realizovane dionice neposredno uzvodno i nizvodno od predmetne dionice, prijedlog je da se dobije kompaktno uređena lijeva obala rijeke Usore kojom će se postići zaštita od poplava ranga pojave 1/100 na navedenom lokalitetu, kao i zaštita same obale i okolnog zemljišta od erodiranja. Predmetni lokalitet se nalazi unutar područja sa potencijalno značajnim rizikom od poplava „APSFR" (prema preliminarnoj procjeni rizika od poplava za vodno područje rijeke Save 2013). Prema rezultatima hidrodinamičkog modela rijeke Usore urađenog za potrebe izrade mapa opasnosti i rizika od poplava u BiH, vidljivo je da je veći dio predmetne dionice pod uticajem štetnog djelovanja voda rijeke Usore ranga pojave 1/100. Uvidom u usvojeni Plan upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH, navedena dionica je analizirana, te je za navedeni lokalitet navedeno da postoji rizik za stanovništvo i ekonomiju (ugrožene kuće, privredni objekti i poljoprivredno zemljište uz rijeku), te su predložene dvije mjere na dionici uzvodno od predmetne dionice, odnosno jedna mjera „Izgradnja nasipa u dužini od 500 m, maksimalne visine do 1,8 m" , te druga mjera „Izmiještanje ušća potoka Djedovac zbog hidrauličkog lošeg položaja". Na osnovu svega navedenog, te činjenice da se radi o faznom uređenju lijeve obale rijeke Usore na predmetnom lokalitetu, konstatuje se da postoji potreba da se izvrši cjelovito uređenje obale rijeke Usore na navedenom lokalitetu, odnosno obezbijedi zaštita predmetnog lokaliteta od plavljenja velikim vodama ranga pojave 1/100 godina, ali i zaštita obale od erodiranja koje je evidentno na ovoj lokaciji. Nakon realizacije svih radova predviđenih postojećom projektnom dokumentacijom, očekivani efekat je zaštita ove lokacije od plavljenja velikim vodama

povratnog perioda 1/100 godina, kao i zaštita lijeve obale od erozionih dejstava rijeke Usore. Procjenjena vrijednost ove faze radova iznosi 380.000,00 KM.
Obzirom da do kraja 2025. godine za ovaj projekat nisu bili riješeni imovinsko-pravni odnosi, niti izdate sve potrebne saglasnosti i dozvole planirana sredstva su ostala nerealizovana i koristiće se u 2026. godini kao višak prihoda nad rashodima.

B.2.2.7. Uređenje korita rijeke Bosne u Zavidovićima

Aktom broj 02-11-1883/24 od 20.09.2024. godine Grad Zavidovići je kandidovao projekat uređenja korita rijeke Bosne u Zavidovićima. Na području grada Zavidovići, od 2010. godine fazno se izvode radovi na uređenju korita i obala rijeke Bosne između dva kolska mosta a sve prema Glavnom projektu uređenja korita rijeke Bosne u Zavidovićima. Za dionicu između dva cestovna mosta u samom centru grada riješeni su imovinsko pravni odnosi te izdato Rješenje o odobrenju za građenje. U periodu do 2014. godine u potpunosti su završeni radovi na uređenju obala rijeke Bosne na potezu između kolskog i pješačkog mosta. Prema projektnom rješenju, urađena je obaloutvrda od betonskih prizmi i šetnicama na obje obale. U toku 2023. godine završeni su radovi na uređenju desne obale rijeke Bosne sve do kolskog mosta na ušću rijeke Krivaje. Realizacijom ovih radova i u potpunosti je uređena desna obala od prvog kolskog mosta do drugog kolskog mosta (sa uređenom obaloutvrdom, šetnicom) dužine cca 950 m. Do kraja 2018. godine, izvedeni su radovi na uređenju lijeve obale nizvodno od kolskog mosta do profila P20 (0+542,58). Dionica od profila P20 do P08 je završena u 2024. godini. Za završetak i potpunu implementaciju navedenog projekta potrebno je još da se izvedu radovi na uređenju lijeve obale rijeke Bosne, dionica od profila P08 do profila P0 (neposredno nizvodno od mosta) dužine cca 205 m čime bi u potpunosti bila uređena lijeva obala između dva mosta. Predmetni radovi predstavljaju nastavak radova na uređenju lijeve obale Bosne, odnosno nastavak aktivnosti i provođenje mjera u funkciji sprječavanja štetnog djelovanja voda. Ugovorena vrijednost radova je 696.066,08 KM. Svi radovi su realizovani, fakturisani i isplaćeni u ugovorenoj vrijednosti i izvršena je primopredaja izvedenih radova.



Pogled na lijevu obalu sa uređene desne obale (prije radova i poslije izvedenih radova)

B.2.2.8. Uređenje vodotoka rijeke Bosne kroz Žepče

Aktom broj 01/1-21-687/24 od 18.09.2024. godine Općina Žepče je kandidovala projekat uređenja vodotoka rijeke Bosna kroz Žepče. U proteklom periodu, u potpunosti su završeni radovi na uređenju obala rijeke Bosne u urbanom dijelu općine Žepča između kolskog i pješačkog mosta, te nizvodno od kolskog mosta i uzvodno od pješačkog mosta finansirani od strane AVP Sava. Dionica lijeve obale nizvodno od mosta je projektovana u dužini od 550 m. U 2024. godini izvedeni su radovi na lijevoj obali rijeke Bosne nizvodno od mosta u dužini od 200 m, te je ovim radovima u dužini od 350 m u potpunosti ostvarena zaštita od velikih voda

rijeke Bosne. Zaštićeni su stambeni, infrastrukturni objekti i škola (Katolički školski centar) od velikih voda rijeke Bosne i konstantnih materijalnih šteta, a urbani dio općine Žepče u potpunosti je uređen. Osim zaštite od poplava, povećana je i uređena zelena površina koju će stanovnici koristiti za šetnju i boravak u prirodi, što doprinosi kvaliteti života u Žepču. Uređenjem obje strane rijeke Bosne kroz urbani dio Žepča postigao se brži protok vode i smanjila mogućnost plavljenja, kao i zadržavanja smeća na obalama. Ugovorena vrijednost radova je 798.947,32 KM. Svi radovi su realizovani, fakturisani i isplaćeni u ugovorenoj vrijednosti i izvršena je primopredaja izvedenih radova.



Radovi u Žepču u toku i nakon završetka

B.2.2.9. Nastavak izvođenja radova na izgradnji regulacije korita rijeke Željeznice u MZ Otes/MZ Osjek nizvodno od P23 prema ušću u rijeku Bosnu, Općina Ilidža

Aktom broj 12-21-4641/24-3 od 26.09.2024. godine Općina Ilidža je kandidovala projekat regulacije korita Željeznice u MZ Otes/MZ Osjek. Navedena lokacija se nalazi u naselju Otes, nizvodno od regulisanog dijela korita rijeke Željeznice kod mosta u Otesu. Za ovu lokaciju postoji urađena projektna dokumentacija koja se odnosi na uređenju korita rijeke Željeznice nizvodno od mosta u Otesu do ušća u rijeku Bosnu. Na ovom lokalitetu korito rijeke Željeznice iz regulisanog u neregulisano korito naglo mijenja poprečni profil. Na neregulisanom dijelu propusna moć poprečnog profila je znatno manja od uzvodno regulisanog poprečnog profila, što prilikom nailaska velikih voda rijeke Željeznice može dovesti do uspora vode te plavljenja okolnog terena. Kako bi se zaštitilo ovo područje od plavljenja okolnog terena, Općina Ilidža je kandidovala projekat za nastavak radova na izgradnji regulacije korita rijeke Željeznice u MZ Otes/MZ Osjek nizvodno od P23 prema ušću u rijeku Bosnu za Plan i Finansijski AVP Sava za 2025. godinu. Također je u Planu upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2024. do 2029. godine) kao pozicija 9-2 za predmetni lokalitet definisana mjera: Implementacija projekta „Regulacija rijeke Željeznice nizvodno od mosta u Otesu". Na osnovu prethodnih konstatacija, te činjenice da se radi o naseljenom području, postoji potreba da se izvedu radovi na nastavku izgradnje regulacije korita rijeke Željeznice na predmetnoj dionici. Realizacija ovog projekta se provodi sa dvije stavke (B.2.2.9. i C.2.3.), a radovi su ugovoreni u iznosu od 1.776.888,36 KM. Nakon realizacije svih radova predviđenih postojećom projektnom dokumentacijom na predmetnoj dionici postićiće se zadovoljavajući efekti u vidu zaštite kompletne lokacije od erozije obala kao i od plavljenja velikim vodama rijeke Željeznice povratnog perioda 1/100 godina. Procjenjuje se da će svi radovi biti završeni do ugovorenog roka (180 radnih dana od dana uvođenja u posao).



Radovi u toku

B.2.2.10. Regulacija rijeke Spreče u Lukavcu, dionica uzvodno od koksarinog mosta do regulisanog dijela u dužini od 450 m

Aktom broj 06-45-7-243/24 od 25.09.2024. godine Grad Lukavac je kandidovao projekat regulacije rijeke Spreče. Nizvodno od akumulacije Modrac, rijeka Spreča ulazi u Sprečansko polje. Stručne službe AVP Sava su obišle navedenu lokaciju i potvrdile da je navedena dionica prioritet za izgradnju u 2025. godini. Usko korito sa niskim obalama i velikim brojem meandara, te gusta obraslost vegetacijom, kao i mali podužni pad toka na razmatranom području prouzrokuju česta plavljenja značajnih područja u zaobalju. Zbog neuređenog prirodnog korita i nedostatka zaštitnih objekata, pri nailasku velikih voda, plavljenjem su ugrožene poljoprivredne površine i objekti uz vodotok, kao i lokalne saobraćajnice. Uski proticajni profili rijeke Spreče nisu u mogućnosti propustiti odgovarajuće velike vode bez izljevanja iz korita. Dodatni problem predstavlja činjenica što su vode Spreče zagađene otpadnim vodama tuzlanskog bazena, tako da se pri plavljenju vrši i kontaminacija zemljišta u zaobalju. Projektom je predviđena regulacija Spreče od kraja izvedene regulacije do ušća Jale u dužini od cca 2.600 metara. U prethodnom periodu je ugovoreno i izvedeno, u osam faza, cca 3.000 metara regulacije. Ovim ulaganjima osigurava se zaštita industrijskih postrojenja, stambenih objekata, putne infrastrukture, magistralnog puta Doboj-Tuzla i poljoprivrednog zemljišta od štetnog djelovanja velikih voda. Efekti do sada uloženih finansijskih sredstava sa stanovišta zaštite od voda će dati rezultate u punoj mjeri tek nakon završetka svih radova. Za nastavak realizacije ovog projekta u 2025. godini predviđeno je izvođenje regulacije na preskočenoj dionici u dužini od 450 metara, na kojoj su u međuvremenu riješeni imovinsko-pravni odnosi, a čijom će se izgradnjom dobiti izvedena regulacija u kontinuitetu u dužini od 4,5 km na potezu od naselja Dobošnica Donja do taložnice "Bijelo more". Projekat se planirao finansirati zajedno sa Vladom Tuzlanskog kantona, a za to su predviđena sredstva AVP Sava u iznosu od 950.000,00 KM. Obzirom da je za realizaciju ovog projekta potrebno obezbjediti 1.450.000,00 KM, a nije došlo do potpisivanja sporazuma sa Vladom TK o korištenju sredstava Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede, AVP Sava je obezbjedila dodatnih 500.000,00 KM kroz stavku C.2.4. iz viška prihoda na rashodima. Kako do kraja 2025. godine za ovaj projekat nisu bili riješeni imovinsko-pravni odnosi od strane Grada Lukavac, niti izdate sve potrebne saglasnosti i dozvole planirana sredstva su ostala nerealizovana i koristiće se u 2026. godini kao višak prihoda nad rashodima.

B.2.2.11. Uređenje korita rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu-Uskoplju

Aktom bb od 24.09.2024. godine Općina Gornji Vakuf-Uskoplje je kandidovala projekat uređenja korita rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu, dionica nizvodno profila P22, odnosno od uređenog dijela. Ova dionica predstavlja nastavak etapnog uređenja korita rijeke Vrbas u

gradskom dijelu Gornjeg Vakufa-Uskoplja. Ukupna dužina kandidovane dionice iznosi cca 220 m. Na ovoj lokaciji korito rijeke Vrbas je neuređeno i obraslo a prisutna je i urušenost i degradacija obala. Obale su mjestimično niske i devastirane tako da prilikom nailaska velikih voda dolazi do ugrožavanja poljoprivrednih i stambenih objekata. Na osnovu prethodnih konstatacija uređenjem korita rijeke Vrbas na ovoj lokaciji zaštitilo bi se stanovništvo, postojeći poslovni i industrijski objekti kao i prostor predviđen za izgradnju poslovnih i industrijskih objekata. Radovi su ugovoreni krajem 2025. godine u iznosu od 447.731,95 KM, obezbjeđih sa stavki B.2.2.11. i C.2.5., i u 2025. godini nije bilo radova. Procjenjuje se da će svi radovi biti završeni do ugovorenog roka (120 radnih dana od dana uvođenja u posao).

B.2.2.12. Izgradnja obaloutvrde na desnoj obali rijeke Une u naselju Pokoj II faza, Grad Bihać

Aktom broj 04/2-21-5068/24 od 27.09.2024. godine Grad Bihać je kandidovao projekat uređenja desne obale rijeke Une u naselju Pokoj. Naselje Pokoj se nalazi na sjevernom području Grada Bihaća. Ovim projektom je predviđen nastavak radova koji su realizovani u prethodnom periodu u dužini od 655 m, zbog čega je ovaj projekat ušao u Plan i Finansijski plan AVP Sava za 2025. godinu. Cilj ovog projekta je bio smanjenje rizika naselja Pokoj od poplava, kao i erozija i bujica uzrokovanih poplavama što bi omogućilo neometano odvijanje saobraćaja i sprečavanje plavljenja objekata koji se nalaze uz desnu obalu Une. Usljed poplava koje su pogodile ovo područje u decembru 2022. i maju 2023. godine ugroženi su bili stanovnici naselja Pokoj, stambeni i privredni objekti, saobraćajna, komunalna i elektroenergetska infrastruktura, poljoprivredne površine, kao i sami okoliš. Realizacijom ove faze projekta bi se omogućilo neometano funkcionisanje naselja, zaštita područja od plavljenja, obezbjeđenje normalnih uslova za rad, stanovanje i život, smanjio rizik od poplava, erozija i bujica kako bi se standard stanovanja i poslovanja podigao na zadovoljavajući nivo. Zadatak lokalne zajednice je bio da riješi imovinsko-pravne odnose, obezbjedi potrebne saglasnosti i odobrenje za građenje. Na sastanku u Gradskoj upravi Bihać održanom 03.09.2025. Gradonačelnik Bihaća je potvrdio da do kraja ove kalendarske godine neće biti završene sve procedure oko ishodovanja odobrenja za građenje za obaloutvrdu u naselju Pokoj, te se sredstva sa ovog projekta u iznosu od 1.200.000,00 KM preusmjeravaju u projekte koji su spremni za realizaciju, a projekat u Pokoju će se ponovo kandidovati kad bude izdata građevinska dozvola.

B.2.2.13. Obezbjeđenje proticajnog profila korita rijeke Spreče u Gradu Gračanica, MZ Gračanica na lokaciji od mosta za Sočkovac do bazena Terme u dužini od 980 m

Aktom broj 02-11-03799-2024 od 09.09.2024. godine Grad Gračanica je kandidovao projekat obezbjeđenja proticajnog profila rijeke Spreče u MZ Gračanica na potezu od mosta za Sočkovac do bazena Terme u dužini od 980 metara. Predmetni lokalitet se nalazi unutar područja sa potencijalno značajnim rizikom od poplava APSFR (prema preliminarnoj procjeni rizika od poplava za vodno područje rijeke Save 2013). Prema rezultatima hidrodinamičkog modela rijeke Spreče urađenog za potrebe izrade mapa opasnosti i rizika od poplava u BiH vidljivo je da je cijelom dužinom predmetna dionica pod uticajem štetnog djelovanja voda rijeke Spreče ranga pojave 1/100. Na navedenoj lokaciji do sada nisu rađeni nikakvi zahvati u smislu čišćenja korita. Okolno zemljište je uglavnom poljoprivredno i industrijsko u privatnom vlasništvu, izgrađen je veliki broj privrednih objekata koji su pod utjecajem velikih voda rijeke Spreče. Za ovu lokaciju je izdata vodna saglasnost kojom je propisan način izvođenje radova. Za ovu stavku je provedena javna nabavka, ali je poništena zbog dokazanih razloga koji su

izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke. Za realizaciju ovog projekta je bio predviđen iznos od 400.000,00 KM. Obzirom da je stavka ostala nerealizovana, planirana sredstva će se u 2026. godini realizovati kao višak prihoda nad rashodima i mogu se iskoristiti za istu lokaciju nakon novelacije projektne dokumentacije.

B.2.2.14. Obezbjeđenje proticajnog profila rijeke Bosne na lokalitetu Malešići na potezu između dva mosta na regionalnoj cesti dionica Donja Vogošća-Malešići, Općina Ilijaš – nastavak započetih radova

Aktom bb od 17.09.2024. godine Općina Ilijaš je kandidovala projekat obezbjeđenja proticajnog profila rijeke Bosne u naselju Malešići na potezu između dva mosta na regionalnoj cesti R445 Donja Vogošća-Malešići. Prema rezultatima hidrodinamičkog modela rijeke Bosne urađenog za potrebe izrade mapa opasnosti i rizika od poplava u BiH vidljivo je da na tom potezu nema značajnijeg izlijevanja i plavljenja okolnog terena od voda ranga pojave 1/100 rijeke Bosne. Na predmetnoj dionici prilikom nailaska velikih voda plavi se zeleni pojas na lijevoj obali rijeke Bosne i to neposredno nizvodno od mosta na autoputu Sarajevo-Zenica. U toku 2024. godine izvedeni su radovi na povećanju proticajnog profila od mosta na autoputu Sarajevo-Zenica nizvodno, s toga je Općina Ilijaš kandidovala nastavak radova na predmetnoj dionici. Na osnovu prethodnih konstatacija, a i činjenice da se radi o naseljenom području, ne postoji potreba za izdvajanjem znatnih finansijskih sredstava za izvođenje radova regulacije korita rijeke Bosne na predmetnoj dionici, već treba ići u smjeru obezbjeđenja proticajnog profila korita rijeke Bosne na predmetnoj dionici. Za ovu lokaciju je izdata vodna saglasnost kojom je propisan način izvođenje radova. Radovi su ugovoreni krajem 2025. godine u iznosu od 292.500,00 KM i u 2025. godini nije bilo radova. Procjenjuje se da će svi radovi biti završeni do ugovorenog roka (180 radnih dana od dana uvođenja u posao).

B.2.2.15. Regulacija rijeke Vrbas u naselju Pavić Polje, općina Gornji Vakuf-Uskoplje (zajedno sa stavkom C.2.11.)

Aktom bb od 24.09.2024. godine Općina Gornji Vakuf/Uskoplje je za Plan i Finansijski plan AVP Sava kandidovala projekat uređenja korita rijeke Vrbas u naselju Pavić Polje. Rijeka Vrbas uslijed velikih voda plavi veliki dio naselja Pavić Polje i tako pričinjava velike materijalne štete na obalama, poljoprivrednom zemljištu i infrastrukturi. Na ovoj dionici potrebno je izvršiti uređenje korita nizvodno od AB mosta u dužini cca 300 m. Uređenjem korita na ovoj dionici zaštitila bi se lokalna putna infrastruktura, osnovna škola sa dvorištem kao i svi stambeni i privredni objekti koji se nalaze u neposrednoj blizini rijeke. Za realizaciju ovog projekta bilo je potrebno 220.000,00 KM, od čega je na stavci C.2.11. obezbjeđeno 100.000,00 KM. Izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana za 2025. godinu na ovoj stavci je obezbjeđen nedostajući iznos od 120.000,00 KM. Radovi su ugovoreni krajem 2025. godine u iznosu od 216.467,06 KM i u 2025. godini nije bilo radova. Procjenjuje se da će svi radovi biti završeni do ugovorenog roka (90 radnih dana od dana uvođenja u posao).

B.2.2.16. Obezbjeđenje proticajnog profila korita rijeke Spreče u Gradu Gračanica, MZ Pribava na lokaciji Jasenovac – Prijedor u dužini od 550 m (zajedno sa stavkom C.2.30.)

Aktom broj 02-11-03799-2024 od 09.09.2024. godine Grad Gračanica je kandidovao projekat obezbjeđenja proticajnog profila rijeke Spreče u MZ Pribava na lokaciji Jasenova - Prijedor u dužini od 550 metara. Predmetni lokalitet se nalazi unutar područja sa potencijalno značajnim rizikom od poplava APSFR (prema preliminarnoj procjeni rizika od poplava za vodno područje

rijeke Save 2013). Prema rezultatima hidrodinamičkog modela rijeke Spreče urađenog za potrebe izrade mapa opasnosti i rizika od poplava u BiH vidljivo je da je cijelom dužinom predmetna dionica pod uticajem štetnog djelovanja voda rijeke Spreče ranga pojave 1/100. Na navedenoj lokaciji do sada nisu rađeni nikakvi zahvati u smislu čišćenja korita. Vizulenom prospekcijom uočen je sužen poprečni profil na ovoj dionici vodotoka. Okolno zemljište je uglavnom poljoprivredno u privatnom vlasništvu. Za ovu lokaciju je izdata vodna saglasnost kojom je propisan način izvođenje radova. Za realizaciju ovog projekta je predviđen iznos od 220.000,00 KM, koji će se ralizovati iz stavki B.2.2.16. u iznosu od 178.085,89 KM i stavke C.2.30. u iznosu od 41.914,11 KM. Radovi su ugovoreni krajem 2025. godine u iznosu od 215.514,00 KM i u 2025. godini nije bilo radova. Procjenjuje se da će svi radovi biti završeni do ugovorenog roka (180 radnih dana od dana uvođenja u posao).

B.3. Stručne usluge na realizaciji poslova Agencije

B.3.1. Priprema programa radova, elaborata, stručnih mišljenja, podzakonskih akata i dr.

U okviru ove stavke se finansiraju usluge izrade programa radova, elaborata, stručnih mišljenja, podzakonskih akata na vodotocima I kategorije, hitnih intervencija ili obezbjeđenja proticajnog profila, a sve u skladu sa Uredbom o vrsti sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono tehničke dokumentacije (˝Službene novine Federacije BiH˝, broj 33/10), kao i za druge aspekte djelovanja AVP Sava (npr. elaborat određivanja vodnog dobra, elaborat monitoringa podzemnih voda, itd.). U sklopu ove stavke realizovana je Izrada elaborata: Osmatranje nivoa podzemnih voda u pijezometrima na dionicama rekonstruisanih savskih nasipa u 2025. godini.

B.3.2. Revizija tehničke dokumentacije

U okviru ove stavke se finansiraju usluge revizije investiciono-tehničke dokumentacije kao jedan od preduslova da bi se ista mogla koristiti za raspisivanje tendera za izvođenja radova po istoj, a sve u skladu sa Uredbom o vrsti sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono tehničke dokumentacije (˝Službene novine Federacije BiH˝, broj 33/10).

Usluge revizije projektne dokumentacije su vršene u skladu sa planom nabavki. Ugovorene su sljedeće: Vršenje usluga revizije na projektu - Izrada projektno-tehničke dokumentacije za uređenje desne obale rijeke Bosne u naselju Mulići, grad Visoko; Vršenje usluga revizije na projektu - Izrada Glavnog projekta zaštita desne obale rijeke Usore u tešnju na lokaciji pararelno sa jezerom "Jelen" i Uređenje desne obale rijeke Usore u Tešnju u naselju Mrkotić uzvodno od jezera u dužini od 350 m; Vršenje usluga revizije na projektu - Izrada GP Uređenje korita rijeke Bosne u Ilijašu na dionici od mosta na autocesti (naselje Kadarići - Luka) uzvodno do mosta na lokalnoj saobraćajnici prema naselju bioča i uređenje korita rijeke Bosne u Ilijašu na dionici od postojeće uređene dionice na ušću potoka Gnionica - nizvodno do mosta na autocesti u naselju Obala u MZ Podlugovi; Vršenje usluga revizije na projektu - Izrada GP Sanacija desne obale rijeke Tinje u Srebreniku u mjestu Tinja Donja na dijelu uzvodno od mosta kod stadiona NK Mladost Tinja do ušća potoka koji ide iz obližnje šume, Regulacija korita rijeke Tinje u Srebreniku na lokaciji od džamije u MZ Bjelave do Klisure, regulacija korita rijeke Tinje u Srebreniku na lokaciji uzvodno od Kiseljačkog mosta do firme Ingram; Vršenje usluga revizije na projektu - Izrada projektne dokumentacije za uređenje dijela korita rijeke Spreče na lokalitetu Oključak-Industrijska zona u Općini Doboj Istok.

B.3.3. Stručni nadzor na realizaciji projekata AVP Sava

U okviru ove stavke se finansira vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na vodotocima I kategorije i drugim zahvatima u prostoru koji se finansiraju sredstvima AVP Sava, a sve u skladu sa Uredbom o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju (˝Službene novine Federacije BiH˝, broj 25a/22). Usluge vršenja nadzora su provođene u skladu sa planom nabavki. Ugovoreno je vršenje nadzora nad izvođenjem radova za sljedeće projekte: Radovi odbrane od poplava - Faza pripremnih mjera - na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Srednje Posavine u 2025. godini; Radovi odbrane od poplava - Faza pripremnih mjera - na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Odžačke Posavine u 2025. godini; Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektu - Uređenje korita rijeke Bosne u Zavidovićima; Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektu - Uređenje vodotoka rijeke Bosne kroz Žepče.

B.3.4. Stručni poslovi po nalogu inspekcije

U toku 2025. godine AVP Sava je nije imala niti jedan zahtjev za obavljenje stručnih poslova po nalogu Federalne uprave za inspekcijske poslove.

C. Preneseni ugovoreni i drugi radovi iz viška prihoda nad rashodima

C.1. Preneseni ugovoreni radovi i usluge iz 2024. godine koji se finansiraju iz viška prihoda nad rashodima

Prenesene ugovorene stavke radova i usluga iz 2024. godine: C.1.1., C.1.2., C.1.3., C.1.4., C.1.5., C.1.6., C.1.8., C.1.9., C.1.10., C.1.13., C.1.14., C.1.19., C.1.20., C.1.21., C.1.22., C.1.23., C.1.24., C.1.25., C.1.26., C.1.28., C.1.29., C.1.31., C.1.32., C.1.33., C.1.34., C.1.35., C.1.36. i C.1.37., C.1.38., C.1.39., C.1.40., C.1.41., C.1.42., C.1.43., C.1.44., C.1.45., su u 2025. godini u potpunosti okončane.

Za stavke: C.1.11., C.1.12., C.1.16. i C.1.17. dostavljena je projektna dokumentacija, ali treba izvršiti uslugu revizije projektne dokumentacije. Revizija će se prema planu nabavki provoditi u prvom kvartalu 2026. godine.

Nisu završene aktivnosti na stavkama C.1.7., C.1.27. i C.1.30.

Za stavke C.1.15. i C.1.18. je raskinut ugovor zbog neizvršavanja ugovornih obaveza.

U nastavku teksta su data obrazloženja za stavke koje nisu realizovane:

C.1.7. Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektu: Zaštita lijeve obale rijeke Usore u naselju Jelah u Tešnju, dionica nizvodno od mosta za Prnjavor

Usluge nadzora sa ove stavke su vezane za radove sa stavke C.1.27. i biće okončane u istom periodu.

C.1.15. Izrada Glavnog projekta: Parapetni zid Medenjak - Trnova na rijeci Sani u Sanskom Mostu i Sanacija nasipa na lijevoj obali rijeke Sane u Sanskom Mostu nizvodno od Karića mosta i dogradnja istog u dužini od 200 m

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo i firma PPG d.o.o. Sarajevo potpisali su ugovor broj 30-644-23/24 od 29.10.2024. godine, pod nazivom „Izrada Glavnog projekta:

Parapetni zid Medenjak - Trnova na rijeci Sani u Sanskom Mostu i Sanacija nasipa na lijevoj obali rijeke Sane u Sanskom Mostu nizvodno od Karića mosta i dogradnja istog u dužini od 200 m". Rok po Ugovoru za projekte u Sanskom Mostu je bio 15.03.2025. godine. Zbog kašnjenja im je dostavljena urgencija AVP Sava broj 30-361-1/25 od 17.03.2025. godine. Prezentacija projekta je održana 18.04.2025. godine. Projektnu dokumentaciju za Sanski Most su dostavili 23.10.2025. godine, te im je ista aktom broj 30-644-27/24 od 31.10.2025. godine vraćena kako bi izvršili potrebne korekcije i dopune u skladu sa datim primjedbama, uz molbu da zbog velikog kašnjenja u realizaciji ovog ugovora, što prije postupe po primjedbama kako bi projekat mogao biti spreman za reviziju. Do zadatog roka, korigovan projekat nisu dostavili. Zbog toga je postupljeno u skladu sa članom 13. ugovora, tj. izvršen jednostrani prekid ugovora zbog neispunjavanja ugovornih obaveza u utvrđenim rokovima i na utvrđen način. Obzirom da je stavka ostala nerealizovana, planirana sredstva će se u 2026. godini realizovati kao višak prihoda nad rashodima.

C.1.18. Izrada Glavnog projekta: Zaštita od voda na lokalitetu između Bakšaiškog i Vrkašićkog mosta, Uređenje lijeve obale Une u Bihaću na lokaciji Golubićko polje gdje je planirana izgradnja međunarodnog aerodroma Bihać i Sanacija lijeve obale rijeke Unac na lokaciji objekta Manastir Rmanj

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo i firma PPG d.o.o. Sarajevo potpisali su ugovor broj 30-647-19/24 od 29.10.2024. godine, pod nazivom „Izrada Glavnog projekta: Zaštite od voda na lokalitetu između Bakšaiškog i Vrkašićkog mosta, Uređenja lijeve obale Une u Bihaću na lokaciji Golubićko polje gdje je planirana izgradnja međunarodnog aerodroma Bihać i Sanacije lijeve obale rijeke Unac na lokaciji objekta Manastir Rmanj". Rok po ugovoru za projekte u Bihaću je bio 15.04.2025. godine. Zbog kašnjenja im je dostavljena urgencija AVP Sava broj 30-673-1/25 od 28.04.2025. godine, na koju je zaprimljen odgovor 21.08.2025. godine, uz navod da će dokumentacija biti kompletirana u narednim danima. Projektnu dokumentaciju za Bihać su prezentirali Sektoru za realizaciju projekata dana 24.09.2025. godine, prilikom čega je konstatovano da je projekat nepotpun, te dogovoreno da se doradi u skladu sa projektnim zadatkom i dostavi AVP Sava na pregled. Do zadatog roka, korigovan projekat od strane PPG d.o.o. Sarajevo nije dostavljen, niti je prezentacija predviđena projektnim zadatkom obavljena. Zbog toga je postupljeno u skladu sa članom 13. ugovora, tj. izvršen jednostrani prekid ugovora zbog neispunjavanja ugovornih obaveza u utvrđenim rokovima i na utvrđen način. Obzirom da je stavka ostala nerealizovana, planirana sredstva će se u 2026. godini realizovati kao višak prihoda nad rashodima.

C.1.27. Zaštita lijeve obale rijeke Usore u naselju Jelah u Tešnju, dionica nizvodno od mosta za Prnjavor

Nakon što je pribavljeno odobrenje za građenje, dana 05.11.2025. godine, na lokaciji planiranih radova na realizaciji predmetnog projekta, održan je sastanak predstavnika AVP Sava, Općine Tešanj, firme Roading d.o.o. Gračanica kao izvođača radova i firme JP Spreča d.d. Tuzla kao nadzora nad izvođenjem radova, sa ciljem upoznavanja o trenutnom stanju na terenu i uvođenja izvođača radova u posao. Obilaskom predmetne lokacije uočeno je da je parcela duž koje prolazi lokalni makadamski put duž lijeve obale rijeke Usore, koji bi se trebao koristiti kao pristupni put za izvođača radova, ograđena ogradom sa zaključanom kapijom, čime je put blokiran, te da pristup lokaciji trenutno nije moguć. Dogovoreno je da će Općina Tešanj stupiti u kontakt sa vlasnikom parcele, kako bi se omogućio pristup lokaciji. U međuvremenu, Izvođač radova će izvršiti iskolčenje građevine te isto dostaviti Općini, a Općina će prijaviti početak građenja nadležnoj općinskoj službi koja je izdala odobrenje za građenje i

nadležnoj urbanističko-građevinskoj inspekciji. Po realizaciji konstatovanih radnji od strane Općine i Izvođača radova, Nadzor će uvesti Izvođača radova u posao. Dana 27.11.2025., predstavnica Općine Tešanj je putem maila od AVP Sava tražila podatke za potrebe prijave za početak radova prema Građevinskoj inspekciji, (Ugovor za nadzor, Rješenja o imenovanju voditelja građenja i Rješenje o timu za nadzor, Zapisnik o iskolčenju objekta). AVP Sava je dostavila Ugovor za Nadzor, te mail proslijedila izvođaču i nadzoru kako bi i oni dostavili dio dokumentacije koji se odnosi na njih. Općina je izvršila prijavu početka radova za 27.11.2025. godine. Radovi u toku, a okončanje svih radova se očekuje u aprilu 2026. godine.

C.1.30. Regulacija rijeke Bosne na području općine Novi Grad, potez nizvodno od petlje Butila na sarajevskoj obilaznici

Radovi na ovom projektu su bili uslovljeni prioritetnim izvršenjem prelaza distributivnog gasovoda ispod korita rijeke Bosne, profila Ø225. Ovi radovi na postavljanju novog gasovoda su uspješno završeni ranije tokom 2025. godine. Međutim, nakon polaganja gasovoda, bilo je neophodno provesti testnu fazu kako bismo se uvjerili da novopoloženi gasovod funkcioniše besprijekorno, bez ikakvih smetnji ili curenja plina. Ova testna faza je bila ključna zbog sigurnosnih razloga, budući da se radi o gasovodu koji snabdjeva kompletno naselje Reljevo. Nije smjelo doći do bilo kakvog rizika po snabdjevanje plinom stanovnika ovog naselja, te je kao mjera predostrožnosti ostavljen stari gasovod kao alternativa. U slučaju da se tokom testiranja uoči bilo kakav problem, poput curenja ili sličnih nepravilnosti, moglo se brzo prebaciti na stari gasovod kako bi se osigurala kontinuirana isporuka plina. Međutim, stari gasovod je u direktnoj koliziji sa planiranim radovima na regulaciji rijeke Bosne, što je onemogućavalo nastavak i završetak radova na projektu dok se situacija ne razriješi. Tokom novembra 2025. godine su radnici "Sarajevogasa", u saradnji sa firmom HARYSCO d.o.o., izvršili završno zatrpavanje novog gasovoda, čime je testna faza uspješno okončana i omogućeno deaktiviranje starog gasovoda. Izvođač se suočavao sa dodatnim izazovima u vidu visokog vodostaja rijeke Bosne usljed velikih voda. Ovi vremenski uslovi činili su nemogućim nastavak i završetak preostalih radova na regulaciji dok vodostaj ne opadne na bezbjedan nivo. Poboljšanjem hidroloških uslova će se nastaviti sa izvršenjem preostalih obaveza prema ugovoru. Okončanje svih radova se predviđa najkasnije u maju 2026. godine.

U nastavku teksta su data obrazloženja za stavke koje su od značaja za AVP Sava, a koje su realizovane u 2025. godini:

C.1.32. Nabavka opreme i materijala za potrebe provođenja mjera aktivne odbrane od poplava

Tokom proglašenja aktivnih odbrana od poplava na poplavnim područjima u Posavskom kantonu (poplavna područja Odžačka i Srednja Posavina) koje su se dogodile u prethodnom periodu, te izvođenjem određenih sanacionih radova na zaštitnim vodnim objektima na navedenim područjima, došlo je do značajnog utroška opreme i materijala za potrebe provođenja aktivne odbrane od poplava.

Uvidom u stanje i količinu navedene opreme i materijala koji su smješteni u zaštitnim vodnim objektima, kao i na osnovu sugestije pravnih lica angažovanih u skladu sa odredbama Federalnog operativnog plana odbrane od poplava ("Službeni novine Federacije BiH", broj 97/15, u daljem tekstu FOP) na poslovima tekućeg održavanja zaštitnih vodnih objekata na poplavnim područjima Odžačka i Srednja Posavina, došlo se do zaključka da je potrebno izvršiti obnavljanje i popunu opreme i materijala za potrebe provođenja mjera aktivne odbrane od poplava, a u skladu sa tačkom 2.3. alineja 6. FOP-a.

Popuna opreme podrazumijevala je nabavku box barijera (3.000 m), PVC folija (3.000 m), te vreća za pijesak (50.000 kom.).
Ugovor za navedenu nabavku potpisan je sredinom mjeseca novembra 2024. godine i rokom isporuke od 5 mjeseci od dana potpisivanja ugovora. Isporuka robe je izvršena u dvije faze, te je kompletirana početkom mjeseca aprila 2025. godine, odnosno unutar ugovorom predviđenog roka.



Isporučene box barijere



Isporučene vreće za pijesak i PVC folije

C.1.34. Sanacija objekta Centra odbrane od poplava (COP) Prud na području Odžačke Posavine i C.1.35. Nadzor na sanaciji objekta Centra odbrane od poplava (COP) Prud na području Odžačke Posavine

Sredinom mjeseca jula 2023. godine Odžačku Posavinu je zahvatilo izrazito jako nevrijeme praćeno jakim vjetrom kao i obilnim padavinama. Tom prilikom na objektu COP-a u Prudu je načinjena šteta tako što je vjetar odnio veći dio limenog pokrova, nakon čega je usljed padanja jake kiše došlo do plavljenja unutrašnjeg dijela objekta. Djelovanjem oborinske vode koja je dospijela u unutrašnjost COP-a, znatna šteta je načinjena kako samoj konstrukciji (zidovi i plafon) tako i postojećem namještaju unutar objekta koji se ne može koristiti u buduće.
U cilju obezbjeđenja funkcionalnosti predmetnog objekta, za potrebe provođenje mjera aktivne odbrane od poplava na području Odžačke Posavine, neophodno je bilo izvršiti potpunu sanaciju konstruktivnog dijela objekta.
Da bi se obezbijedilo kvalitetno izvođenje predmetnih radova, odnosno da bi se što kvalitetnije provela realizacija predmetnih aktivnosti u toku 2024. godine je pripremljen elaborat sanacije COP-a.

U sklopu elaborata izvršen je detaljan pregled konstruktivnih dijelova objekta (zidovi, stropovi, krovna konstrukcija, …) utvrđen stepen njihovog oštećenja, te dato adekvatno tehničko rješenje sanacije COP-a sa specifikacijom neophodnih radova.
Ugovor je potpisan sredinom mjeseca novembra 2024. godine. U toku 2024. godine realizovano je blizu 40% ukupno ugovorenih radova, a ostatak radova je realizovan tokom 2025. godine.
Da bi se obezbijedilo adekvatno izvođenje predmetnih radova, posebnim ugovorom je angažovan nadzor nad izvođenjem radova. Sredstva za realizaciju Ugovora za nadzor obezbjeđena su stavkom C.1.35. Plana i finansijskog plana za 2025. godinu.



COP Prud prije sanacije i nakon sanacije

C.1.39. Nabavka usluga geodetskog snimanje poprečnih profila na lokacijama hidroloških automatskih stanica na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH

Za potrebe praćenja promjena u riječnim koritima, analizu protoka vode, modeliranje poplava i generalno, planiranje upravljanja vodnim resursima, neophodno je ažurirati postojeće tj. izvršiti geodetsko snimanje poprečnih profila riječnih korita na lokacijama hidroloških stanica. Za nadogradnju i unapređenje postojećih hidrološko-hidrauličkih i prognostičkih modela u okviru prognoznog sistema AVP Sava, od izuzetnog je značaja vršiti periodično ažuriranje baze podataka geodetskih poprečnih profila.
Potrebno je bilo izvršiti geodetsko snimanje poprečnih profila na svim specificiranim lokacijama automatskih hidroloških stanica kao i inoviranje, provjeru i geodetsko snimanje kota nule vodomjernih stanica i stanica za mjerenje nivoa podzemne vode, na vodnom području rijeke Save, na teritoriji Federacije BiH.
U skladu s ugovorom za period septembar 2024. – mart 2025. godine, realizovano je:

- Geodetsko snimanje poprečnih profila na 77 lokacija automatskih hidroloških stanica u slivu rijeke Save na teritoriji Federacije BiH,
- Inoviranje i provjera kota nule na 72 lokacije s postojećim geodetskim obrascima,
- Geodetsko određivanje kota nule i izrada geodetskih obrazaca za devet novih lokacija automatskih hidroloških stanica, te
- Geodetsko određivanje kota nule na devet lokacija stanica za mjerenje nivoa podzemnih voda.

Ugovor je potpisan u septembru 2024. godine, s ugovorenim rokom za završetak usluga od šest mjeseci od dana potpisivanja. Predmetni poslovi su u potpunosti završeni, a realizacija ugovora okončana je u martu 2025. godine.

C.2. Novi radovi, nabavka roba i usluga koji se finansiraju iz viška prihoda nad rashodima

C.2.1. Glavni projekat izrade pragova u koritu rijeke Usore u cilju poboljšanja vodosnabdjevanja Općine Tešanj

Akom broj 02-45-1-1525-7/24 od 25.02.2025. godine Općina Tešanj je kandidovala vršenje usluge izrade glavnog projekta izgradnje pragova u koritu rijeke Usore u cilju poboljšanja vodosnabdjevanja. Na području općine Tešanj izražena je pojava ogoljavanja riječnog korita usljed prirodnih i antropogenih uticaja gdje se dno korita spustilo do riječnog supstrata koga čini laporoviti materijal. Sniženje dna korita ima za posljedicu snižavanje nivoa vode u bunarima izvorišta „Jelah" koji se koriste za vodosnabdjevanje. Ovo sniženje je naročito izraženo u ljetnim mjesecima koje za posljedicu ima uvođenje redukcije vode u tom periodu. Cilj ovog projekta je obezbijediti stalnu infiltraciju što većih količina vode u podzemnu akumulaciju izvorišta, a da se istovremeno onemogući obrnut proces što se dešava u pojedinim hidrološkim situacijama na način da se predvidi izgradnja pragova u koritu rijeke Usore na način da se omogući uspješno funkcioniranje izvorišta u budućnosti, uz uklapanje rješenja u usvojeni koncept zaštite od poplava uz preferiranje prirodnim materijala (drvo i kamen) za njegovu realizaciju. Izrada projektne dokumentacije je u toku i očekuje se njegov završetak u prvom kvartalu 2026. godine.

C.2.2. Uređenje desne obale rijeke Bosne u Maglaju nizvodno od Gradskog mosta (zajedno sa stavkom B.2.2.2.)

Obrazloženje ove stavke je dato uz obrazloženje stavke B.2.2.2.

C.2.3. Regulacija rijeke Željeznice u Otesu na dionici od P16 – P23, Općina Ilidža (zajedno sa stavkom B.2.2.9.)

Obrazloženje ove stavke je dato uz obrazloženje stavke B.2.2.9.

C.2.4. Regulacija rijeke Spreče u Lukavcu uzvodno od koksarinog mosta, dionica PP1 – PP13 dužine 450 m (zajedno sa stavkom B.2.2.10.)

Obrazloženje ove stavke je dato uz obrazloženje stavke B.2.2.10.

C.2.5. Uređenje korita rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu-Uskoplju do profila P17 (zajedno sa stavkom B.2.2.11.)

Obrazloženje ove stavke je dato uz obrazloženje stavke B.2.2.11.

C.2.6. Nastavak uređenja desne obale rijeke Bosne u Zenici, poslovna zona Zenica Jug

Iz Grada Zenice je aktom broj 02-45-19146/23 od 25.09.2023. godine zaprimljen zahtjev za realizaciju više projekata za zaštitu od štetnog djelovanja voda. Nakon obilaska terena od strane stručnih službi AVP Sava kao prioritetno je odabrano izvođenje radova na uređenju desne obale rijeke Bosne na lokalitetu buduće Poslovne zone Zenica-Jug, dionica od mosta na magistralnom putu M-17 do željezničkog mosta u Lukovom polju, ukupne dužine 1900 m. Taj projekat je od strane gradske uprave prepoznat kao prioritet zbog povećanja protočnosti riječnog korita i uređenja lokacije na kojoj će izgradnjom poslovne zone Zenica Jug priliku za rad i zaposlenje dobiti stotine građana Zenice i okolnih naselja. Zbog velike investicione vrijednosti, realizacija ovog projekta je planirana u fazama. U 2022. i 2023. godini su izvedeni radovi od mosta Drivuša do profila P35. Ovi radovi predstavljaju nastavak uređenja desne

obale rijeke Bosne nizvodno od izvedenog dijela prema novoizgrađenom mostu preko rijeke Bosne. Za ovu dionicu je izdata građevinska dozvola, a za njenu realizaciju su ugovoreni radovi u novembru 2025. godine u iznosu od 1.598.220,00KM. Procjenjuje se da će svi radovi biti okončani u ugovorenom roku (150 radnih dana od uvođenja u posao).



Radovi u toku

C.2.7. Uređenje korita rijeke Plive u Jajcu – dovršetak izgradnje praga broj 12

Akom broj 02-21-7727/27 od 19.09.2024. godine Općina Jajce se obratila AVP Sava za obezbjeđenje sredstava za završetak radova na izgradnji praga broj 12 i uređenju obale rijeke Plive na tom lokalitetu. Izgradnja praga broj 12 na rijeci Plivi je nastavak projekta regulacije rijeke Plive odnosno sanacija korita i obala uzrokovana poplavnim valom iz 1996. godine. Projektom sanacije korita i obala rijeke Plive predviđena je izgradnja 13 pragova, koji bi u potpunosti sanirali sve nastale štete, spriječili daljnu devastaciju obala i trajno zaštitili obiteljske i infrastrukturne objekte koji se nalaze u neposrednoj blizini korita rijeke Plive. Do sada je izgrađeno 9 pragova uzvodno od vodopada i u završnoj fazi je izgradnja praga broj 12 koji je finansiran kroz namjenski prijenos sredstava na općinu Jajce. Izgradnjom 12. praga u potpunosti bi se stabiliziralo korito i obale rijeke Plive u području naselja Mračaj i Volijak, čime bi se zaštitili obiteljski i infrastrukturalni objekti u zoni između budućeg praga 11 i praga broj 13 kao i u potpunosti stabilizirale obale rekreacionog centra. Pored navedenog zaštitila bi se i regionalna cesta (nekada magistralna Jajce-Bihać) koja osim što spaja mnoga naselja je ujedno i turistička prometnica kojom se dolazi do Velikog Plivskog jezera, vodenica i drugih turističkih atrakcija. Navedeni lokalitet je kroz usvojeni Plan upravljanja rizikom od poplava prepoznat kao lokacija sa rizikom po stanovništvo i ekonomiju. Za realizaciju ovog dijela projekta je predviđen iznos od 617.759,99 KM. Izvođač je uveden u posao 09.12.2025. godine i očekuje se da će svi radovi biti okončani u ugovorenom roku (150 radnih dana od uvođenja izvođača u posao).

C.2.8. Hidrografsko snimanje korita rijeke Save u Federaciji BiH i C.1.33. Nadzor na hidrografskom snimanju korita rijeke Save u Federaciji BiH

U periodu od 2008. godine AVP Sava je radi praćenja promjena na prirodnom koritu rijeke Save u Federaciji BiH u nekoliko navrata vršila je hidrografska snimanje prirodnih korita rijeka Save i Bosne. U cilju sagledavanja trenutnog stanja korita rijeke Save, te razmatranja odluke o eventualnoj potrebi za vađenjem materijala iz korita rijeke Save tj. obezbjeđenju protočnosti kinete plovnog puta rijeke Save, potrebno je periodično vršiti hidrografsko snimanje ovog graničnog vodotoka. Također od strane Svjetske banke je planirano da uskoro počne realizacija regionalnog projekta koji će biti fokusiran na koridor tj. osnovni tok rijeke Save.

Planiranim hidrografskim snimanjem su obuhvaćene sve dionice rijeke Save u Federaciji BiH koje su definisane ranijim snimanjem kao i svi evidencioni poprečni profili vodotoka, kako bi se moglo izvršiti njihovo upoređivanje (preklapanje) sa rezultatima ranije izvršenih snimanja, prema Projektnom zadatku.
Tokom provođenja postupka predmetne javne nabavke, izjavljena je žalba na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, što je rezultiralo da se ova stavka nije realizovala u 2024. godini, te je njena realizacija započeta u 2025. godini. Svi radovi su uspješno okončani unutar ugovorenog roka, u skladu sa odredbama ugovora i projektnog zadatka.
Da bi se obezbijedilo adekvatno izvođenje predmetne usluge, posebnim ugovorom je angažovan nadzorni organ koji je bio zadužen za realizaciju. Sredstva za realizaciju Ugovora za nadzor obezbjeđena su stavkom C.1.33. Plana i finansijskog plana za 2025. godinu.

C.2.9. Obezbjeđenje proticajnog profila Spreče u Gračanici, lokacija od ušća u Lohinjsku rijeku do OŠ u Donjoj Lohinji u dužini od 1200 m

Aktom broj 02-11-03799-2024 od 09.09.2024. godine Grad Gračanica se obratio AVP Sava za planiranje potrebnih sredstava za obezbjeđenje proticajnog profila Spreče u Gračanici, lokacija od ušća u Lohinjsku rijeku do OŠ u Donjoj Lohinji u dužini od 1200 m. Predmetni lokalitet se nalazi unutar područja sa potencijalno značajnim rizikom od poplava APSFR (prema preliminarnoj procjeni rizika od poplava za vodno područje rijeke Save 2013). Prema rezultatima hidrodinamičkog modela rijeke Spreče urađenog za potrebe izrade mapa opasnosti i rizika od poplava u BiH vidljivo je da je cijelom dužinom predmetna dionica pod uticajem štetnog djelovanja voda rijeke Spreče ranga pojave 1/100. Uzvodna dionica rijeke Spreče je očišćena u ranijem periodu, te je uvidom na licu mjesta uočena jasna razlika u obliku očišćenog i prirodnog korita. Obzirom da jednim dijelom predmetne dionice rijeka Spreča predstavlja i liniju entiteta, tačnije desna obala je u Federaciji BiH dok je lijeva obala u entitetu RS, otežavajuća okolnost jeste da ne postoji saglasnost JU Vode Srpske za izvođenje predmetnih radova u cijelom koritu na području općine Gračanica. Okolno zemljište je uglavnom poljoprivredno u privatnom vlasništvu, farma pilića i stambeni objekti koji su pod utjecajem velikih voda rijeke Spreče. Na osnovu prethodnih konstatacija, postoji potreba da se nastavi sa radovima na čišćenju rijeke Spreče na cijelom predloženom lokalitetu, kao preventivna mjera dok se ne uradi regulacija rijeke Spreče. S obzirom na ugroženost industrijskih pogona, stambenih objekata i blizine osnovne škole, navedena lokacija je prioritet broj 1 za izvođenje radova u Gračanici. Za realizaciju ovog projekta su ugovoreni radovi u iznosu od 458.689,14 KM. Izvođač je uveden u posao 22.12.2025. godine i očekuje se da će svi radovi biti okončani u ugovorenom roku (120 radnih dana od uvođenja izvođača u posao).

C.2.10. Regulacija desne obale rijeke Vrbas u Donjem Vakufu u dužini od 100 m

Akom broj 02-11-011657/24-1 od 20.09.2024. godine Općina Donji Vakuf se obratila AVP Sava za obezbjeđenje potrebnih sredstava za nastavak regulacije desne obale rijeke Vrbas. Predmetna lokacija je nastavak regulacije desne obale rijeke Vrbas koja se nalazi preko puta mezarluka „Bijeli harema" u dužini od 100 m. Ova lokacija nalazi se uz magistralnu cestu M16, ukupne dužine cca 100 m. Prirodno korito rijeke Vrbas veoma je obraslo rastinjem te zatrpano nanosima. Zbog toga pri pojavi velikih voda i usljed erozionih dejstava rijeke dolazi do odnošenja obala, povećanja meandara, pomjeranja trase korita, plavljenja poljoprivrednih površina i plavljenja stambenih objekata. Na osnovu navedenih činjenica, te da se radi o naseljenom mjestu, kao i da je ugrožena Magistralna cesta M16, konstatovano je da postoji potreba za uređenjem desne obale korita rijeke Vrbas na ovom lokalitetu. Nakon realizacije radova predviđenih postojećom projektnom dokumentacijom, nastavak etapnog regulisanja

rijeke Vrbas na ovoj lokaciji, očekivani efekti su zaštita stambenih objekata, saobraćajne infrastrukture kao i poljoprivrednih površina od plavljenja pri nailasku velikih voda rijeke Vrbas. Radovi su ugovoreni krajem 2025. godine u iznosu od 495.833,80 KM i u 2025. godini nije bilo radova. Procjenjuje se da će svi radovi biti završeni do ugovorenog roka (135 radnih dana od dana uvođenja u posao).

C.2.11. Regulacija rijeke Vrbas u naselju Pavić Polje, općina Gornji Vakuf-Uskoplje

Obrazloženje ove stavke je dato uz obrazloženje stavke B.2.2.15.

C.2.12. Uređenje desne obale rijeke Usore u Tešnju u naselju Mrkotić pored jezera u dužini od 400 m

Akom broj 02-45-1-1525-2/24 od 11.09.2024. godine Općina Tešanj je za Plan i Finansijski plan AVP Sava kandidovala projekat Uređenje desne obale rijeke Usore u Tešnju u naselju Mrkotić pored jezera u dužini od 400 m. Navedeni lokalitet se nalazi na desnoj obali rijeke Usore, pored jezera u naselju Mrkotić. Radi se o urbanom području sa stambenim i privrednim objektima, putnom komunikacijom, jezerom, igralištem za djecu, na kojem bi se uslijed plavljenja velikim vodama rijeke Usore mogle javiti značajne materijalne štete. U cilju spriječavanja plavljenja jezera koje je poribljeno i služi za ribolovnu rekreaciju, MZ Mrkotić je u ranijem periodu izvršila radove na izgradnji nasipa na desnoj obali korita rijeke Usore, bez projektne dokumentacije. Na ovom potezu postoji i brana na rijeci Usori, u čijem dnu na desnoj obali je izgrađena vodenica u svrhu prihranjivanja jezera vodom. Predmetni potez je ugrožen poplavama usljed nedovoljnog kapaciteta i neuređenog korita vodotoka, zbog čega se voda izlijeva iz korita i plavi okolni teren (naselje, poljoprivredne površine, infrastrukturne objekte i dr.) čime nastaju značajne materijalne štete. Na ovoj lokaciji je primjetno i lokalno suženje korita na lijevoj obali na potezu nizvodno od brane na rijeci Usori. Zadnje značajnije poplave rijeke Usore u naselju Mrkotić desile su se u mjesecu januaru 2010. godine i maju 2014. godine, a često se dešavaju u manjem obimu. U neposrednoj blizini ove lokacije, nešto nizvodnije, u rijeku Usoru se ulijeva lokalni potok, koji također utiče na plavljenje na ovoj lokaciji zbog uticaja uspora pri visokim vodostajima rijeke Usore, te je preporuka da se općina Tešanj u saradnji sa kantonalnim ministarstvom vodoprivrede angažuje i na uređenju potoka na ovoj lokaciji. Projektnom dokumentacijom je predviđeno uređenje u dužini od 700 m. U Planu i Finansijskom planu AVP Sava za 2022. godinu, za izvođenje radova našla se prva dionica iz navedenog projekta koja obuhvata potez uzvodno od vodenice u dužini od cca 300 metara, te je ista uspješno realizovana. Treba reći i da se predmetni lokalitet nalazi unutar područja sa potencijalno značajnim rizikom od poplava „APSFR" (prema preliminarnoj procjeni rizika od poplava za vodno područje rijeke Save 2013). Nakon realizacije svih radova predviđenih postojećom projektnom dokumentacijom, očekivani efekat je zaštita ove lokacije od plavljenja velikim vodama povratnog perioda 1/100 godina, kao i zaštita desne obale od erozionih dejstava rijeke Usore. Za realizaciju ovog projekta je predviđen iznos od 500.000,00 KM. Obzirom da do kraja 2025. godine za ovaj projekat nisu bili riješeni imovinsko-pravni odnosi, niti izdate sve potrebne saglasnosti i dozvole planirana sredstva su ostala nerealizovana i koristiće se u 2026. godini kao višak prihoda nad rashodima.

C.2.13. Nabavka padavinskih/kišomjernih i hidroloških stanica

Obzirom na zakonsku obavezu i potrebu AVP Sava za provođenjem hidrološkog monitoringa uspostavljen je automatski monitoring sistem sa ugrađenom najmodernijom opremom za kontinuirano praćenje hidroloških parametara. Automatske meteorološke i hidrološke stanice za praćenje režima površinskih voda i automatske stanice za mjerenje nivoa podzemnih voda

su raspoređene na cijeloj teritoriji vodnog područja rijeke Save u Federaciji BiH. Podaci sa ovih automatskih stanica se prikupljaju i obrađuju, u realnom vremenu na satnoj osnovi, u sklopu informacionog sistema voda (ISV)-hidrološka platforma Wiski. Ukupan broj automatskih stanica koje se nalaze u automatskom hidrološkom monitoring sistemu, na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH do danas iznosi preko 130. Za potrebe razvijenih sistema prognoze poplava na nacionalnom nivou, a nakon analize postojećih meteo/padavinskih i hidroloških stanica, utvrđeno je da bi bilo neophodno da se u narednom periodu progusti postojeća mreža ovih stanica. Nakon analize rasporeda postojećih stanica, kao i nakon oktobarskih poplava iz 2024. godine lokacije na kojima će biti postavljene automatske padavinske i hidrološke stanice su planirane na slivovima rijeka Una i Bosna. Nakon provedene tenderske procedure, u decembru 2025. godine potpisan je ugovor o nabavci padavinskih/kišomjernih i hidroloških stanica na iznos 99.999,90 KM. Rok za nabavku i ugradnju opreme je 5 mjeseci od dana zaključenja ugovora.

C.2.14. Nabavka analitičke opreme: GC/FPD, TOC/TN i IC za potrebe Laboratorije za vode

Pokrenut je otvoreni postupak Nabavka analitičke opreme: GC/FPD, TOC/TN i IC za potrebe Laboratorije za vode- TRI LOT-A

LOT1. Nabavka gasnog hromatografa sa FPD detektorom

Postupak javne nabavke je provden, sklopljen je ugovor sa Schimazu broj 60-1137-33/25 dana 26.12.2025. Rok za isporuku je bio 31.12.2025. godine. Isporučilac nije isporučio opremu na ugovorom definisanim rokom, te je postupak poništen za lotove 1 i 3.

LOT 3 - Nabavka jonskog hromatografa – postupak provden, nije potpisan ugovor, jer je za isporučioca bio prekratak rok za isporuku. Rok za isporuku u ugovoru bio do 31.12.2025. godine, što nije mogao ispuniti izabrani ponuđač te je postupak za LOT 3 poništen.

U ovom postupku su bile dvije žalbe i to za LOT 1 i LOT 3. Žalilac je odustao od žalbe, ali je se značajno skratilo vrijeme i mogućnost za realizaciju ugovora

Dakle iz C.2.14. Nabavka analitičke opreme: GC/FPD, TOC/TN i IC za potrebe Laboratorije za vode je nabavljen je samo Analizator za ukupni ugljik i azot. Ugovoreno je i realizovano 108.225,00 KM sa PDV-om.

C.2.15. Nabavka opreme potrebne za rad Laboratorije za vode

Iz ove stavke nabavljena je mašine za pranje laboratorijskog posuđa, u iznosu od 39.930,93 KM, nabavka analitičke vage u Laboratoriji za vode, u iznosu od 3.744,00 KM, nabavka laboratorijske instrumentacije za pripremu uzoraka, u iznosu od 23.388,30 KM,nabavka jonskog izvora na postojećem instrumentu GC-7890 MS-5975 proizvođača Agilent, u iznosu od 19.890,00 KM, te nabavka autoklava u iznosu od 12.870,00 KM.

C.2.16. Nabavka klima uređaja za Laboratoriju za vode

Iz ove stavke nabavljena je nabavka i ugradnja novih klima uređaja u iznosu od 18.133,83 KM.

C.2.17. Nabavka terenskog motornog vozila

Iz ove stavke izvršena je nabavka terenskog vozila, u iznosu od 120.000,00 KM.

C.2.18. Nabavka uređaja za analizu metala ICP/MS

Ugovor je potpisan u novembru 2025. godine, sa rokom realizacije do 31.12.2025. od dana potpisivanja ugovora. Isporučilac nije opremu isporučio u roku koji je definisan ugovorom te je postupak poništen.

C.2.19. Sanacija erodirane obale u naselju Crnalići, Općina Ključ

Općina Ključ se AVP Sava obratila zahtjevom broj 03-24-755/24 od 08.04.2024. godine sa zahtjevom za hitnom sanacijom erodirane obale rijeke Sanice u naselju Crnalići i čišćenjem korita rijeke Sanice u naselju Donja Sanica. Nije postojala projektna dokumentacija ni za jednu od navedenih lokacija te su iste u međuvremenu izrađene. Realizacija projekta u Crnalićima je hitna jer je došlo do odrona – urušavanja lijeve obale Sanice u dužini uz 10 m na lokaciji uz regionalni put R 410 (put Sanica – Donja Sanica u zaseoku Crnalići). Erodirana obala čini škarpu i nožicu puta, a u blizini je i dalekovod te su posljedice erozije uvećane i potrebno je hitno djelovanje. Radovi su ugovoreni krajem oktobra 2025. godine u iznosu od 99.501,41 KM i u 2025. godini zbog visokog vodostaja Sanice nije bilo radova. Procjenjuje se da će svi radovi biti završeni do ugovorenog roka (90 radnih dana od dana uvođenja u posao).

C.2.20. Sanacija pristupnih puteva uz nasipe na području Posavskog kantona, područje Odžačka Posavina

Nakon okončanja aktivnosti na rekonstrukciji dionica savskog odbrambenog nasipa koje nisu imale potrebno zaštitno nadvišenje (1,2 m iznad kote stogodišnje velike vode rijeke Save), na poplavnim područjima Odžačke i Srednje Posavine je znatno smanjen rizik od plavljenja.
Kao jedna od preostalih aktivnosti na obezbjeđenju pune funkcionalnosti zaštitnih vodnih objekata na ovim područjima nameće se potreba obezbjeđenja pristupnih puteva uz branjenu stranu nasipa.
Navedene aktivnosti je bitno provesti u cilju što lakšeg i sigurnijeg provođenja mjera aktivne odbrane od poplava tokom poplavnih događaja, odnosno postojanja adekvatne putne komunikacije u slučajevima kada je nivo rijeke Save visok, odnosno kada kretanje motornih vozila po kruni raskvašenog nasipa može predstavljati rizik za stabilnost i funkcionalnost istog.
S tim u vezi pokrenuta je aktivnost da se na što većoj dužini savskog odbrambenog nasipa, uz nožicu tijela nasipa sa branjene strane, obezbjedi stabilna i prohodna saobraćajnica.
Kroz redovni mjesečni izvještaj vodočuvarske službe broj: VP-40/25 od 25.03.2025. godine (daje se u prilogu) od strane pravnog lica koji u ime Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo vrši poslove tekućeg održavanja zaštitnih vodnih objekata na području Odžačke Posavine je dostavljen prijedlog za sanaciju pristupnog puta uz savski odbrambeni nasip na dionici od km 18+200 do km 22+900, obzirom da se zbog lošeg stanja samog puta javljaju problemi da vozači zaobilazeći rupe ulaze u nožicu nasipa i oštećuju sam nasip.
Sa firmom Vodoprivreda „POSAVINA" d.o.o. Odžak je (po javnom oglasu o otvorenom postupku objavljenom dana 15.09.2023. godine broj Obavještenja broj: 1132-1-3-124-3-105/23 pod nazivom: „Vršenje radova odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Odžačke Posavine za period 2024. – 2026. godina") sklopljen Okvirni sporazum za vršenje radova odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Odžačke Posavine (akt broj 10-1001-14/23 od 06.11.2023. godine).
Članom 4. Navedenog Okvirnog sporazuma Naručilac "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo i Izvođač tokom ugovornog perioda (2024.-2026.) imaju pravo da zaključuju posljedične (radovi izazvani višom silom) ili pojedinačne ugovore za radove, usluge i nabavke

uz korištenje finansijskih elemenata i cijena datih u ponudi Izvođača broj: VP-115-24/23 od 18.10.2023. godine.
Shodno navedenom, od strane predstavnika Izvođača (firme Vodoprivreda „POSAVINA" d.o.o. Odžak) je dostavljen predmjer radova za sanaciju pristupnog puta uz savski odbrambeni nasip na dionici od km 18+200 do km 22+900, (sačinjeni uz korištenje finansijskih elemenata i cijena datih u ponudi Izvođača).
Na osnovu svega navedenog i u skladu sa članom 4. Okvirnog sporazuma za vršenje radova odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Odžačke Posavine pokrenute su aktivnosti na dodjeli Ugovora za "Sanacija pristupnih puteva uz nasipe na području Posavskog kantona, područje Odžačka Posavina" uz korištenje finansijskih elemenata i cijena datih u ponudi Izvođača broj: VP-115-24/23 od 18.10.2023. godine.
Ugovor je potpisan krajem mjeseca augusta sa rokom od 90 radnih dana. Radovi su uspješno i u skladu sa ugovorom okončani unutar ugovorenog roka.



Sanacija pristupnog puta uz savski odbrambeni nasip, dionica od km 18+200 do km 22+900 (prije i nakon izvedenih radova)

C.2.21. Sanacija kanala Svilaj-Potočani na dionici od km 4+115,92 do km 4+497,56, područje Odžačka Posavina

Sa firmom Vodoprivreda „POSAVINA" d.o.o. Odžak je (po javnom oglasu o otvorenom postupku objavljenom dana 15.09.2023. godine broj Obavještenja broj: 1132-1-3-124-3-105/23 pod nazivom: „Vršenje radova odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Odžačke Posavine za period 2024. – 2026. godina") sklopljen Okvirni sporazum za vršenje radova odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Odžačke Posavine (akt broj 10-1001-14/23 od 06.11.2023. godine).

U proteklom periodu 2020.-2023. godine izvršena je potpuna sanacija kanala Svilaj –Potočani na dionici od km 1+705 do km 4+115,92.
Dopisom (redovni mjesečni izvještaj vodočuvarske službe) broj: VP-40/25 od 25.03.2025. godine firma Vodoprivreda „POSAVINA" d.o.o. Odžak je predložila da se planira nastavak radova na sanaciji kanala Svilaj –Potočani od stacionaže km 4+115,92 do km 4+497,56 kako bi radove uspjeli izvesti za vrijeme ljetnih mjeseci.
Za potrebe nastavka sanacije istog urađen je Elaborat "Sanacija kanala Svilaj Potočani od km 4+115,92 do km 4+497,56".
Nadzorni organ, nakon obilaska terena i utvrđivanja činjeničnog stanja, je potvrdio opravdanost radova za nastavak sanacije kanala Svilaj-Potočani, te predložio da se isti odobre od strane AVP Sava.
Članom 4. Navedenog Okvirnog sporazuma Naručilac "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo i Izvođač tokom ugovornog perioda (2024.-2026.) imaju pravo da zaključuju posljedični ili pojedinačni ugovor za radove, usluge i nabavke uz korištenje finansijskih elemenata i cijena datih u ponudi Izvođača broj: VP-115-24/23 od 18.10.2023. godine (specifikacija data u prilogu akta).
Na osnovu svega navedenog u skladu sa članom 4. Okvirnog sporazuma za vršenje radova odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Odžačke Posavine pokrenute su aktivnosti na dodjeli Ugovora po Okvirnom sporazumu „Sanacija kanala Svilaj-Potočani na dionici od km 4+115,92 do km 4+497,56, područje Odžačka Posavina" uz korištenje finansijskih elemenata i cijena datih u ponudi Izvođača broj: VP-115-24/23 od 18.10.2023. godine.
Ugovor je potpisan krajem mjeseca augusta sa rokom od 60 radnih dana. Radovi su uspješno i u skladu sa ugovorom okončani unutar ugovorenog roka.



Sanacija kanala Svilaj-Potočani, dionica od km 4+115,92 do km 4+497,56 (prije i nakon izvedenih radova)

C.2.22. Radovi na kruni savskog odbrambenog nasipa u urbanom području Grada Orašja

Nakon okončanja aktivnosti na rekonstrukciji dionica savskog odbrambenog nasipa koje nisu imale potrebno zaštitno nadvišenje (1,2 m iznad kote stogodišnje velike vode rijeke Save), na poplavnim područjima Odžačke i Srednje Posavine je znatno smanjen rizik od plavljenja.
Također, kao jedna od aktivnosti na obezbjeđenju pune funkcionalnosti zaštitnih vodnih objekata na ovim područjima izvršena je sanacija najvažnijih pristupnih puteva uz branjenu i vodnu stranu nasipa, što je dovelo do lakšeg i sigurnijeg provođenja mjera aktivne odbrane od poplava tokom poplavnih događaja, odnosno postojanja adekvatne putne komunikacije u slučajevima kada je nivo rijeke Save visok, tj. kada kretanje motornih vozila po kruni

raskvašenog nasipa može predstavljati rizik za stabilnost i funkcionalnost istog. Također, navedeno je značajno i radi što lakše provedbe radova tekućeg održavanja nasipa, naročito tokom radova na košenju nasipa.
Aktom Grada Orašja broj: 01-19-1306/24 od 06.09.2024. godine, „Agenciji za vodno područje rijeke Save" Sarajevo je upućen zahtjev za izvođenje radova na kruni savskog odbrambenog nasipa u Orašju, odnosno kroz urbani dio Grada Orašja. Navedeni zahtjev je obrazložen na način da je središnji dio već uređen, te je zatraženo da se isto izvrši i za dionicu od rampe kod Omladinskog doma do rampe kod mosta. Navedeno je da predmetnom dionicom građani idu u šetnju, te da civilna zaštita istu koristi za svoje potrebe, kao i ostali pravni subjekti te institucije. Također, navedeno je da bi se navedenim radovima osigurao lakši pristup nasipu, rijeci Savi i ostalim objektima, učvrstila kruna nasipa, te povećao turistički potencijal Grada, a što bi znatno doprinijelo kvaliteti života i sigurnosti u Gradu Orašju.
Aktom pravnog lica (Dejokop d.o.o. Bok, Orašje) koje je provodilo radove tekućeg održavanja zaštitnih vodnih objekata na području Srednje Posavine broj: 26-09/24 od 27.09.2024. godine, navedeno je da su isti također zaprilimili zahtjev od Grada Orašja, te su isti nakon obilaska predmetnih dionica smatrali opravdanim izvođenje radova asfaltiranja krune nasipa zbog razloga navedenih u aktu Grada Orašja. Također, navedeno je da bi navedeni radovi bili od velike važnosti sa aspekta radova održavanja tekućeg održavanja nasipa, odnosno lakšeg obavljanja istih. U prilogu navedenog akta priložena je specifikacija (predmjer i predračun) navedenih radova asfaltiranja krune savskog odbrambenog nasipa na dionici od Omladinskog doma do rampe kod mosta, a koja je sačinjena uz korištenje finansijskih elemenata i cijena datih u ponudi Izvođača broj: 65-10/23 od 12.10.2023. godine.
Sa grupom ponuđača „DEJOKOP" d.o.o. Bok Orašje i "Den Alm Company" d.o.o. Lukavac je sklopljen Okvirni sporazum za vršenje radova odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Srednje Posavine za period 2024. – 2026. godina (akt broj: 10-1000-11/23 od 02.11.2023. godine).
Članom 4. navedenog Okvirnog sporazuma, Naručilac i Izvođač tokom ugovornog perioda (2024.-2026.) imaju pravo da zaključuju posljedične ili pojedinačne ugovore za radove, usluge i nabavke uz korištenje finansijskih elemenata i cijena datih u ponudi Izvođača broj: 65-10/23 od 12.10.2023. godine.
Na osnovu svega navedenog i u skladu sa članom 4. Okvirnog sporazuma za vršenje radova odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Srednje Posavine, pokrenuta je aktivnost na dodjeli Ugovora za „Radove na kruni savskog odbrambenog nasipa u urbanom području Grada Orašja" uz korištenje finansijskih elemenata i cijena datih u ponudi Izvođača broj: 65-10/23 od 12.10.2023. godine.
Ugovor za predmetne radove poptpisan je početkom mjeseca septembra 2025. godine, te su svi ugovorom predviđeni radovi uspješno okončani u predviđenom roku.



Izvođenje predmetnih radova


Predmetna dionica nakon završetka ugovorenih radova

C.2.23. Ugradnja instalacije plinske mreže za dovod specijalnih plinova u Laboratoriji za vode

Ugradnja instalacije je završena krajem januara 2026. godine, dostavljena je prateća dokumentacija. Ugovoreni iznos nabavke je 34.211,97 KM.

C.2.24. Servisna podrška i održavanje implementiranog sistema upravljanja rizicima u Laboratoriji za vode

Ugovor je potpisan 19.12.2025. godine, sa rokom realizacije do od dana potpisivanja ugovora. Rok za izvršenje je tri mjeseca od datuma zaključenja predmetnog ugovora. Ugovoreni iznos je 32.292,00 KM.

C.2.25. Nabavka računarske opreme

AVP Sava je u predhodnom periodu izradila dokument pod nazivom "Izvještaj o analizi i preporukama za unapređenje IT sigurnosti u AVP Sava" u kojem su evidentirana i prepoznata kritična mjesta na IT infrastrukturi.

U cilju riješavanja tih kritičnih mjesta, a na osnovu preporuka u okviru ove nabavke roba potrebno je zamjeniti dio komunikacione opreme (switch uređaji), pojačati određenu

serversku opremu dodatnom memorijom, te zamjeniti dio računarske opreme sa operativnim sistemom Windows 7.
Nabavkom ove opreme u velikoj mjeri bi se riješili prepoznati problemi i ispunile bi se date preporuke iz navedenog izvještaja, a dodatno bi se unaprijedilo stanje sa novom računarskom opremom u cilju obezbjeđenja računarske opreme za planirane nove uposlenike AVP Sava i Laboratorije za vode AVP Sava.
Javna nabavka roba je pokrenuta Odlukom o pokretanju postupka nabavke (17.09.2025. godine), provedena je procedura nabavke putem otvorenog postupka, odabran je isporučilac opreme i ugovor o isporuci računarske opreme je potpisan 03.12.2025. godine sa rokom isporuke opreme u trajanju od 120 dana od dana potpisivanja ugovora.

C.2.26. Usluge zbrinjavanja opasnog otpada

Ugovor je potpisan u novembru 2025. godine, sa rokom realizacije od 24 mjeseca od dana potpisivanja ugovora. Ugovoreni iznos nabavke je 19.888,83 KM.

C.2.27. Procjena rizika na radnim mjestima u "Agenciji za vodno područje rijeke Save"

Postojeći Akt o procjeni rizika na radnim mjestima (izrađen 2023. godine) nije u potpunosti sagledao stvarno stanje rizika, ni otežanih uslova rada, za pojedina radna mjesta u AVP Sava, posebno Laboratorije za vode. Shodno Zakonu o zaštiti na radu, akt o procjeni rizika na mjestu rada treba sadržavati opis procesa rada sa procjenom rizika od povreda ili oštećenja zdravlja na mjestu rada u radnoj okolini i mjere za otklanjanje ili smanjivanje rizika na najmanju moguću mjeru u cilju poboljšanja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu. Ugovor za ovu nabavku potpisan je u januar 2026. godine u vrijednosti od 14.713,92 KM.

C.2.28. Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova

Sa ove stavke finansirane su usluge nadzora za sljedeće: Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektu - Uređenje desne obale rijeke Vrbas u Donjem Vakufu u dužini od 100 m; Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektu - Regulacija rijeke Vrbas u naselju Pavić Polje općina Gornji Vakuf – Uskoplje; Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektu Regulacija rijeke Željeznice u Otesu na dionici od P16 – P23, Općina Ilidža; Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektu - Uređenje desne obale rijeke Bosne u Maglaju nizvodno od Gradskog mosta; Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektu - Uređenje korita rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu-Uskoplju do profila P17; Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektu - Nastavak uređenja desne obale rijeke Bosne u Zenici, poslovna zona Zenica Jug; Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektu - Uređenje korita rijeke plive u Jajcu - dovršetak izgradnje praga broj 12; Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektu - Obezbjeđenje proticajnog profila Spreče u Gračanici, lokacija od ušća u Lohinjsku rijeku do OŠ u Donjoj Lohinji u dužini od 1200 m; Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektu - Sanacija erodirane obale u naselju Crnalići, općina Ključ; Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektu - Zaštita zemljišta na Velikoj otoci u Ripču; Vršenje usluga nadzora nad vađenjem materijala iz vodotoka 3 LOT-a; Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektu: Obezbjeđenje proticajnog profila korita rijeke Spreče u Gradu Gračanica, MZ Gračanica na lokaciji od mosta za Sočkovac do bazena Terme u dužini od 980 m; Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektu: Obezbjeđenje proticajnog profila rijeke Bosne na lokalitetu Malešići na potezu između mosta na regionalnoj cesti dionica Donja Vogošća – Malešići, Općina Ilijaš – nastavak započetih radova; Vršenje usluga nadzora

nad izvođenjem radova na projektu: Obezbjeđenje proticajnog profila korita rijeke Spreče u Gradu Gračanica, MZ Pribava na lokaciji Jasenovac - Prijedor u dužini 550 m; Nadzor nad vađenjem materijala iz vodotoka u Zenici (2 lokacije); Nadzor nad vađenjem materijala iz vodotoka u Zavidovićima (6 lokacija).

C.2.29. Zaštita zemljišta na Velikoj otoci u Ripču

Aktima broj 04/2-21-5068/24 od 27.9.2024. godine i broj 04/2-21-2466/24 od 29.5.2025. godine Grad Bihać je kandidovao izvođenje radova za projekat „Zaštita zemljišta na Velikoj otoci u Ripču", u kojima se navodi da je Grad Bihać za navedeni projekat pribavio akte o građenju, čime su se stekli uslovi za izvođenje radova za realizaciju istog. Naime, na lokaciji Velike otoke u Ripču, na mjestu gdje se nalazi stara otočka džamija i mezarje, najveći problem predstavlja urušavanje obale usljed erozionog djelovanja rijeke Une, pri čemu se svake godine odroni dio zemljišta, čime se ugrožava prostor mezarja, džamije kao i slap rijeke Une na ovoj lokaciji. Zemljište se nalazi na parceli k.č.br. 1408/1 (lokacija 1 dužine 50 m) i k.č.br. 1422/2 (lokacija 2 dužine 10 m), K.O. Ripač, i u vlasništvu je Islamske zajednice u BiH. Realizacijom ovog projekta bi se postigla zaštita obale od erozije i urušavanja, a time obezbijedila i sigurnost od urušavanja lokalnog mezarja, stare otočke džamije i slapa rijeke Une koji se nalaze u obuhvatu Nacionalnog spomenika Velike otoke u Ripču. Radovi su ugovoreni krajem oktobra 2025. godine u iznosu od 98.857,39 KM. Procjenjuje se da će svi radovi biti okončani u ugovorenom roku (90 radnih dana od uvođenja u posao).

C.2.30. Obezbjeđenje proticajnog profila korita rijeke Spreče u Gradu Gračanica, MZ Pribava na lokaciji Jasenovac – Prijedor u dužini od 550 m (zajedno sa stavkom B.2.2.16.)

Obrazloženje ove stavke je dato uz obrazloženje stavke B.2.2.16.

Troškovi za kamate (ekonomski kod 616000)

Troškovi za kamate po osnovu kredita u 2025. godini u ukupnom iznosu iznosili su 13.133,54 KM. U pitanju su kamate na kredit kod Svjetske banke su uplaćene u ukupnom iznosu od 13.133,54 KM. Krediti su detaljnjije obrazloženi u tački Otplata kredita (ekonomski kod 823000).

Tekuća rezerva (ekonomski kod 617000)

Sredstva rezerve korištena su za pokriće neplaniranih troškova električne energije za rad crpnih stanica na poplavnim područjima. Naime, početkom mjeseca marta 2025. godine došlo do značajnih padavina na cjelokupnom vodnom području rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine, što je prouzrokovalo znatno povećanje vodostaja rijeke Save. Povišeni vodostaji su trajali duži vremenski period, usljed čega je bilo neophodno kontinuirano i dugotrajno angažovanje crpnih stanica, što je rezultiralo značajnim povećanjem utroška električne energije i stvaranjem neplaniranih troškova na stavci ˝Izdaci za električnu energiju crpnih i vodomjernih stanica˝. Imajući u vidu da su nastale okolnosti objektivno uzrokovane elementarnim nepogodama, da su imale obilježje hitnosti i nepredvidivosti, te da je kontinuiran rad crpnih stanica bio nužan radi provođenja mjera aktivne odbrane od poplava i zaštite vodnog područja, ispunjeni su uslovi definisani članom II alineja 3. („hitne intervencije odbrane od poplava, klizišta i sl.") Odluke Upravnog odbora broj: 50-857-3/21 od 25.08.2021. godine, o aktiviranju sredstava tekuće rezerve za finansiranje navedene intervencije u

ukupnom iznosu od 112.498,73 KM. Izmjenama i dopunama Plana i Finansijskog plana za 2025. godinu, sa povećanjem planiranih sredstava na ekonomskom kodu 6132112, troškovi ostvareni na ekonomskom kodu 617000 Rezerva su preknjiženi na ekonomski kod 6132112, čime su sredstva Rezerve oslobođena od ovih troškova.

Sredstva rezerve su odobrena, uz saglasnost Upravnog odbora,u ukupno iznosu 32.923,92 KM za sljedeće rashode:

- Rješenje o izvršenju Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0I 1134421 24 I od 18.12.2024. godine za prinudno izvršenje na ime naknade materijalne i nematrijalne štete, za Bešić Alena iz Kaknja, u iznosu od 12.068,05 KM.
- Uplata takse za prijavu potraživanja povjerioca stečajnom postupku na broj predmeta: 32 0 St 494441 25 St – KOKSARA doo Lukavac za proivodnju koksa, hemijskih proivoa i energije u iznosu od 10.000,00 KM.
- Po zahtjevu za povrat sredstava od strane Gradsko pravobranilaštvo Srebrenik, broj: 04-P-17/18 od 10.09.2025. godine kao osnov za solidarno dosuđen iznos iz presude Vrhovnog suda Federacije BiH broj: 30 0 P 069097 23 P 3 i 30 0 P 069097 24 Gž 2 Rev od 27.05.2025. godine, za tužitelja Savić Mihajla u iznosu od 6.986,10 KM
- Po Rješenju Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 Ps 1073321 24 Ps od 19.12.2025. godine, izvršena je uplata sudske takse na presudu u predmetu OK BAU u iznosu od 2.869,77 KM i
- Po pozivu za plaćanje takse od strane Općinskog suda u Sarajevu, broj: 65 0 lp 1198399 25 lp od 11.12.2025. godine na ime sudske takse na presudu u predmetu OK BAU u iznosu od 1.000,00 KM.

Izdaci za nabavku stalnih sredstava (ekonomski kod 821000)

821410 - Ostala stalna sredstva

Nabavka softvera i nadogradnja na postojeći HPLC sistem (LC-20AT) proizvođača Shimadzu u Laboratoriji za vode 3.123,90 KM sa PDV

Kako bi se omogućio nesmetan rad na HPLC instrumentu, potrebno je hitno nabaviti softver kompatibilan sa savremenim operativnim sistemima. Time bi se omogućilo ponovno funkcionisanje HPLC-a i nastavak obavljanja analiza prioritetnih parametara u skladu sa programom redovnog monitoringa.

Stalna sredstva-laboratorijska oprema

Nabavljen je novi fluoroscentni detektor kompatibilan sa postojećim HPLC sistemom proizvođača Shimadzu. Analize na navedenom instrumentu su od velikog značaja, na njemu se analiziraju uzorci na prisustvo ukupnog organskog ugljika (TOC) i ukupnog azota (TN), za potrebe redovnog monitoringa, ispitivanja tereta zagađenja, incidentnih zagađenja i sl. u iznosu od 34.686,58 sa uračunatim PDV-om.
Iz iste stavke nabavljeni su termometari i termohigrometar za provjeru u Laboratoriji za vode. u iznosu od - 5.827,51 KM sa uključenim PDV-om, kako bi se osiguralo da uvjeti okoline i oprema ne ugrožavaju rezultate ili nepovoljno utiču na zahtjevani kvalitet bilo kojeg mjerenja, potrebna je nabavka uređaja za praćenje temperature i vlažnosti u prostorijama i laboratorijskoj opremi.

Otplata kredita (ekonomski kod 823000)

Za otplatu dugoročnog kredita kod Svjetske banke u 2025. godini isplaćeno je ukupno 162.753,79 KM.

Kredit Svjetske banke odnosi se na dio iskorištenog kredita Svjetske banke od 20.000.000,00 US$ za finansiranje „Urgentnih radova na sanaciji vodovoda i kanalizacije u Federaciji BiH" u periodu od 1996. do 1998. godine. Dio iskorištenog kredita preuzelo je da vraća Javno preduzeće, pravni prethodnik AVP Sava. U pitanju je izuzetno povoljan kredit sa kamatom od 0,75% godišnje i rokom otplate od 35 godina uz odgodu plaćanja od 8 godina. Kredit je u US$, a anuiteti su polugodišnji. Dospijeće posljednjeg anuiteta predviđeno je za 01.10.2035. godine. Godišnja obaveza po ovom kreditu za 2025. godinu godinu je iznosila 162.753,79 KM.

V OSTALI PROJEKTI

AVP Sava učestvuje u realizaciji i drugih projekata, studija i strategija koji se finansiraju iz domaćih i međunarodnih sredstava. U slučajevima kada je potrebno predvidjeti lokalno učešće, predviđene su posebne stavke plana. Ako se za realizaciju projekta ne predviđa lokalno učešće, uposlenici AVP Sava učestvuju u realizaciji projekta u sklopu svojih redovnih obaveza, te se za ove projekte ne predviđaju posebna sredstva.

Projekti u kojima su u 2025. učestvovali uposlenici AVP Sava su: Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u Federaciji Bosne i Hercegovine-WATSAN (EIB); Modernizacija sektora vodnih usluga (Svjetska banka); Tehnička pomoć za sistem izvještavanja na prostoru cijele zemlje u vezi sa međunarodnim obavezama u oblasti okoliša/životne sredine (EEA, EIONET, EUROSTAT i međunarodnih konvencija) – (EU ENVIR); Unapređenje kvaliteta voda kroz istraživanje i mjere za upravljanje cvjetanjem mikroorganizama na akumulacijama Jablanica i Modrac u Federaciji Bosne i Hercegovine (Federalno ministartsvo okoliša i turizma); Globalni program za podršku razvoju planova finansiranja bioraznolikosti-BIOFIN (UNDP), Dugotrajno skladište i odlagalište radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj; Čista rijeka Miljacka; itd.

Učešće uposlenika AVP Sava u navedenim projektima ogleda se u sljedećim aktivnostima:

- pripreme projektnih prijedloga, projektnih zadataka, memoranduma o razumjevanju i drugih dokumenata koji se odnose na navedene projekte;
- aktivnog učešća u praćenju realizacije projekata kroz radionice, sastanke, davanje komentara i primjedbi na materijale dostavljenje od strane konsultanata i davanje završnih komentara o prihvatljivosti rezultata pojedinih projekata;
- priprema i davanje svih potrebnih podataka kojima raspolaže AVP Sava u cilju realizacije projekata;
- učešća u radu evalucionih komisija za provođenje postupaka nabavki i odabira izvođača po međunarodnim procedura (a sve prema pravilima pojednih finansijera-Svjetska banka; EC; UNDP; EIB...);
- ućešće u pribavljanju potrebne dokumentacije za početak građenja (eksproprijacija zemljišta, izdavanje vodnih akata, pribavljanje urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole);
- terenski obilazak i pomoć prilikom posjeta finansijera za pojedine projekte;
- praćenje realizacije radova i ovjera privremenih situacija za plaćanje.

<u>Projekat Evropske Investicione banke</u>

Ugovor o finansiranju iz sredstava EIB-a je potpisan avgusta 2008. godine između EIB-a, sa jedne strane, i Ministarstva finansija BiH, Federalnog ministarstva finansija i Federalnog

ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, sa druge strane. Ukupan budžet projekta Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH - WATER AND SANITATION FBIH (WATSAN FBiH) je procijenjen na 121.300.000 EUR, od čega je iznos od 60.000.000 EUR predviđen kao kredit EIB-a. Do sada su uz finansiranje EIB-a, obezbjeđena sredstva iz sljedećih fondova: IPF - MW 2008, IPA 2009, IPA 2018, Švedska agencija SIDA, WBIF, Federalni fond za zaštitu okoliša, kantonalna i općinska sredstva.
Općine sa sliva rijeke Save uključene u projekat WATSAN FBiH su: Bosanski Petrovac, Bosanska Krupa, Velika Kladuša, Orašje, Gračanica, Lukavac, Usora, Doboj Jug, Tešanj, Jajce i Gornji Vakuf-Uskoplje. Jedinica za upravljanje projektom (PMU) je formirana u okviru Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a AVP Sava je uključena u realizaciju projekta sa zadacima definisanim posebnim dokumentima. Jedan uposlenik AVP Sava je stalni član PMU-a, kao koordinator, a oformljen je i tim u AVP Sava za realizaciju ovog projekta. Uposlenici AVP Sava učestvuju na redovnim mjesečnim koordinacionim sastancima i svim drugim (sa PMU, Centralni nadzor, itd.), koordiniraju sa općinskim timovima za implementaciju u vezi sa svim tehničkim pitanjima - priprema projektnih sažetaka; priprema, pregled i odobravanje tenderske dokumentacije; evaluacija ponuda; praćenje radova; odobravanje privremenih situacija i varijacionih naloga, itd. Projekat je trebao biti završen do 31.12.2023. godine, ali zbog neoperativnosti odobrenih grant sredstava (IPA 2018 i WBIF), problema sa produženjem ugovora Centralnog nadzora i drugih problema koji su zbog toga generirani, kasnilo se sa završetkom radova zbog čega je Zaključkom Vlade Federacije BiH od 22.01.2024. zaduženo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da uputi zahtjev EIB-u za produženje WATSAN FBiH projekta do 30.06.2025. godine. Zahtjev za produženje WATSAN FBiH projekta do 30.06.2025. godine nije administrativno obrađen od strane EIB-a jer je taj datum prestao biti aktualan u jesen 2024. godine zbog toga što se kasnilo u potpisivanju Ugovora sa Centralnim nadzorom. S ozbirom na obustavu radova, pojavu dodatnih potraživanja izvođača radova, te u vezi s time i procjenu mogućeg završetka svih započetih radova, FMPVŠ je pripremilo informaciju za Vladu Federacije BiH o potrebi da se uputi zahtijev EIB-u za produženjem WATSAN FBiH projekta do 30.06.2026. godine. Zaključkom Vlade Federacije BiH od 13.03.2025. godine usvojena je informacija o produženju WATSAN FBiH projekta do 30.06.2026. godine, zaduženo FMPVŠ da uputi Zahtjev EIB-u i da izvrši produženje ugovora sa Centralnim nadzorom. Od EIB-a je dobivena saglasnost na produženje, te je 10.12.2025. godine Vlada Federacije BiH donijela Odluku o davanju saglasnosti na ugovor o izmjenama ugovornog sporazuma o Centralnom nadzoru, kojom se daje ovlaštenje ministru FMPVŠ da potpiše produženje ugovora sa Centralnim nadzorom do 30.06.2026. godine.

Modernizacija sektora vodnih usluga

Cilj ovog projekta je pružanje podrške daljem jačanju operativne učinkovitosti i finansijskog upravljanja JKP/JVP u odabranim Jedinicama lokalne samouprave (JLS), kako bi se partnerskim JLS omogućilo ispunjavanje obaveza u pružanju vodnih usluga njihovim građanima.
Projekat je podržan kreditnim finansiranjem od Svjetske banke i usklađen sa postojećim projektima i raspoloživim finansijskim izvorima drugih međunarodnih finansijskih institucija i bilateralnih donatora. Sredstva zajma za ovaj projekat za Federaciju iznose do 25 miliona eura od ukupno 51,5 miliona eura odobrenih za BiH. Period otplate je 32 godine uz grejs period od 7 godina, koji je uključen u rok otplate. Inicijalna sredstva granta za ovaj projekat za Federaciju iznose 1.150.000,00 američkih dolara. Vrijednost kredita za koji se općina/grad zadužuje može iznositi 100% od vrijednosti investicije.

Projekat se sastoji od 3 komponente, i to:
-Komponenta 1: Poboljšanje institucionalnih kapaciteta za modernizaciju sektora (1,9 miliona US$, koje će se sufinansirati iz kredita IBRD-a i SECO granta).
-Komponenta 2: Podrška poboljšanom upravljanju i kapacitetu sektora vodnih usluga na lokalnom nivou (1,4 miliona USD, finansiraće se iz SECO granta). Ova komponenta ima za cilj jačanje lokalnog okvira za pružanje vodnih usluga i njegovo usklađivanje sa institucionalnim i regulatornim okvirom koji će biti postavljen na entitetskom nivou kako bi se maksimizirao uticaj procesa reforme.
-Komponenta 3: Poboljšanje pristupa kvalitetno upravljanje vodovodnim uslugama i efikasnost pružaoca usluga (35,73 miliona USD, koje će se sufinansirati iz IBRD zajma i SECO granta). Ova komponenta će finansirati investicione radove prema klasifikaciji učinka vodovodnih preduzeća i potrebama identifikovanim u njihovim poslovnim planovima pripremljenim u okviru komponente 2.
Općine/gradovi koji su iskazali interes za učešće na ovom projektu, a prostorno se nalaze na slivu rijeke Save u FBiH su: Općina Bužim, Grad Lukavac, Općina Olovo, Općina Kakanj, Općina Kiseljak, Općina Maglaj, Općina Hadžići , Općina Ilijaš, Općina Kalesija, Grad Srebrenik, Grad Bosanska Krupa, Općina Žepče, Općina Drvar, Grad Goražde, Grad Bihać, Općina Sanski Most, Općina Teočak.
Općine koje su nastavile sa projektom su Općina Kalesija, Općina Žepče, Grad Srebrenik, Općina Sanski Most. Projektu se naknadno priključio i Grad Zenica.
Dva uposlenika AVP Sava su članovi Jedinice za implementaciju projekta (PIU) koja je u konstantnoj komunikaciji sa predstavnicima IBRD-a, Federalnog ministarstva finansija i predstavnika JKP/JVP.

<u>Globalni program za podršku razvoju planova finansiranja bioraznolikosti-BIOFIN</u>
Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH, u 2024. godini, je započeo sa implementacijom novog trogodišnjeg projekta, finansiranog od strane Globalnog fonda za okoliš (GEF). Riječ je o Globalnom programu za podršku razvoju planova finansiranja bioraznolikosti (BIOFIN) kroz koji će se u Bosni i Hercegovini raditi na izradi finansijskih planova za zaštitu biodiverziteta. BIOFIN Projekat ima za cilj da podrži globalni program finansiranja zaštite biodiverziteta u svim zemljama koje učestvuju, uključujući sve relevantne institucije te privatni i finansijski sektor kroz socijalno i rodno uključiv pristup. Da bi se to realizovalo, projektom će se podržati zemlje u identifikaciji trenutnog stanja, jačanju kapaciteta i institucionalnom jačanju te razvoju finansijskih planova za mobilizaciju sredstava i provedbu Globalnog okvira za biodiverzitet. Pored Bosne i Hercegovine, među 91 zemljom svijeta, u iz Regiona su uključene Albanija, Crna Gora, Srbija i Sjeverna Makedonija.
Projekat se implementira u bliskoj saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvom okoliša i turizma Federacije BiH, Ministarstvom finansija Federacije BiH, Ministarstvom prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske, Ministarstvom finansija Republike Srpske, Ministarstvom trgovine i turizma Republike Srpske, Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.
Osim ovih institucija, Projekat aktivno sarađuje sa relevantnim vladinim, nevladinim institucijama i privatnim sektorom iz finansijskog i sektora zaštite okoliša, predstavnicima visokoškolskih ustanova, lokalnom samoupravom.
Riječ je o prvoj ovakvoj inicijativi koju provodi UNDP u BiH i kroz koju se podržava i promoviše multisektorski pristup u očuvanju biodiverziteta i nameće neophodna saradnju među institucijama iz sektora finansija i zaštite okoliša.

Finansijski planovi za zaštitu biodiverziteta će biti pripremljeni na osnovu detaljne procjene političkog okvira i institucionalnog konteksta, te procjene ulaganja u biodiverzitet i finansijskih potreba, i ocijene efikasnosti implementacije relevantnih finansijskih planova. Kroz ovaj proces će se nastojati unaprijediti proces finansiranja zaštite prirode i biodiverziteta kroz učesnički pristup i uključenost svih relevantnih aktera.
U 2025. godini pripremljen je dokument Pregled politika i institucija (Policy and Institutional Review – PIR. U sljedećoj fazi planirana je izrada dokumenta Pregled rashoda za biodiverzitet (Biodiversity Expenditure Review – BER).

Unapređenje kvaliteta voda kroz istraživanje i mjere za upravljanje cvjetanjem mikroorganizama na akumulacijama Jablanica i Modrac u Federaciji Bosne i Hercegovine
REC u suradnji sa projektnim partnerima implementira projekat "Unapređenje kvaliteta voda kroz istraživanje i mjere za upravljanje cvjetanjem mikroorganizama na akumulacijama Jablanica i Modrac u Federaciji Bosne i Hercegovine", a koji finansijski podržava Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Glavni cilj projekta je uraditi analizu dostupnih informacija o pojavi cvjetanja i prisutnosti toksina u okviru monitoringa kvaliteta voda i aktivnosti vezanih za akumulacije/jezera Jablanica i Modrac, uz istovremenu sistematizaciju i objedinjavanje postojećih znanja, iskustava i dosadašnjih mjera koje su poduzeli relevantni akteri (ministarstva, agencije, zavodi, elektroprivreda i dr.) u vezi s ovim problemom i njegovim poznatim uzrocima. Projektni zadatak predviđa dvije faze. Prva faza, koju finansira FMOIT, obuhvata početna istraživanja koja će dati preporuke i inicirati konkretne mjere za sprječavanje daljeg pogoršanja jezerskih ekosistema. Fokus je na zaštiti kvalitete vode, smanjenju negativnog utjecaja ljudskih aktivnosti te unapređenju upravljanja vodnim resursima. Druga faza uključuje implementaciju predloženih mjera, praćenje efekata, izradu dugoročnih strategija, edukaciju lokalnih zajednica i jačanje kapaciteta institucija s ciljem trajnog rješenja problema cvjetanja jezera.

Tehnička pomoć za sistem izvještavanja na prostoru cijele zemlje u vezi sa međunarodnim obavezama u oblasti okoliša/životne sredine (EEA, EIONET, EUROSTAT i međunarodnih konvencija) – (EU ENVIR)
Projekat je finansiran od strane Evropske Unije i zvanično je počeo sa radom 02. septembra 2024. godine i traje do 01. maja 2027. godine. EU ENVIR projekat sprovodi njemačka organizacija za međunarodnu saradnju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH sa lokalnim partnerom ENOVA. Cilj projekta je tehnička pomoć usmjerena na unapređenje spremnosti Bosne i Hercegovine za provođenje izvještavanja u oblasti okoliša u skladu sa zahtijevanim standardima kvaliteta i propisanom metodologijom, kroz osiguravanje pune funkcionalnosti sistema izvještavanja o okolišu u vezi s međunarodnim obavezama.
AVP Sava je prepoznata kao jedan od značajnih korisnika projekta i ima značajnu ulogu u implementaciji projekta.

Dugotrajno skladište i odlagalište radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj
U 2025. godini za potrebe projekta Trgovska gora, Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo nastavila je sa provođenjem operativnog monitoringa na mjernom mjestu BA_UNA_2C*- Una – nizv. od Bosanske Krupe.
U 2025. godini monitoring je rađen frekvencijom od 12 (dvanaest) puta.
U februaru mjesecu 2025. godine na inicijativu Federalnog ministrstva okoliša i turizma te Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona

organizovani su okrugli stolovi u Bihaću i Bosanskoj Krupi koji su imali za cilj informisanje predstavnika javnog i društvenog sektora te udruženja građana o mogućim posljedicama i opasnostima izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na području Trgovske gore. Predstavnici Agencije prisutnima su se obratili kratkom prezentacijom u kojoj su predstavili dosadašnje kao i planirane aktivnosti u ovom projektu.
Početkom decembra mjeseca 2025. godine, na zahtjev Ekspertnog tima za Trgovsku goru, predstavnici Agencije zajedno sa ostalim federalnim institucijama učestvovali su u pripremi informacije za implementacioni komitet Espoo Konvencije na kojem su prikazane dosadašnje aktivnosti BiH po pitanju problematike Trgovska gora.

Obaveze koje proizilaze iz aktivnosti EU integracija
Uposlenici AVP Sava su u 2025. godini, kao što su to činili i do sada, učestvovali u aktivnostima podrške usvajanju strateških dokumenata, politika i planova iz oblasti voda na nivou Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine koji proizilaze iz aktivnosti EU integracija.
U skladu s Odlukom o usvajanju Metodologije izrade Programa integrisanja BiH u EU kojom se propisuju obaveze federalnih organa uprave, federalnih upravnih organizacija i drugih federalnih institucija u kontekstu planiranja, izrade, implementacije, praćenja i izvještavanja u okviru Programa integrisanja BiH u EU, izvršen je uvid i ažuriranje članstva u radnim grupama za evropske integracije. Predstavnik AVP Sava, u Radnoj grupi 27 (Okoliš i klimatske promjene), je ostao nepomijenjen.
Urađena je Studija koja obuhvata regionalno istraživanje o mogućnostima ubrzane integracije (accelerated integration) koje se radilo u okviru projekta „Regional Cooperation for EU-Integration" koje je u ime Vlade Savezne Republike Njemačke proveo GiZ. Ova studija bi trebala poslužiti u budućim planovima o mogućnostima sudjelovanja u ubrzanoj integraciji kao konceptu koji je EU uvela radi kvalitetnije pripreme za članstvo u EU.
Predstavnik AVP Sava je učestvovao na dvije konferencije u vezi Strategije EU za Dunavsku regiju (EUSDR). Prvi Nacionalni dan učešća u Bosni i Hercegovini održan je 13. maja 2025. u Sarajevu. Događaj je okupio predstavnike civilnog društva i lokalnog nivoa, naglašavajući njihovu ključnu ulogu u procesu pristupanja EU. Poseban fokus bio je na Strategiji EU za Dunavsku regiju i njenoj podršci Bosni i Hercegovini na putu ka članstvu. 12. Dunavski dan učešća (Danube Participation Day) je održan 4. novembra 2025. godine u Sarajevu, kao zvanični prateći događaj 14. Godišnjeg foruma Strategije EU za dunavsku regiju, sa fokusom na temu: „Lokalni glasovi, evropska budućnost – ključna uloga lokalne zajednice u oblikovanju politika EU i procesu proširenja".
Evropska komisija je usvojila jedan višegodišnji Akcioni dokument za BiH IPA 2025-2027, u sklopu svoje Odluke o finansiranju višegodišnjeg akcionog plana za zapadni Balkan za IPA 2025-2027. Usvojeni Akcioni dokument je fleksibilni dokument i sumira ključne elemente pripremljenih Akcionih fišea. Akcioni fišei su primarni planski dokumenti koji pružaju detaljnije obrazloženje i informacije o planiranim Akcijama i koristiće se za praćenje postizanja rezultata pomoći. U skladu sa svojim novim pristupom programiranju IPA 2025-2027, Evropska komisija je dostavila finalne verzije Akcionih fišea, uz pokretanje dodatnog procesa završnog pregleda i potvrde IPA 2026 Akcija/Akcionih fišea za Bosnu i Hercegovinu. Akcije koje su potvrđene za IPA 2026 su: AF EU4 Sustainable Agriculture, Food and Fisheries i AF EU Integration Facility. Akcija koja se odnosi na životnu sredinu i klimatske promjene (Environment and Climate Change) planirana je za 2027. godinu, i biće predmet pregleda tek u 2026. godini.
Uposlenici AVP Sava su učestvovali u obukama sa različitom tematikom u organizaciji Direkcije za evropske integracije (Vještine izvještavanja za potrebe procesa evropskih integracija, Pregovaranje u procesu pristupanja EU, Metode, načini i tehnike usklađivanja zakonodavstva,

Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije i Programi teritorijalne saradnje), u svrhu sticanja neophodnih znanja u procesu pristupanja BiH Evropskoj Uniji.
U izradi ažurirane Jedinstvene liste sektorskih infrastrukturnih projekata (SSPP) za sektor okoliša BiH uposlenici AVP Sava su dali značajan doprinos.
Kordinator za TAIEX instrument pomoći EU (Tehnička pomoć i razmjena informacija) ispred AVP Sava je pratio aktivnosti iz segmenta voda. Direkcija za evropske integracije BiH je preko Ureda za zakonodavstvo Vlade Federacije BiH kao federalnog koordinatora za TAIEX aktivnosti obezbijedila učešće predstavnika AVP Sava na tematskim obukama, kao što je u maju 2025. godine bila „Radionica o tačnosti i pouzdanosti podataka u vodnom sektoru - Talijanski slučaj", te u oktobru 2025. godine on-line prisustvo „TAIEX višekorisničkoj radionici o tehničkim i ekonomskim regulatornim instrumentima za gubitke vode i određivanje naknada u ENEST zemljama (zemljama proširenja i istočnog partnerstva)".

Projekti komunalne infrastrukture u BiH
Uposlenici AVP Sava su u 2025. godini učestvovali na radionicama i projektima koji tretiraju pitanje komunalne infrastukture u Bosni i Hercegovini. Učešće i informisanost AVP Sava o rezultatima i ciljevima ovih projekata neophodno je zbog, između ostalog, adekvatnog razvoja centralnog informacionog sistema voda u BiH u dijelu koji se odnosi na vodosnabdjevanje i odvodnju i aktivnostima koji proizilaze iz pripreme trećeg Plana upravljanja vodama.

Čista rijeka Miljacka
Stručna radna grupa za projekat „Čista rijeka Miljacka" imenovana je Rješenjem Gradonačelnika Sarajeva broj 01/04-19-4468-2/25 od 26.08.2025. godine, te izmjenama i dopunama utvrđenim Rješenjem Gradonačelnika broj 01/04-19-4468-3/25 od 09.09.2025. godine. Nakon imenovanja grupa je započela rad i u periodu od septembra do decembra 2025. godine održala pet sastanaka, i to 08.09.2025., 25.09.2025., 22.10.2025., 20.11.2025. i 19.12.2025. godine, uz realizaciju više konsultativnih sastanaka užih podgrupa u zavisnosti od tematskih cjelina.
Na prvom radnom sastanku od 25.09.2025. godine, koji je dokumentovan zapisnikom, potvrđeno je usvajanje poslovnika, razmotreni su početni dokumenti i doneseni zaključci o nastavku rada na osnovu ranije urađenih studija, spremnih analiza i Akcionog plana iz 2023. godine. Poseban naglasak stavljen je na nužnost razdvajanja fekalnih i oborinskih voda na riječnim slivovima, kao i na kontinuirano čišćenje i održavanje korita Miljacke i njenih pritoka. Zaključeno je da je „Čista rijeka Miljacka" projekat koji treba proglasiti od kantonalnog i federalnog značaja te uvrstiti u Program javnih investicija Federacije BiH. Također je potvrđena potreba formiranja podgrupa koje će voditi pojedinačne zadatke, uključujući ažuriranje Akcionog plana, kandidovanje projekta prema višim nivoima vlasti i pripremu tehničke dokumentacije.
Naredna tri sastanka, fokus je bio na prikupljanju podataka, sagledavanju postojećih kapaciteta, mapiranju slivnih područja i tehničkoj razradi prijedloga koji su kasnije objedinjeni u Informaciju Stručne radne grupe. Posebno je istaknuta složenost institucionalne nadležnosti nad projektom, jer Grad Sarajevo ima odgovornost za uređena korita, dok su kanalizacijski sistemi i tretman otpadnih voda u nadležnosti Kantona i javnih komunalnih preduzeća. Iz tog razloga, članovi grupe istakli su potrebu da se projektni pristup zasniva na jasnoj raspodjeli odgovornosti i definisanju partnerstva i mehanizama finansiranja.
Na posljednjem radnom sastanaku u 2025. godini pripremljena je i usvojena Informacija s prijedlogom narednih koraka i programom projekata za period 2026–2028. godine. Najveći

broj planiranih i nužnih intervencija odnosi se na upravljanje i tretman fekalnih otpadnih voda, što naglašava obavezu Kantona Sarajevo i javnih komunalnih preduzeća da budu nosioci većine implementacijskih zadataka. Na sastanku su definisani principi sadržaja Memoranduma o saradnji koji bi trebali zajednički potpisati Grad Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo i četiri gradske općine. Memorandum bi osigurao stratešku i finansijsku podršku realizaciji Projekta, te obavezao potpisnike da planiraju sredstva u svojim budžetima, kandiduju projekte u odgovarajuće programe javnih investicija i međusobno sarađuju u pripremi i realizaciji zadataka.
U 2025. godini Stručna radna grupa za projekat „Čista rijeka Miljacka" je napravila osnovu za otpočinjanje konkretnih aktivnosti u 2026. godini, što predstavlja završetak pripremne faze i ulazak projekta u fazu realizacije. Dogovoreno je da Stručna radna grupa nastavi aktivan rad na određivanju prioriteta za 2027–2028. godinu i dalje.

VI OSTALE INFORMACIJE O POSLOVANJU AVP SAVA

U ovom poglavlju izvještaja navode se još neke značajne informacije o poslovanju AVP Sava.

Novčana sredstva

Na dan 31.12.2025.godine, AVP Sava je raspolagala sljedećim novčanim sredstvima:

Transakcijski račun – Intesa Sanpaolo banka BiH Sarajevo	14.574.286,68 KM
Transakcijski račun – ASA banka d.d. Sarajevo	4.736.414,32 KM
Transakcijski račun – PBS banka d.d. Sarajevo	1.189.826,28 KM
Blagajna u KM	460,05 KM
Devizni račun – ASA banka d.d. Sarajevo	40.144,82 KM
U K U P N O	20.500.527,28 KM

Udjeli kod drugih pravnih lica

AVP Sava u imovini ima dionice u kapitalu kod drugih pravnih lica, i to:

R.br.	Naziv pravnog lica	Broj dionica	Nominalna vrijednost dionice	Procentualno učešće udječa u kapitalu	Vrijednost u KM
1.	Institut za hidrotehniku dd Sarajevo	1.613	30,00	21,59	48.390,00
2.	Zavod za vodoprivredu dd Sarajevo	193.531	10,00	43,34	1.935.310,00

Navedene udjele u kapitalu navedenih društava, AVP Sava je naslijedila od svojih pravnih prethodnika koji su učestvovali u predratnoj privatizaciji navedenih društava. U sistemu registracije Registra vrijednosnih papira Federacije BiH, na dan 31.12.2025. godine, AVP Sava je registrovana kao pravno lice koje je vlasnik vrijednosnih papira u navedena dva privredna društva, što ptvrđuje i potvrda o stanju računa broj: 02-466/26 izdata od Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Upravljanje zaštitnim vodnim objektima

Odlukom Vlade Federacije BiH broj: 274/2001 od 14.06.2001. godine Javnom preduzeću za ″Vodno područje slivova rijeke Save″ Sarajevo, preneseno je pravo upravljanja i korištenja zaštitnim vodoprivrednim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području općina: Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje i Gradačac. Kao pravni sljedbenik Javnog preduzeća za vodno područje slivova rijeke Save, AVP Sava je preuzela sve obaveze, prava i odgovornosti dobivene od Vlade Federacije BiH nad ovim objektima.
Vodoprivredni objekti za zaštitu od poplava su evidentirani u vanbilansne knjigovodstvene evidencije AVP Sava kao tuđa imovina, a to su :

- 67.525 m odbrambenih nasipa uz rijeku Savu,
- 7.800 m odbrambenih nasipa uz rijeku Bosnu,
- 6 pumpnih stanica,
- 4 obodna kanala ukupne dužine 21.217 m,
- 8 obaloutvrda na rijeci Savi ukupne dužine 8.177 m,
- 2 centara odbrane od poplava (Prud, Orašje),
- 7 čuvarskih kuća i
- 2 brane i akumulacije.

Ukupna vrijednost svih zaštitnih vodoprivrednih objekata sa 31.12.2025. godine iznosi:

Konto	Naziv objekata	Nabavna vrijednost u KM	Ispravka vrijednosti u KM	Sadašnja vrijednost u KM
09900	Odbrambeni nasipi	108.174.031,29	34.277.743,42	73.896.287,87
09901	Pumpne stanice	13.707.135,64	13.707.135,64	0,00
09902	Čuvarske kuće	1.665.987,40	456.754,12	1.209.233,28
099031	Oprema za č. k.Tolisa	16.171,74	16.171,74	0,00
099032	Oprema za č. k. Svilaj	3.334,50	3.334,50	0,00
099033	Oprema za č. k. Kopanice	947,70	947,70	0,00
099034	Oprema za č. k. Grebnice	690,30	690,30	0,00
099035	Oprema za č. k. Prud	514,80	514,80	0,00
099036	Oprema za č. k. Zorice	3.334,50	3.334,50	0,0
099037	Oprema za č. k. Novi Grad	23,40	23,40	0,00
		123.572.171,27	48.466.650,12	75.105.521,15

VII OSTALI POSLOVI I ZADACI AVP SAVA

Jedinica za internu reviziju Agencije za vodno područje rijeke Sava

Jedinica za internu reviziju Agencije za vodno područje rijeke Save tokom 2025. godine obavljala je svoje aktivnosti u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 47/08 i 101/16), važećom Metodologije rada interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj 20/23) i međunarodnim profesionalnim standardima. Osnovna svrha interne revizije je pružanje nezavisnog i objektivnog uvjerenja rukovodstvu o

tome da li su sistemi upravljanja, finansijskog upravljanja i kontrole te upravljanja rizicima uspostavljeni i funkcioniraju na način koji omogućava zakonito, efikasno i transparentno poslovanje Agencije.
Rad Jedinice odvijao se u okviru Strateškog plana interne revizije za period 2024–2026. godine i Godišnjeg plana interne revizije za 2025. godinu, koji su izrađeni na osnovu procjene rizika i strateških ciljeva Agencije. Tokom godine, nakon promjene rukovodstva Agencije, zaključena je nova Povelja interne revizije, čime je dodatno potvrđena institucionalna podrška radu interne revizije i njenom položaju u sistemu upravljanja i kontrole. Iako je normativni okvir interne revizije uspostavljen, rad Jedinice bio je značajno otežan ograničenim kadrovskim kapacitetima, s obzirom na to da poslove interne revizije obavlja samo jedan zaposleni, koji istovremeno vrši funkciju rukovodioca Jedinice. Posebno opterećenje predstavljalo je privremeno raspoređivanje rukovodioca Jedinice na poslove rukovođenja finansijsko-računovodstvenom službom tokom prvog kvartala 2025. godine, zbog čega u tom periodu nije bilo moguće provoditi planirane revizijske aktivnosti u punom obimu.
Uprkos navedenim okolnostima, tokom 2025. godine provedene su ključne revizijske i savjetodavne aktivnosti koje su imale značajan uticaj na unapređenje sistema upravljanja i kontrola. Posebno važna bila je revizija procesa vođenja Vodne knjige, kojom je utvrđeno da ovaj proces, iako ima izuzetno važnu pravnu i upravljačku ulogu u sistemu upravljanja vodama, nije dovoljno normativno uređen, da se ISV sistem ne koristi u punom kapacitetu, da evidencije nisu uvijek ažurne te da ne postoji sistematsko izvještavanje rukovodstvu. Uočeni su i problemi u arhiviranju dokumentacije, zaštiti ličnih podataka, neujednačenoj praksi između organizacionih jedinica i preopterećenosti zaposlenih. Date preporuke bile su usmjerene na donošenje cjelovitih internih procedura, standardizaciju rada, jačanje internih kontrola i unapređenje korištenja informacionih sistema.
Ad hoc revizija voznog parka pokazala je da Agencija raspolaže voznim parkom koji je u prosjeku star, sa povećanim troškovima održavanja i sigurnosnim rizicima. Postojeći interni akti zahtijevaju unapređenje kako bi se osigurao savremen i efikasan pristup upravljanju vozilima, a dugoročni plan obnove još nije uspostavljen.. Preporuke su bile usmjerene na donošenje novog pravilnika o korištenju službenih vozila, uvođenje jasnijih kriterija odgovornosti i kontrole, te izradu višegodišnjeg plana postepene zamjene vozila.
Revizija neokončanih postupaka javnih nabavki iz 2024. godine ukazala je na slabosti u planiranju, praćenju i koordinaciji između sektora, kao i na neusklađenost sa Planom javnih nabavki i finsnsijskim okvirom. Utvrđeno je da su brojni postupci pokretani sa zakašnjenjem, što je dovelo do njihovog prenosa u narednu godinu i povećanja finansijskih i pravnih rizika. Preporučeno je jačanje planiranja, redovno ažuriranje Plana javnih nabavki, kvartalno praćenje realizacije i ranije pokretanje složenih i sigurnosno osjetljivih nabavki.
Pored revizijskih aktivnosti, rukovodioc jedinice je aktivno učestvovala u jačanju integriteta i sistema interne kontrole, kroz procjenu rizika za radna mjesta u Jedinici za internu reviziju , ažuriranje Mape procesa i Registra rizika, djela koji se odnosi na Jedinicu za internu reviziju , te pružanje savjetodavnih usluga rukovodstvu.
Posebno značajan segment rada Jedinice u 2025. godini odnosio se na praćenje realizacije ranije datih revizorskih preporuka. Jedinica je uputila zvanične zahtjeve svim relevantnim organizacionim jedinicama radi dostavljanja informacija o statusu realizacije preporuka iz prethodnih revizija. Zaprimljeni odgovori analizirani su i korišteni za ažuriranje Registra preporuka i Registra rizika, čime je omogućeno objektivnije sagledavanje napretka i preostalih slabosti u sistemu internih kontrola. Praćenje je pokazalo da je dio preporuka realizovan, ali da značajan broj mjera i dalje nije u potpunosti proveden, što ukazuje na potrebu jačanja

odgovornosti rukovodilaca organizacionih jedinica i sistematičnijeg pristupa praćenju njihove implementacije.
U oblasti profesionalnog razvoja, kontinuirana edukacija je realizovana u skladu sa Godišnjim planom obuke, čime je osigurano održavanje i unapređenje stručnih kompetencija interne revizije. Kroz učešće u seminarima, stručnim skupovima i specijaliziranim obukama praćeni su savremeni trendovi i promjene u oblasti interne revizije, finansijskog upravljanja i kontrole, upravljanja rizicima i javne uprave.
Tokom završetka 2025. godine izvršene su izmjene i dopune Strateškog plana interne revizije, a izrađen je i usvojen Godišnji plan interne revizije za 2026. godinu, zajedno sa Planom obuke internih revizora. Plan za 2026. godinu zasniva se na ažuriranoj procjeni rizika i usmjeren je na najrizičnije i najznačajnije oblasti poslovanja Agencije, uključujući finansijsko upravljanje, javne nabavke, upravljanje imovinom, ključne operativne procese i praćenje realizacije ranije datih preporuka. Time je osiguran kontinuitet planskog i sistemskog pristupa radu interne revizije.
Najveći izazovi sa kojima se Jedinica suočavala tokom 2025. godine odnosili su se na nedovoljne kadrovske kapacitete, preopterećenost jedinog zaposlenog, privremeno prekidanje revizijskih aktivnosti u prvom kvartalu, kao i nedovoljno jasno definisan status i autoritet funkcije interne revizije u odnosu na ostale organizacione jedinice. Ovi faktori su uticali na brzinu i obim realizacije planiranih aktivnosti, ali nisu umanjili profesionalni integritet i kvalitet obavljenog rada.
U narednom periodu planirano je jačanje institucionalnog i organizacionog položaja Jedinice za internu reviziju kroz donošenje novog Pravilnika o internoj reviziji, popunjavanje sistematizovanih radnih mjesta, jačanje svijesti o ulozi interne revizije u Agenciji, unapređenje međusektorske saradnje i sistematičnije praćenje realizacije revizorskih preporuka. Posebna pažnja biće posvećena daljem stručnom usavršavanju i primjeni savremenih revizorskih alata i metoda.
Uprkos izraženim ograničenjima, Jedinica za internu reviziju je u 2025. godini dala vidljiv i profesionalno utemeljen doprinos unapređenju upravljanja, transparentnosti i odgovornosti u Agenciji za vodno područje rijeke Save. Dosljednom realizacijom datih preporuka i jačanjem institucionalnih kapaciteta interne revizije stvaraju se preduslovi za efikasnije, sigurnije i odgovornije upravljanje javnim resursima u narednom periodu.

Poslovi i aktivnosti Sektora za upravljanje vodama (Sektor 10)

Sektor za upravljanje vodama provodi čitav niz aktivnosti iz svih segmenata upravljanja vodama (zaštita voda, korištenje voda i zaštita od voda).
Kontinuirano, tokom čitave godine realizuju se aktivnosti na tekućem i investicionom održavanju zaštitnih vodnih objekata u vlasništvu Federacije BiH koji služe za zaštitu od voda ljudi i imovine na području općina Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje i Gradačac. Ovi objekti su Odlukom Vlade Federacije BiH (broj 274/2001 od 14.06.2001. godine) preneseni na korištenje i upravljanje Javnom preduzeću za "Vodno područje slivova rijeke Save", odnosno "Agenciji za vodno područje rijeke Save" Sarajevo kao pravnom sljedbeniku navedenog javnog preduzeća.
Objekti u vlasništvu Federacije BiH, kao osnovni objekti za dva sistema odbrane od poplava područja, sastoje se načelno od slijedećih objekata:

- nasipi uz vodotoke sa pratećim objektima prelaznih rampi, ustava, obaloutvrda i parapetnih zidova,

- objekata pumpnih stanica sa pratećim objektima glavnog dovodnog kanala i odvodnog kanala,
- obodnih kanala za prikupljanje brdskih voda i
- objekata Centra za odbranu od poplava (COP) i čuvarskih kuća.

Nakon usvajanja prvog Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2024-2029.) od strane Vlade Federacije BiH, otpočeo je II ciklus izrade ovog izuzetno značajnog dokumenta tj. njegovo ažuriranje. Kao prvi korak u tom pravcu potrebno je izvršiti ažuriranje Preliminarne procjene rizika od poplava. Ovo je ujedno i jedna od mjera definisana Planom upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2024-2029.).

U saradnji sa Sektorom 70 nastavljaju se i aktivnosti u cilju ispunjenja obaveza AVP Sava po članu 91. ZOV-a. U tom pravcu, pored redovnog praćenja i održavanja, dodatno će se razvijati i poboljšavati nacionalni sistem prognoze poplava za glavne podslivove na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, te aktivno učešće u radu regionalne platforme za prognozu poplava na slivu rijeke Save pod okriljem Savske komisije. Podaci prikupljeni sa mreže automatskih hidroloških i padavinskih stanica u nadležnosti AVP Sava će se pored SAVA HIS-a i SAVA GIS-a dostavljati i DANUBE HIS-u i DANUBE GIS-u kao i EFAS sistemu.

Sektor 10 zajedno sa sektorom 60 provodi aktivnosti po pitanju akcidentnih zagađenja u skladu sa Operativnim planom mjera AVP Sava u slučaju vanrednih i incidentnih zagađenja kao i akcidentnih zagađenja u skladu sa Federalnim operativnim planom za incidentna zagađenja III stepena ugroženosti.

Pored pobrojanih aktivnosti, Sektor za upravljanje vodama aktivno realizuje i sljedeće:
- učešće u pripremi i donošenju prijedloga pravilnika i drugih akata od značaja za upravljanje vodama;
- implementacija strategije upravljanja vodama i plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH;
- učešće u poslovima i zadacima vezanim za ispunjavanje obaveza po osnovu međunarodnih bilateralnih i multilateralnih sporazuma, ugovora i konvencija;
- učešće u radu međunarodnih komisija i stručnih tijela;
- provođenje mjere odbrane od poplava u skladu sa FOP-om;
- izrada stručnih mišljenja i dostava podataka u postupku izdavanja vodnih akata AVP Sava;
- izrada stručnih mišljenja u postupku izdavanja vodnih akata po zahtjevu nadležnih kantonalnih organa za izdavanje vodnih akata u postupku izdavanja vodnih akata iz njihove nadležnosti;
- izrada mišljenja iz domena upravljanja vodama na prostorno planske i strateške dokumente svih nivoa vlasti;
- izrada stručnih mišljenja u postupku izdavanja okolinskih dozvola;
- dostava podataka i dokumentacije kao i izrada stručnih mišljenja po zahtjevu u postupku koji provodi nadležni federalni ili kantonalni vodni ili okolišni inspektor;
- učešće u provođenju planova zaštite voda i intervencija u slučaju akcidentnih zagađenja voda;
- učešće u realizaciji projekata koji se odnose na upravljanje vodama finansiranih od strane međunarodnih finansijskih institucija;

- praćenje rezultata monitoringa zagađivača na vodnom području;
- evaluacija dokumentacije u vezi ekološki prihvatljivog protoka;
- provođenje postupka ustanovljenja ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra na vodotocima I kategorije;
- organizacija i praćenje realizacije aktivnosti na izradi Elaborata za određivanje granice vodnog dobra uz vodotokove I kategorije te davanje prijedloga FMPVŠ-u za donošenje rješenja o određivanju granica vodnog dobra uz vodotoke I kategorije, kao i rješavanje ove problematike po pojedinačnim zahtjevima;
- praćenje stanja nanosa i naplavina na vodotocima I kategorije te organizacija i provođenje postupaka za realizaciju uklanjanja nanosa i naplavina u svrhu održavanja protočnosti proticajnog profila kao i u svrhu održavanja prohodnosti kinete plovnog puta na rijecu Savi.

Poslovi i aktivnosti Sektora za strateško planiranje (Sektor 20)

Sektor za strateško planiranje, u saradnji sa ostalim sektorima, pripremio je Izvještaj o poslovanju AVP Sava za 2024. godinu, Izmjene i dopune Plana i Finansijskog plana za 2025. godinu, Izmjene i dopune Okvirnog Plana i Finansijskog plana 2024.-2026., Plan i Finansijski plan AVP Sava za 2026. godinu, te prema Odluci o procedurama i kriterijima za pripremu godišnjeg Plana i Finansijskog plana Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo i Metodologiju izrade Nacrta Plana i Finansijskog plana Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo za 2026. godinu.

U oktobru 2025. godine Sektor 20 je pripremio nove interne akte, i to: Odluku o procedurama i kriterijima za pripremu Okvirnog plana i Finansijskog plana, Odluku o procedurama i kriterijima za pripremu godišnjeg Plana i Finansijskog plana i Odluku o procedurama za pripremu Izvještaja o poslovanju ˝Agencije za vodno područje rijeke Save˝ Sarajevo.

Shodno stavu IV. Odluke o donošenju Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022–2027.), kojim je propisana obaveza institucija i pravnih lica zaduženih za provođenje Programa mjera da na zahtjev AVP Sava dostavljaju potrebne podatke i informacije, Sektor 20 je u decembru 2025. godine uputio dopise institucijama (njih 177) koje implementiraju Program mjera Plana upravljanja vodama 2022–2027. Na ovaj način započet je proces pripreme Izvještaja o implementaciji Programa mjera Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH za 2024. i 2025. godinu.

U maju 2025. godine Sektor za strateško planiranje je pripremio i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove dostavio Informacije iz Plana upravljanja vodama na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH (2022–2027.), u skladu sa mjerom 1.2.1. „Intenziviranje saradnje sektora voda s ostalim sektorima u cilju osiguravanja zaštite i održivog korištenja vodnih resursa", tačka b1), Strategije upravljanja vodama Federacije BiH 2022–2032.

Sektor 20 je nastavio sa implementacijom Programa mjera Plana upravljanja vodama 2022-2027. iz svoje nadležnosti, realizacijom projekta Ihtiološka istraživanja na slivu rijeke Save u Federaciji BiH u 2025. godini, te finalizirajući Studiju procjene tereta zagađenja vodnih resursa koja potiču sa deponija krutog otpada na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH i

Ažuriranje Studije hidromorfoloških pritisaka i procjene njihovih uticaja za vodotoke preko 10 km^2 površine sliva na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

Također, Sektor 20 je proveo kompletnu proceduru javne nabavke za projekat „Ažuriranje Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022–2027.)", uključujući pripremu tenderske dokumentacije, provođenje postupka nabavke i izbor najpovoljnijeg ponuđača. Ugovor sa konsultantom je potpisan 28.7.2025. godine. Formirana je komisija za praćenje realizacije projekta od 18 članova, sa predstvnicima svih sektora Agencije, uključujući sve uposlenike Sektora 20. Time su stvoreni uslovi za početak aktivnosti na ažuriranju planskog dokumenta, u skladu sa važećim zakonskim propisima i rokovima, strateškim ciljevima upravljanja vodama i obavezama Federacije BiH u oblasti upravljanja vodnim resursima. Početni izvještaj usvojen je u septembru 2025. godine, dok je nacrt prvog Izvještaja o napretku realizacije ugovora dostavljen početkom decembra. Polovinom decembra 2025. godine dostavljen je i prvi nacrt dokumenta ˝Značajna pitanja upravljanja vodama˝. Pregledom ovih dokumenata i davanjem stručnih komentara, Sektor 20 je ostvario značajan doprinos unapređenju njihove kvalitete i cjelokupne izrade.

Uposlenici Sektora 20 su aktivno učestvovali u pripremi procjene uticaja propisa za Zakon o vodama, pripremi Operativnog plana mjera u slučaju incidentnih zagađenja I i II stepena na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, zatim pripremi komentara, mišljenja i stručnih doprinosa za: Nacrt dokumenta (radna verzija) Stručno obrazloženje za zaštitu pejzaža Plive, Plan upravljanja NP Una, Nacrt Studije valorizacije za zaštitu šireg toka rijeke Kruščice, Prednacrt odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište Zeleni vir, Prednacrt Regulacionog plana Ustikolina 1, Provođenje strateške procjene uticaja na okoliš za Plan upravljanja otpadom Zeničko-dobojskog kantona, pripremi Studije o sedimentu, vodi i bioti u slivu rijeke Save, Nacrt Prostornog plana Tuzlanskog kantona za period 2025.-2045., Plan upravljanja invazivnom vrstom smuđ sa Akcionim planom za suzbijanje i širenje invazivne vrste u FBiH, Plan upravljanja invazivnom stranom vrstom pajasen sa Akcionim planom za suzbijanje i širenje invazivne vrste u FBiH, Odluku o sadržaju i obimu strateške studije utjecaja na okoliš Plana upravljanja otpadom Federacije Bosne i Hercegovine za period 2025. – 2030. godine, Projekat izgradnje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Olovske Luke (350 EBS), na rijeci Stupčanici, Prethodna procjena uticaja na okoliš, studija uticaja na životnu sredinu sa Planom upravljanja otpadom za projekat izgradnje male hidroelektrane (MHE) „NEVAČKA" na rijeci Stupčanici, Opština Han Pijesak, Republika Srpska, Nacrt Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, Nacrte odluka u vezi sa Direktivom o divljim pticama, Direktivom o staništima, kao i direktivama iz oblasti upravljanja vodama, koje se planiraju ugraditi u odredbe Ugovora o osnivanju Energetske zajednice (član 16. i Aneks 2), Strategiju prilagođavanja klimatskim promjenama za sliv rijeke Save, Studiju o ekološkoj evaluaciji rijeke Bosne analizom makroinvertebrata bentosa na području Grada Zenice, Nacrt Pravilnika o uslovima i kriterijima koje moraju zadovoljiti ovlaštena pravna lica za obavljanje stručno-tehničkih poslova iz nadležnosti Agencije za vode i načinu izdavanja ovlaštenja i prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje, i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada, Nacrt Zakona i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.

Sektor 20 je, za potrebe izrade Izvještaja Revizije učinka ˝Praćenje realizacije preporuka iz Izvještaja revizije učinka ˝Zaštita Rijeka u Federaciji BiH˝, pripremio sveobuhvatne i detaljne

odgovore na dostavljene upitnike o postupanju po preporukama. U okviru ove aktivnosti prikupljene su, obrađene i sistematizirane relevantne informacije iz djelokruga rada Sektora 20, s ciljem pružanja tačnog i potpunog uvida u stepen realizacije datih preporuka, preduzete mjere i ostvarene rezultate, kao i uočene izazove u procesu njihove provedbe.

Sektor 20 je za potrebe izrade FUK pripremio pet procedura, od toga dvije nove: Odluku o procedurama za pripremu dvogodišnjeg Izvještaja o implementaciji programa mjera Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH i Odluku o proceduri pripreme Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH, i definisao rizike i mjere za pet procedura iz svoje nadležnosti.

U saradnji sa sektorima 10 i 60, Sektor za strateško planiranje je učestvovao u pripremi Plana monitoringa stanja voda na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH u 2026. godini.

Uposlenici Sektora za strateško planiranje, u saradnji sa uposlenicima drugih sektora, aktivno učestvuju, kao članovi jedinice za upravljanje projektom formiranih od strane FMPVŠ, u realizaciji projekta ˝Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH˝ (WATSAN FBiH) sufinansiranog od strane Evropske investicijske banke, kao i projekta Modernizacija vodnih i sanitarnih usluga u Bosni i Hercegovini koji finansira Svjetska banka.

Uposlenici Sektora 20 su nominirani članovi stručnih i radnih grupa ICPDR-a i Savske komisije te kontinuirano obavljaju zadatke prema dogovorenom programu rada.

Uposlenici Sektora za strateško planiranje učestvuju u projektima koji tretiraju pitanje komunalne infrastukture u Bosni i Hercegovini.

Uposlenici Sektora 20 aktivno su učestvovali u aktivnostima koje proizilaze iz aktivnosti EU integracija. U skladu s Odlukom o usvajanju Metodologije izrade Programa integrisanja BiH u EU kojom se propisuju obaveze federalnih organa uprave, federalnih upravnih organizacija i drugih federalnih institucija u kontekstu planiranja, izrade, implementacije, praćenja i izvještavanja u okviru Programa integrisanja BiH u EU, izvršen je uvid i ažuriranje članstva u radnim grupama za evropske integracije. Predstavnik AVP Sava iz Sektora 20, u Radnoj grupi 27 (Okoliš), je ostao nepomijenjen.
Predstavnik AVP Sava iz Sektora 20 je učestvovao na dvije konferencije u vezi Strategije EU za Dunavsku regiju (EUSDR).
Uposlenici Sektora 20 su učestvovali u izradi ažurirane Jedinstvene liste sektorskih infrastrukturnih projekata (SSPP) za sektor okoliša BiH.

Uposlenici Sektora 20 su učestvovali u obukama sa različitom tematikom u organizaciji Agencije za državnu službu FBiH i Direkcije za evropske integracije, u svrhu sticanja neophodnih znanja za proces pristupanja BiH Evropskoj Uniji, te edukacijama u okviru projekata: Interreg Water Balance, Interreg Danube Sediment_Q2, MISSION4WATER, Become a River Cleanup Coordinator!, EU4Green (radni paket 1-4 Monitoring voda), Zelena agenda Zapadnog Balkana – Podrška zemljama Zapadnog Balkana u prilagođavanju klimatskim promjenama, CleanSeaNet (CSN - satelitski sistem za praćenje izlijevanja nafte na moru i nadzor u europskim vodama, Mapping the Danube Region: Regional Insights into Wastewater and Stormwater Challenges in Small Settlements, NaturaConnect webinar "The Road Ahead: Financing Nature Conservation in the Danube-Carpathians", Obuka za

predstavnike sektora zaštite prirode/biodiverziteta u oblastima procjene rizika u zakonodavstvu, OPTAIN Stakeholder Conference, Linking Blue and Green Infrastructure in the Danube-Carpathians: Prioritising Rivers, Wetlands, and Landscapes: An Integrated Connectivity Approach, Climate Change: Challenges in Agriculture and Water Sectors, Kvalitet vode i upravljanje otpadnim vodama: problemi, izazovi i metode prečišćavanja, Integrisanje prilagođavanja klimatskim promjenama u poljoprivredne politike u okviru projekta „Zelena agenda Zapadnog Balkana – Podrška zemljama Zapadnog Balkana u prilagođavanju klimatskim promjenama", Water governance, economics & policy, Development of capacities for sustainable water supply and waste water management in the Mediterranean countries of the Balkan region, Efikasna vodna infrastruktura otporna na klimatske promjene, Creating circularity in wastewater treatment.
Uposlenici sektora 20 učestvuju u Projektu finansiranom od strane Evropske Unije „Tehnička pomoć za sistem izvještavanja na prostoru BiH u vezi sa međunarodnim obavezama u oblasti okoliša/životne sredine (EEA, EIONET, EUROSTAT i međunarodnih konvencija) - (EU ENVIR). Ispred Sektora 20 je imenovana osoba za praćenje aktivnosti vezano za implementaciju EAS-a BiH (Strategija aproksimacije okoliša), te je u 2025. godini dat doprinos na izradi Okvirnog plana praćenja implementacije EAS-a BiH.

U 2025. godini uposlenici Sektora 20 su učestvovali u izradi vodnih akata, kao ispomoć Sektoru za izdavanje vodnih akata, te u komisijama imenovanim od strane v.d. direktora i Upravnog odbora Agencije za prijem novih uposlenika i izbor direktora.

Uposlenica Sektora 20 je ispred Agencije je koordinator za evropske integracije i PIMIS (Informacioni sistem za upravljanje javnim investicijama).

Kordinator za TAIEX instrument pomoći EU (Tehnička pomoć i razmjena informacija) u Sektoru 20 prati aktivnosti iz segmenta voda, te uposlenici učestvuju u tematskim obukama, kao što je u maju 2025. godine bila Radionica o tačnosti i pouzdanosti podataka u vodnom sektoru - Talijanski slučaj, te u oktobru 2025. godine on-line prisustvo TAIEX višekorisničkoj radionici o tehničkim i ekonomskim regulatornim instrumentima za gubitke vode i određivanje naknada u ENEST zemljama (zemljama proširenja i istočnog partnerstva) koja je održana u Skoplju.

Uposlenik Sektora 20 je član Radne grupe za izradu Projektnog zadatka za izradu glavnog projekta za izgradnju brane Crna rijeka i priprema Plana aktivnosti za uvođenje novih količina pitke vode u sarajevski vodovodni sistem.

Uposlenici Sektora 20 su članovi interresornog stručnog tima projekta Unapređenje kvaliteta voda kroz istraživanje i mjere za upravljanje cvjetanjem mikroorganizama na akumulacijama Jablanica i Modrac u Federaciji Bosne i Hercegovine čiji je zadatak da pripremi i osmisli cjelovit projekt rješavanja problema, uključujući istraživanja te predlaganje i definiranje kratkoročnih i dugoročnih aktivnosti i mjera u svrhu otklanjanja problema cvjetanja te unapređenja stanja kvaliteta voda u akumulacijama/jezerima Federacije BiH.

Uposlenici Sektora 20 učestvuju u projektu Globalnog programa za podršku razvoju planova finansiranja bioraznolikosti (BIOFIN) kroz koji će se u Bosni i Hercegovini raditi na izradi finansijskih planova za zaštitu biodiverziteta.
Sektor 20 je, u 2025. godini, učestvovao u pripremi Plana integriteta AVP Sava.

U 2025. godini nastavljene su aktivnosti za potrebe programiranja nove faze Dunavskog transnacionalnog programa, za period 2021-2027., te su imenovani predstavnici Sektora 20 aktivno učestvovali i u ovom programu.

Priprema informacija, mišljenja, popunjavanja upitnika, priprema podataka iz nadležnosti upravljanja vodama, za potrebe drugih institucija, organa i medija, saradnja sa nadležnim kantonalnim ministarstvima na području rada AVP Sava i općinama/gradovima, učestvovanje u pripremi prijedloga odgovarajuće legislative koja se odnosi na vode, priprema i unos podataka u informacioni sistem voda je kontinuirana dugogodišnja aktivnost Sektora za strateško planiranje, a na kojoj je rađeno i u 2025. godini.

Krajem 2025. godine AVP Sava, a samim tim i Sektor za strateško planiranje započeo je sa izradom Izvještaja o poslovanju za 2025. godinu.

Poslovi i aktvnosti Sektora za realizaciju projekata (Sektor 30)

Sektor za realizaciju projekata vrši implementaciju preventivne aktivnosti i radova na odbrani od poplava na površinskim vodama I kategorije. Svi vodotoci su prema ZOV-u podijeljeni na vodotoke I i II kategorije, pri čemu nadležnost nad vodotocima I kategorije ima Agencija, a nadležnost nad vodotocima II kategorije kantonalna ministarstva nadležna za vode. Prema članu 5. Zakona o vodama Federacije Bosne i Hercegovine, vodotoci I kategorije su: Sava, Una, Unac, Sana, Vrbas, Pliva, Bosna, Krivaja, Usora, Spreča nizvodno od ušća Jale, Željeznica, Tinja, Drina, Sanica i Klokot. Osim nabrojanih vodotoka u I kategoriju spadaju i akumulacije: Hazna, Vidara, Jajce I, Jajce II i Župica.
Odabir prioritetnih projekata vršiti će se na osnovu do sada urađene planske i druge dokumentacije:

- Federalne strategije zaštite okoliša (2022 – 2032.) čiji je integralni dio Strategija upravljanja vodama Federacije BiH (2022 – 2032.),
- Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH 2022-2027.,
- Plan upravljanja rizikom od polava za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine,
- Trogodišnji plana Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za period 2023 – 2025. godina,
- Godišnji Plan rada Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (Sektor za vode) za 2024.,
- Okvirni plan i finansijski plan Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo za period 2024-2026. godine,
- Glavni preventivni plan odbrane od poplava za područje Federacije Bosne i Hercegovine,
- Odluke i zahtjevi Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva prema članu 156. tačka 14. Zakona o vodama,
- akti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine,
- na osnovu hitnih situacija na terenu izazvanih štetnim djelovanjem voda,
- na osnovu zahtjeva nadležnih kantonalnih ministarstava, općina i gradova.

Realizacija projekata u planskom periodu vrši se prema prioritetima i raspoloživim sredstvima AVP Sava.

Osim realizacije projekata izvođenja radova i vršenja usluga nadzora nad izvođenjem tih radova, takođe su se vršile usluge izrada tehničkih rješanja i priprema nedostajuće tehničke dokumentacije za izgradnju objekata za zaštitu od poplava za gradove i naselja izložena visokom riziku od poplava, odnosno idejnih i glavnih projekata za dionice za koje ne postoji urađena projektna dokumentacija, kao i elaborata za hitne intervencije na vodotocima I kategorije prema značaju za upravljanje vodama. Takođe se vršila i usluge revizije izrađene projektne dokumentacije kako bi ista bila spremna za ishodovanje neophodnih saglasnosti i dozvola kao preuslov za izvođenje radova na terenu.
Pored pobrojanih aktivnosti, Sektor za realizaciju projekata aktivno realizuje i sljedeće:

- učestvuje u kreiranju politike voda i poslovanja Agencije,
- učestvuje u donošenju prijedloga pravilnika i drugih akata od značaja za vodoprivredu te ostalih normativnih akata i kriterija,
- predlaže direktoru preduzimanje određenih mjera i aktivnosti iz nadležnosti rada sektora,
- organizuje i implementira strategiju upravljanja vodama, plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u FBiH,
- provodi mjere aktivne odbrane od poplava u skladu sa FOP-om
- učestvuje u provođenju mjera definisanih Akcionim planom zaštite od poplava
- vodi brigu o edukaciji i usavršavanju zaposlenika u sektoru,
- organizuje i učestvuje u provođenju procedura javnih nabavki,
- organizuje i učestvuje u provođenju procedura javnih poziva za vađenje materijala iz vodotoka
- učestvuje u aktivnostima radnih timova formiranih od strane direktora,
- priprema izvještaje o aktivnostima u okviru sektora,
- prati realizaciju Plana i Finansijskog plana Agencije,
- učestvuje u pripremi i izradi projektnih zadataka za izradu projektne dokumentacije za zaštitu od štetnog djelovanja velike vode,
- pregleda i daje komentare, sugestije i primjedbe na dostavljenu projektnu dokumentaciju iz oblasti rada sektora,
- učestvuje u izradi stručnih mišljenja i mišljenja u postupku izdavanja vodnih akata,
- učestvuje i pripremi i donošenju Okvirnog trogodišnjeg plana i godišnjeg Plana i Finansijskog plana Agencije,
- priprema podloge za donošenje odluka o programu rada sektora i učestvuje u donošenju odluka o realizaciji projekata,
- obavlja praćenje realizacije radova i usluga, kontrolu i ovjeru situacija, učestvuje u radu komisije za tehnički prijem radova, primopredaja izvršenih radova,
- organizuje izradu programa radova i priprema ponudbenu i tehničku dokumentaciju za realizaciju javnih nabavki radova i usluga,
- učestvuje u realizaciji projekata finasiranih od strane međunarodnih finansijskih institucija
- priprema i daje izjave sredstvima javnog informisanja iz oblasti realizacije projekata

Kroz dio izvještaja koji se odnosi na realizaciju stavki B.2. i značajan dio stavki C. se ogleda rad, aktivnosti i zadaci Sektora 30 u 2025. godini.

Poslovi i akitvnosti Sektora za izdavanje vodnih akata (Sektor 40)

Sektor za izdavanje vodnih akata funkcioniše kao posebna organizaciona jedinica u okviru AVP Sava, a formirana je na osnovu odredbi člana 156. stav 1. tačka 7. Zakona o vodama

(˝Službene novine Federacije BiH˝, broj 70/06). Ovaj sektor izdaje vodne akte za aktivnosti za koje je utvrđena obaveza pribavljanja vodnih akata iz nadležnosti agencija, kako je propisano članom 139. stav (1) istog Zakona, kao i članom 17. stav (1) Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22).
Prilikom vođenja upravnog postupka osim materijalnog propisa, tj. Zakona o vodama, supsidijarno se primjenjuje Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH" broj 2/98, 48/99 i 61/22) i čitav niz podzakonskih akata donesenih na osnovu materijalnog zakona.
Drugostepeni organ koji postupa po žalbama izjavljenim na rješenja agencija kao prvostepenog organa je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
U sektoru za izdavanje vodnih akata tokom prve polovine 2025. godine bilo je zaposleno četiri uposlenika sa punim radnim vremenom i jedan uposlenik sa pola radnog vremena. U navedenom periodu sektor je otežano funkcionirao zbog deficita radnika gdje je radnik na poslovima *Viši stručni saradnik za upravni postupak* raspoređen na funkciju v.d. Direktora. Dodatni deficit se desio zbog smrti kolege koji je radio na poslovima *Viši stručni saradnik za izdavanje vodnih akata*. U navedenom periodu pomoć u obavljanju redovnih poslova pružili su i uposlenici drugih sektora Agencije.
U drugoj polovini godine bilo je zaposleno šest uposlenika sa punim radnim vremenom i jedan uposlenik sa pola radnog vremena. Popunjena su dva upražnjena mjesta radnika na poslovima *Viši stručni saradnik za izdavanje vodnih akata*, prijemom jednog novog radnika i prelaskom jednog radnika iz Sektora 30.
Radno mjesto višeg stručnog saradnika za upravni postupak ostalo je upražnjeno, te je njegovo popunjavanje neophodno u najkraćem mogućem roku radi efikasnog vođenja upravnih postupaka po izjavljenim žalbama, nakon donošenja rješenja drugostepenog organa, u slučajevima kada se predmet vrati na ponovno postupanje.
Na poslovima vođenja upravnih postupaka u prvoj polovini godine bila su angažovana dva, a u drugoj polovini godine četiri uposlenika sa punim radnim vremenom, te jedan uposlenik sa pola radnog vremena. Za obavljanje administrativno–tehničkih poslova je bila angažovana jedna osoba sa punim radnim vremenom. Zbog ekonomičnosti i efikasnosti postupanja, prostorne udaljenosti podnosilaca zahtjeva u odnosu na gravitirajuća područja koja pokrivaju Uredi AVP Sava u Zenici, Bihaću i Jajcu, kao i boljeg poznavanja lokalne problematike, u vođenje postupaka bili su uključeni i uposlenici navedenih ureda. Tokom ispitnog postupka, po potrebi su se, a u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica i dokaza bitnih za vođenje postupka uključivali i uposlenici iz Sektora za upravljanje vodama, naročito u dijelu koji se odnosi na identifikaciju pojedinih zemljišnih čestica u smislu pripadnosti vodnom dobru i području koje je izloženo poplavama. Za jedan broj predmeta utvrđivanje ovih činjenica predstavlja prethodno pitanje koje se mora riješiti prije utvrđivanja ostalih činjenica bitnih za vođenje postupka.
Saradnja sa Sektorom za upravljanje vodama je bila naglašena u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje materijalnih dokaza i činjenica prilikom vođenja upravnih postupaka izdavanja vodnih akata gdje bi se kao bitna činjenica u upravnom postupku obezbijedila pravilna evaluacija elaborata koji su obrađivali problematiku obezbjeđenja ekološki prihvatljivog protoka na dionicama vodotoka nizvodno od mjesta zahvatanja voda, u skladu sa važećim podzakonskim aktom.
Saradnja se Sektorom 30 koji je nadležan za realizaciju projekata zaštite od štetnog djelovanja voda kao i održavanje korita vodotoka je nastavljena na način da se u cilju blagovremenog i zakonom propisanog postupka obezbjeđivanja saglasnosti i dozvola za realizaciju objekata i

aktivnosti koje se provode u okviru ovog Sektora dobije podrška Sektora 40 te izdaju potrebni vodni akti.
Sektor za izdavanje vodnih akata, u toku 2025. godine, zaprimio je ukupno 540 zahtjeva za izdavanje vodnih akata, što je manje za (cca 18,43%) nego u prethodnoj, 2024. godini (662 zahtjeva). Iz 2024. godine preneseno je još 137 neriješenih zahtjeva, što ukupno čini 677 zahtjeva koje je bilo potrebno riješiti u protekloj godini.

U 2025. godini su podneseni zahtjevi:

za PVS.....152
za VS.....92
za VD.....294

UKUPNO podnesenih zahtjeva u 2025. 541

Ukupno je riješeno u 2025. godini 472 predmeta što sa zahtjevima prenesenim iz 2024. godine (137) iznosi 609 predmeta.

Jedan dio upravnih postupaka pokrenutih u 2025. godini nisu okončani i oni će se voditi i završiti u 2026. godini, ukupno 90. Razlog za ovu pojavu predmeta koji se prenose u 2026. godinu, a koja se generalno redovno javlja u svakoj godini, je povećan broja prenesenih predmeta iz prethodne godine a ogleda se u slijedećem:

- dio zahtjeva je podnesen krajem godine,
- nepotpunost podneska i potreba da stranka dostavi nedostajuću dokumentaciju na osnovu koje se utvrđuju činjenice bitne za odlučivanje,
- složenost određenih predmeta i potreba da se prije odlučivanja u upravnom postupku riješe prethodna pitanja i potreba za utvrđivanjem činjenica i izvođenje dokaza, što zahtjeva provođenje procesnih radnji što samo po sebi zahtjeva određeno vrijeme.

Iz 2025. godine su preneseni zahtjevi za rješavanje, odnosno nije riješeno 90 zahtjeva.

I dalje je u strukturi podnesenih zahtjeva najveći broj zahtjeva podnesen od strane „malih" zagađivača voda (benzinske pumpe, pilane, autoservisi, autopraonice, betonare, automehaničarske radionice, zatvorena skladišta roba, stambeno-poslovni objekti, zanatske radnje za preradu mesa i dr.) za aktivnost ispuštanja tehnoloških otpadnih voda, bez obzira da li se ispuštanje otpadnih voda vrši u površinske vode, u tlo (prirodni recipijent) ili sisteme javne kanalizacije (prema saglasnosti operatora) te u nekim slučajevima u zatvorene sabirne/septičke jame.
Razlog za ovako velikim brojem zahtjeva, podnesenih AVP Sava, od strane „malih" zagađivača voda, tj. zagađivača koji, prema važećim propisima, ne vrše direktna mjerenja tereta zagađenja, nego se njihov doprinos u ukupnom teretu zagađenja obračunava korištenjem koeficijenata zagađenja, leži u činjenici da je prema Zakonu o vodama (čl. 139) ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u nadležnosti Agencija, bez obzira na njihovu količinu, sastav i uticaj na okoliš.
Jedan dio zahtjeva za izdavanje vodnih akata se odnosio na radove na regulaciji i uređenju vodotoka i izgradnji zaštitnih objekata na vodotocima I kategorije i isti su finansirani ili sufinansirani od strane ove AVP Sava i kao takvi su ušli u Plan i Finansijski plan za 2025. godinu.

Kao rezultat pokrenute inicijative od strane AVP Sava predstavnici jedinica lokalne samouprave u saradnji sa stručnim licima iz AVP Sava su u toku 2025. godine izvršili obilazak kritičnih lokaliteta na vodotocima I kategorije u smislu utvrđivanja potrebe za čišćenjem korita od nanosa koji ima svoju upotrebnu vrijednost, a u cilju obezbjeđenja protočnog kapaciteta i otklanjanju „uskih grla". Nakon identifikacije lokaliteta na kojima se, zbog morfologije korita i dinamike tečenja vrši odlaganje vučenog nanosa u koritu i smanjuje proticajni profil, utvrđena je potreba za čišćenjem takvih dionica u cilju omogućavanja kontroliranog i neškodljivog protoka vode.

Zbog složene procedure dodjele prava na vađenje materijala (čišćenje korita) i hidroloških uslova koji su vladali tokom godine, jedan dio aktivnosti započetih u 2025. godini, a koje se odnose na navedenu problematiku nije realizovan do kraja 2025. godine. U cilju provođenja preventivnih mjera sprječavanja ili umanjenja mogućnosti izljevanja vodotoka I kategorije iz svog korita, odnosno štetnog djelovanja voda, ove aktivnosti treba nastaviti u narednoj godini.

Redovna pojava uočena i u prethodnim godinama je da se pojavljuje relativno veliki broj zahtjeva za izdavanje prethodne vodne saglasnosti u odnosu na broj zahtjeva za izdavanje vodne saglasnosti u približnom odnosu 1,65:1. Razlozi za ovakvu pojavu nalaze se u činjenici da se jedan dio zahtjeva za izdavanje prethodne vodne saglasnosti odbacuje iz razloga što se za predmetnu aktivnost za koju je ista tražena ne propisuje obaveza pribavljanja vodnog akta od strane AVP Sava ili zbog različitih ograničenja i zabrana nije moguće provoditi istu na planiranom lokalitetu.

Najveći broj rješenja o odbijanju i zaključaka donesen je u skladu sa članom 123. stav (2) i članom 218. stav (2) Zakona o upravnom postupku, a iz razloga što po važećim materijalnim i procesnim propisima nije bilo uvjeta za pokretanje postupka kao npr:

- shodno članu 109. i 110. Zakona o vodama, predmetna aktivnost/gradnja/zahvat u prostoru ne podliježe obavezi izdavanja vodnih akata ili da AVP Sava nije nadležna za izdavanje vodnih akata;
- objekat se planira graditi u vodnom dobru ili plavnom području, a što je u suprotnosti odredbama članova 12. i 96. Zakona o vodama, što se u toku ispitnog postupka utvrdi i konstatuje da nije ispunjen uslov koji se može podvesti pod rješavanje prethodnog pitanja, odnosno zemljišne čestice na kojima je planirano provođenje aktivnosti podliježu ograničenjima u korištenju zemljišta;
- predmetna aktivnost/gradnja nije u skladu sa prostorno-planskim dokumentima ili planskim dokumentima AVP Sava;
- planiranom aktivnošću bi se ugrozila stečena prava drugih korisnika voda;
- ako se radi o zahtjevu za koji podnosilac zahtjeva već ima pravomoćno rješenje o istoj upravnoj stvari.

Zaključci su doneseni i u slijedećim pravnim situacijama:

- ako podnosilac zahtjeva, po važećim materijalnim i procesnim propisima, nije dostavio dokumentaciju potrebnu za odlučivanje o predmetnoj upravnoj stvari, shodno članu 121. stav (3) Zakona o vodama;
- u slučaju odustajanja stranke od zahtjeva, shodno članu 129. stav (2) Zakona o upravnom postupku;
- zbog nenadležnosti, a u skladu sa članom 65. Zakona o upravnom postupku (zahtjevi upućeni na nadležno rješavanje organu iz člana 139. stav (2) Zakona o vodama) ;
- ako je zahtjev podnesen za izdavanje VS a projektna dokumentacija nije urađena u skladu sa uslovima iz PVS.

U toku 2025. godine izjavljeno je trinaest žalbi. U ovom trenutku, odnosno zaključno sa 31.12.2025. godine rješava se 23 predmeta po izjavljenim žalbama na rješenja/zaključke donesene od strane AVP Sava i to:

1. *JP „AUTOCESTE FEDERACIJE BiH" d.o.o. Mostar - žalba uvažena (predmeti iz perioda 2019.-2022.)*
2. *JP „AUTOCESTE FEDERACIJE BiH" d.o.o. Mostar - žalba uvažena (predmeti iz perioda 2019.-2022.)*
3. *JP „AUTOCESTE FEDERACIJE BiH" d.o.o. Mostar - žalba uvažena (predmeti iz perioda 2019.-2022.)*
4. *JP „AUTOCESTE FEDERACIJE BiH" d.o.o. Mostar - žalba uvažena (predmeti iz perioda 2019.-2022.)*
5. *JP „AUTOCESTE FEDERACIJE BiH" d.o.o. Mostar -žalba uvažena (predmeti iz perioda 2019.-2022.)*
6. *Haris Ćoralić (turistički kompleks) - žalba uvažena (predmet iz 2018.)*
7. *„GEOMET" d.o.o. OLOVO (Žalbe podnosi Općinsko pravobranilaštvo Olovo) - žalba uvažena (predmet iz 2023.)*
8. *Žalba Centra za ekologiju i energiju Tuzla na rješenje UP-I/25-1-40-389-5/21 (Deponija „Višnik") - proslijeđena na nadležno rješavanje FMPVŠ - proslijeđena na nadležno rješavanje 05.05.2024. godine)*
9. *Žalba MZ ZAVALJE, Grad Bihać, na rješenje UP-1/21-3-40-656-5/22 - proslijeđena na nadležno rješavanje 09.08.2024. godine)*
10. *LAGER d.o.o. Posušje, na Zaključak UP-1/21-3-40-505-9/23 - žalba uvažena (predmet iz 2023)*
11. ALMY d.o.o. Zenica, dana 17.02.2025., na Rješenje UP-1/21-3-40-414-6/24 - proslijeđena na nadležno rješavanje 24.02.2025.
12. ADO-TRANS d.o.o. Visoko, dana 17.03.2025., na Rješenje UP-1/21-1-40-033-1/24, žalba uvažena, okončan postupak po drugostepenom rješenju
13. MZ Špionica, Grad Srebrenik, dana 29.04.2025., na Rješenje UP-1/21-1-40-146-22/23 - proslijeđena na nadležno rješavanje 05.05.2025.
14. IBRAHIM IMAMOVIĆ, dana 05.05.2025., na Rješenje UP-1/21-1-40-059-66/18, žalba uvažena
15. FAH-KOŽAR, dana 12.06.2025., na Rješenje UP-1/21-1-40-170-2/25, žalba proslijeđena na nadležno rješavanje 12.06.2025.
16. „SISECAM SODA LUKAVAC" d.o.o. Lukavac, dana 27.05.2025., na Rješenje UP-1/21-3-40-670-17/22, žalba proslijeđena FMPVŠ 28.05.2025.
17. „SISECAM SODA LUKAVAC" d.o.o. Lukavac, dana 24.06.2025., na Rješenje UP-1/21-1-40-123-71/21, žalba proslijeđena FMPVŠ 25.06.2025.
18. Nedžad Smailagić, dana 27.10.2025., na rješenje UP-1/21-3-40-656-5/22 - proslijeđena na nadležno rješavanje FMPVŠ 27.10.2025.
19. ALMY d.o.o. Zenica, dana 04.11.2025., na Rješenje UP-1/21-3-40-64-4/25, proslijeđena FMPVŠ 04.11.2025.
20. ALMY d.o.o. Zenica, dana 04.11.2025., na Rješenje UP-1/21-3-40-196-4/25, proslijeđena FMPVŠ 04.11.2025.
21. EDSEL d.o.o. Gradačac, dana 21.11.2025., na Rješenje UP-1/21-1-40-237-4/25, proslijeđena FMPVŠ 24.11.2025.
22. AUTOCESTE FBiH d.o.o. Mostar, dana 18.12.2025., na Rješenje UP-1/21-3-40-413-6/25, proslijeđena FMPVŠ 22.12.2025.

23. AUTOCESTE FBiH d.o.o. Mostar, dana 18.12.2025., na Rješenje UP-1/21-3-40-414-6/25, proslijeđena FMPVŠ 22.12.2025.

U 2025. godine izjavljeno je 13 (trinaest) žalbi od kojih se 8 (osam) odnosi na predmete i upravne postupke pokrenute u 2025. godini.
Od strane drugostepenog organa (FMPVŠ) do sada riješene žalbe su uvažene, te predmeti vraćeni na ponovno rješavanje AVP Sava ili drugostepeni postupak još nije okončan.
Drugostepeni organ koji postupa po žalbama izjavljenim na rješenja AVP Sava je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Nakon razmatranja po izjavljenim žalbama drugostepeni organ po pravilu vraća prvostepenom organu na ponovno postupanje, bez uputa koje bi jasno i nedvosmisleno omogućile dalje vođenje ponovljenog postupka i utvrđivanje novih činjenica i dokaza koji bi se koristili u postupku donošenja odgovarajućeg upravnog akta. Radno mjesto *Višeg stručnog saradnika za upravni postupak* je upražnjeno što otežava proces vođenja postupka nakon izjavljene žalbe i dostavljanja drugostepenog rješenja kojim se nalaže ponovni postupak.
U okviru nabrojanih predmeta u više slučajeva se vode ponovljeni postupci koji se odnose na propisivanje obaveze plaćanja posebnih vodnih naknada, koja se kroz vodnu dozvolu propisuje korisnicima prava na vode dodijeljenog pravnom licu, odnosno način obračuna posebnih vodnih naknada za zaštitu voda po osnovu ispuštanja oborinskih onečišćenih voda sa autocesta, a žalbe po pravilu izjavljuje JP „Autoceste Federacije BiH" i to su samo na tačke dispozitiva rješenja kojim se propisuje obaveza plaćanja posebnih vodnih naknada.
Kao otvoren, neriješen i pravno nedefinisan predmet u postupanju na koji je izjavljena žalba je status PVS za izgradnju nove taložnice „Bijelo more" kompanije «SISECAM SODA» d.o.o. Lukavac za potrebe koje je izrađena studija po zahtjevu drugostepenog organa, a u postupku donošenja upravnog akta. Slična situacija je i sa zahtjevom za izdavanje VD za kompanije «SISECAM SODA» d.o.o. Lukavac.
Jedan broj žalbi izjavljenih u 2025. godini se odnosi na predmete iz 2018., 2021., 2022., 2023. i 2024. godine, što ukazuje na slabu koordinaciju i saradnju sa drugostepenim organom, odnosno nepotpunost zakonskog okvira kojim su obuhvaćeni slučajevi koji se pojavljuju u realnom životu.
Osim vođenja upravnih postupaka i donošenja vodnih akata, uposlenici Sektora za izdavanje vodnih akata su u toku 2025. izradili i oko 140 odgovora na različite upite nadležnih organa i pravnih subjekata, te nadalje, po nalogu direktora, aktivno su učestvovali i u drugim projektima od interesa za AVP Sava.
Komunikacija između sektora 40 i FMPVŠ - Sektor za vode zasniva se na razmjeni informacija putem e-pošte i službenih dopisa, prosljeđivanju izjavljenih žalbi, te učešću na radnim sastancima organizovanim prema potrebi. Smatramo da bi na operativnom nivou trebalo dodatno unaprijediti saradnju sa FMPVŠ – Sektor za vode, naročito u dijelu koji se odnosi na postupanje po žalbama i davanje jasnih i nedvosmislenih uputa za vođenje ponovljenih postupaka u slučajevima kada se predmet vrati prvostepenom organu na ponovno postupanje.

Poslovi i aktivnosti Sektora za ekonomske poslove (Sektor 50)

U sektoru za ekonomske poslove sistematizovane su dvije službe, i to: Služba za finansijsko-računovodstvene poslove i Služba za naplatu prihoda od vodnih naknada.

U obje službe su sa 31.12.2025. godine završene sve planirane aktivnosti, i to:
- U zakonskom roku je sačinjen godišnji obračun sa setom zakonski propisanih obrazaca,

- Izvršena je kontrola finansijske ulazne dokumentacije za cijelu 2025. godinu, te je ista adekvatno i po pravilima struke evidentirana, proknjižena, ažurirana i arhivirana,
- Izvršena je kontrola finansijske izlazne dokumentacije za cijelu 2025. godinu, te je ista adekvatno i po pravilima struke evidentirana, proknjižena, ažurirana i arhivirana,
- Izvršen je popis stalnih sredstava, opreme, obaveza i potraživanja te je sačinjen Izvještaj o aktivnostima komisije za popis,
- Završeni su i dostavljeni svi godišnji izvještaji traženi zakonskim, podzakonskim i internim aktima u zakonskom roku nadležnim institucijama (porezna uprava, federalni zavod za statistiku, FIA, federalno ministarstvo finansija, federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i sl.),
- Izvršena je kontrola završnog „bilansa" sa Poreznom upravom, te prema ovoj instituciji nemamo nikavih dugovanja/potraživanja,
- Zaključene su pomoćne knjige sa danom 31.12.2025. godine i otvorene nove na dan 01.01.2026. godine (knjiga blagajne, knjiga ulaznih faktura, knjiga izlaznih faktura, knjiga bankovnih garancija i sl).
- Pripremljeni su i dostavljeni IOS-i za sve dobavljače AVP Sava i kupce AVP Sava,
- Na primljene IOS-e od dobavljača se odgovorilo konfirmacijom u roku,
- Pripremljen je i dostavljen GIP svim radnicima AVP Sava kao i Izvještaj o uplaćenim porezima i doprinosima za vanjske saradnike,
- Realizovani postupci javnih nabavki iz nadležnosti sektora,
- U službi za vodne naknade su unesena sva zaduženja pristigla na protokol AVP Sava zaključno sa 31.12.2025. godine,
- Obveznicima koji su ostvarili dugovanja po osnovu PVN kao i dužnicima koji nisu dostavili obrasce/elaborate za svoja zaduženja poslane su opomene,
- Održan je veliki broj sastanaka sa obveznicima plaćanja PVN, izvršene su kontrole određenog broja obveznika, kao i ostvareni kontakti i konsultacije sa obveznicima putem telefona i e-mailom, a sve u cilju da se stanje naplate PVN poboljša.
- i ostali poslovi iz nadležnosti sektora.

Finansijsko upravljanje i kontrola (FUK)

Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli Federacije BiH je objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH", broj 38/16. Finansijsko upravljanje i kontrola (u daljem tekstu: FUK) obuhvata sve finansijske i nefinansijske procese i aktivnosti u poslovanju i provodi se u svim organizacionim jedinicama i na svim nivoima u AVP Sava.
FUK obuhvata sve poslovne transakcije, a posebno one koje se odnose na prihode i primitke sredstava, rashode i izdatke sredstava, procedure nabavke i ugovaranja, povrate pogrešno uplaćenih iznosa, te imovinu i obaveze.
FUK se zasniva na upravljanju rizicima i uvodi se radi unapređenja finansijskog upravljanja i odlučivanja u realizaciji ciljeva organizacije, a naročito radi:
-Usklađenosti poslovanja sa propisima, planovima, ugovorima, politikama i procedurama;
-Obavljanja aktivnosti na pravilan, etičan, ekonomičan, efikasan i efektivan način;
-Zaštite imovine, obaveza i drugih resursa od gubitaka koji mogu nastati lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem, te zaštita od nepravilnosti, zloupotrebe i prevara;
-Pouzdanog, potpunog i pravovremenog finansijskog izvještavanja i praćenja rezultata poslovanja.

Ciklični prikaz planiranja aktivnosti u uspostavi i razvoju sistema FUK-a:

Procjena----Aktivnosti za rješavanje slabosti---Mjere na unapređenje sistema---Provođenje mjera i aktivnosti---Procjena/ponovljena procjena.

Odlukom direktora o konsolidiranom odobravanju implementacije i upotrebe svih procesa iz Mape procesa, broj 50-1305/19 od 10.12.2019. godine, **uspostavljen je FUK u Agenciji za vodno područje rijeke Save**. Ovom Odlukom odobrena je implementacija i upotreba svih procesa i procedura iz Mape procesa (ukupno 29). Također, iz postojećih procesa i procedura utvrđen je registar rizika.

Rješenjem direktora broj: 50-1315-2/25 od 06.10.2025. godine, zbog organizacionih i kadrovskih izmjena unutar Agencije, imenovan je novi Koordinacioni tim za uspostavljanje, provođenje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole.
Koordinacioni tim je uradio reviziju svih 29 poslovnih procesa koji su definisani u Mapi procesa. Zbog organizacionih izmjena unutar Agencije, izmjene propisa (eksternih i internih) i drugih okolnosti, koordinacioni tim je izvršio izmjene u Mapi procesa i **definisao 44 procesa**. Shodno ovim aktivnostima, 14.11.2025. godine direktor je donio Odluku o konsolidovanom odobravanju implementacije i upotrebe svih procesa iz Mape procesa, broj: 50-1315-6/25.

Za svaki proces definisane su: aktivnosti u procesu, cilj procesa, ulazne vrijednosti, izlazne vrijednosti, resursi, odgovorna lica, vlasnik procesa, a onda i rizici.

Definisano je 97 rizika. Prilikom definisanja rizika, vlasnici procesa sa saradnicima koji učestvuju u poslovnom procesu, su definisali: vrstu rizika, kategoriju rizika, uzrok, uticaj/posljedicu, izvršili ocjenu inherentnog rizika, ocjenu rezidualnog rizika, vrste odgovora na rizik, mjere za ublaženje rizika, potrebne resurse za umanjenje rizika i rok za izvršenje planiranih aktivnosti.

Rezultat ovih aktivnosti je izrada Registra rizika, broj: 50-1315-18/25, od 24.11.2025.godine.

U Pifc sistem Federalnog ministarstva finansija (Centralna harmonizacijska jedinica) su u datom roku ažurirani svi poslovni procesi i uneseni novi, te su uneseni i svi definisani rizici sa označenim elementima. Time je posao vezan za FUK za 2025. godinu u potpunosti realizovan i izvršen.
Naredna obaveza je izrada godišnjeg izvještaja za FUK, čiji je rok 28.02.2026. godine. A nakon toga će zbog donošenja novog Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta da se pristupi ponovnoj reviziji Mape procesa i Registra rizika.

<u>Popis stalnih sredstava, sitnog inventara, novčanih sredstava i potraživanja i obaveza na dan 31.12.2025. godine</u>

Odlukom o redovnom popisu i formiranju komisije za popis broj: 50-1342-1/25 od 09.10.2025. godine, formirana je Komisija za popis imovine, obaveza i potraživanja „Agencije za vodno područje rijeke Save" .
Zadatak Komisije bio je da sa stanjem na dan 31.12.2025. godine, izvrši redovan godišnji popis:

- stalnih sredstava,
- investicija u toku,
- dugoročnih ulaganja,

- novčanih sredstava i vrijednosnih papira,
- odbrambenog materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara,
- zaštitnih vodoprivrednih objekata u vlasništvu Federacije BiH,
- potraživanja i obaveza i
- drugo.

U skladu sa članom 3. Odluke, Komisija je izvršila fizički popis sredstava do 31.12.2025. godine. Usklađivanje utvrđenog stanja po fizičkom popisu sredstava sa knjigovodstvenim stanjem vršeno je u periodu od 04.01.2026. do 30.01.2026. godine. Utvrđeno stvarno stanje stalnih sredstava, sitnog inventara, rezervnih dijelova i materijala, HTZ opreme i dr., uneseno je u popisne liste. Komisija nije utvrdila višak ni manjak sredstava.
Komisija je izvršila i popis zaštitnih vodnih objekata koja je Vlada Federacije BiH prenijela AVP Sava na upravljanje i korištenje koji se vode u vanbilansnim knjigovodstvenim evidencijama.
Posljednjeg radnog dana u 2025. godini zapisnički je konstatovano stanje blagajne. Stanje novčanih sredstava na žiro računima i blagajni odgovara stvarnom stanju iskazanom u knjigovodstvu.
Komisija je, nakon obavljenog posla, elaborat o redovnom popisu imovine, obaveza i potraživanja na dan 31.12.2025. godine dostavila direktoru AVP Sava. Izvještaj o popisu, Komisija je dostavila Nadzornom odboru, a potom i Upravnom odboru na usvajanje. Izvještaj o popisu stalnih sredstava, sitnog inventara, novčanih sredstava i potraživanja i obaveza na dan 31.12.2025. godine je usvojen odlukom broj 80-220-5/22 na 25. sjednici Upravnog odbora AVP Sava, održanoj 11.02.2026. godine.

Poslovi i aktivnosti Sektora laboratorije za vode (Sektor 60)

Poslovi koje je Sektor Laboratorija za vode Agencije za vodno područje rijeke Save realizirao tokom 2025. godine su:

- Izrada godišnjeg izvještaja o stanju voda sliva rijeke Save na području Federacije Bosne i Hercegovine u 2024. godini
- Monitoring kvaliteta površinskih voda (nadzorni, operativni i istraživački) fizičko-hemijskih, hemijskih i bioloških parametara u cilju utvrđivanja stanja voda na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
- Monitoring kvaliteta podzemnih voda fizičko-hemijskih, hemijskih parametara u cilju utvrđivanja stanja podzemnih voda na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH i i analiza uzoraka podzemnih voda za katastar podzemnih voda.
- Učešće u aktivnostima po pitanju akcidentnih zagađenja u skladu u skladu sa Zakonom o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), Pravilnikom o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenata na vodama i obalnom vodnom zemljištu ("Službene novine Federacije BiH", broj 71/09), Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenata na vodama i obalnom zemljištu ("Službene novine Federacije BiH", broj 102/18) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenata na vodama i obalnom zemljištu ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/24).
- Kontrolna ispitivanja tereta zagađenja tehnoloških otpadnih voda pojedinih zagađivača direktnim mjerenjem izraženog preko ekvivalentnog broja stanovnika (EBS-a).
- Izrada pojedinačnih i godišnjih izvještaja o obavljenim ispitivanjima voda te davanje tumačenja i mišljenja o obavljenim ispitivanjima.

- Izrada Plana i programa monitoringa površinskih i podzemnih voda za 2026. godinu
- Razvijanje, osiguravanje i primjenjivanje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa zatjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.
- Prikupljanje, obrada i sistematizacija podataka o ispitivanju voda i unos podataka u informacioni sistem voda (ISV).

Sektor laboratorija za vode je u 2025. godini, nakon provedenog monitoringa površinskih voda na vodnom području rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (uzorkovanje i analize relevantnih parametara kvaliteta površinskih voda prema planu i programu monitoringa iz 2024.) i obrade svih rezultata ispitivanja izradio „Godišnji izvještaj o stanju voda sliva rijeke Save na području Federacije Bosne i Hercegovine u 2024. godini". Agencija za vodno područje rijeke Save je jedan primjerak Izvještaja dostavila Federalnom ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva, jedan primjerak se nalazi u biblioteci Agencije i u Sektoru laboratorija za vode i na web stranici AVP Sava. Prema Konvenciji o zaštiti Dunava, koju je ratifikovala i naša zemlja, kao i Okvirnog sporazuma za rijeku Savu, države potpisnice su obavezne da obezbijede odgovarajuću učestalost i kvalitet podataka i da prilagode svoj program monitoringa voda zahtjevima Okvirne direktive o vodama. Osim ovih razloga za promjene u sistemu upravljanja vodama, za koje bi se moglo reći, da su svojstvene samom procesu tranzicije u kojem se zemlja nalazi i potrebama izazvanim promjenama u prirodi, odluka Bosne i Hercegovine da se uključi u evropske integracione procese, posebno potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj Uniji (16. juna 2008. godine) i njegovim ratifikovanjem (22. oktobra 2008. godine), sobom nosi i vrlo konkretne i precizne zahtjeve u odnosu na način kako u Bosni i Hercegovini treba da se upravlja vodama. Kao dio sveobuhvatne politike EU, dakle politike koja postavlja određene zahtjeve za promjenama, pred sve segmente država koje žele da postanu kandidati za članstvo u EU i, u određenom momentu članice EU, i sistem upravljanja vodama Federacije BiH se suočava za brojnim i složenim zahtjevima na tom polju. U najkraćem, radi se o zahtjevu da se u BiH u potpunosti prihvati i primjenjuje pravo EU koje se odnosi na vode i zaštitu životne sredine (kao neposredni širi okvir upravljanja vodama), tj. onaj dio Community Acquis-a kojim se ta pitanja uređuju u EU. Princip Okvirne Direktive EU o vodi (2000/60/EC) (ODV) je zahtjev da sve vode budu u minimalno "dobrom stanju". Status površinske vode može biti klasifikovan kao visok, dobar, umjeren, slab ili loš, gledano prema specificiranim referentnim uslovima, koji uključuju biološke, hidromorfološke, hemijske i fizičko-hemijske elemente za površinske vode. Status površinske vode je dobar kada je i ekološki i hemijski status dobar. Agencija za vode u skladu s članom 156. stav 2. Zakona o vodama („Službene novine FBiH0˝, 70/06) na području za koje je nadležna "organizira hidrološki monitoring i monitoring kvaliteta voda, monitoring ekološkog stanja površinskih voda, te monitoring podzemnih voda, priprema izvještaj o stanju voda i predlaže potrebne mjere". Statutom Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo čl. 10. djelatnost Agencije je provođenje zadataka upravljanja vodama iz nadležnosti Agencije, u skladu sa Zakonom u okviru šifre djelatnosti 75.132 – Regulisanje i doprinos uspješnijem poslovanju ekonomije na nivou entiteta. S tim u vezi, stav 17. ovog člana "Tehničko ispitivanje i analiza" odnosi se na ispitivanje i analizu fizičko – hemijskih, bioloških i hidroloških karakteristika. Laboratorija za vode Agencije za vodno područje rijeke Save, kao ovlaštena laboratorija rješenjem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva br. UP – I – 07-21/-849/23 od 18.07.2023. godine, je ovlaštena da može vršiti ispitivanja: sastava i kvaliteta površinskih voda, sastava i kvaliteta otpadnih voda iz sistema javne odvodnje, tehnoloških voda i procjednih voda deponija, sastava i kvaliteta sedimenta u površinskim vodama, bioloških i mikrobioloških karakteristika površinskih voda, ekotoksikoloških svojstava

otpadnih voda iz sistema javne odvodnje i tehnoloških otpadnih voda, ekotoksikoloških svojstava hemijskih materija i njihovih smjesa koji nakon upotrebe dospjevaju u vode. Planom i programom monitoringa površinskih voda za 2025. godinu je bilo odabrano 58 vodnih tijela površinskih voda na kojima su se proveli slijedeći tipovi monitoringa:

- na 23 mjerna mjesta radio se nadzorni monitoring
- na 33 mjerna mjesta radio se operativni monitoring
- na 5 mjernih mjesta radio se istraživački monitoring

S obzirom da monitoringom u Planskom ciklusu 2016.-2021. nisu bila obuhvaćena sva vodna tijela na vodotocima površine sliva većih od 10 km^2, na preostalim će se u ovom planskom ciklusu provoditi nadzorni monitoring radi utvrđivanja statusa tih vodnih tijela kao i eventualna korekcija rezultata analize pritisaka. Monitoringom u 2025. godini ukupno je bilo obuhvaćeno 25 takvih (novih) vodnih tijela, na kojima su nakon obilaska terena bile definisane tačke monitoringa. Prije obilaska terena predhodila je priprema i obrada svih relevantnih parametara potrebnih za obilazak u svrhu utvrđivanja novih mjernih mjesta (karte, podloge, plan obilaska itd.) koja se nalazi u arhivi Sektora Laboratorije za vode.
Od ukupnog broja vodnih tijela, jedno je kandidat za jako izmjenjena vodna tijela (BA_BOS_KRI_TRIBIJA_VIJACICA_1), a prema Planu upravljanja vodama 2022.-2027. Monitoringom je bilo obuhvaćeno petnaest (15) međuentitetskih i prekograničnih vodnih tijela. Zbog čestih incidentnih zagađenja u prethodnom periodu, pratio se uticaj zagađivača Sisecam Soda d.o.o. Lukavac i GIKIL na vodnom tijelu BOS_SPR_1C, na mjernom mjestu Spreča-ušće. S obzirom da je ovo nadzorna stanica, koju ćemo pratiti kontinuirano, podaci će se koristiti za buduće izvještavanje za EIONET. Na vodnom tijelu BA_UNA_2C u sklopu projekta Istraživanje stanja okolišnih komponenti - Trgovska gora, u toku 2025. godine se provodio operativni monitoring. Ovo vodno tijelo se prati i kao međuentitesko i prekogranično vodno tijelo te u sklopu IPA II projekta. Evropska agencija za okoliš, provodi IPA II projekat "Jačanje sudjelovanja Zapadnog Balkana u radu Europske agencije za okoliš 2020. - 2021.: Akcije za procjenu vode i predviđanja" s ciljem jačanja stručnih kapaciteta u zemaljama Zapadnog Balkana za izvještavanje podataka u Informacioni sistem voda za Europu (WISE - Water Information System for Europe) i provedbi poglavlja o vodi Nacionalnog izvještaja o stanju okoliša. Jedna od komponenti projekta usmjerena je na razvoj i provedbu aktivnosti (pilot aktivnosti) za poboljšanje budućeg izvještavanja i procjenu voda.Od ukupnog broja mjernih mjesta, 12 mjernih profila pratit će se kao buduća EIONET mjerna mjesta (BA_BOS_7, BA_BOS_2B, BOS_USO_1B, BOS_SPR_1C, BA_SA_1C, BA_SA_2A, BA_DR_5B, BA_DR_6, BA_VRB_4B, BA_UNA_SAN_4A, BA_UNA_SAN_2C, BA_UNA_2C). Agencija za vodno područje rijeke Save u 2025. godini je provela i dodatna ispitivanja vodotoka rijeke Bioštice, a u skladu sa zahtjevom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona broj 18-21-08454/24-07-06-002 od 09.12.2024. godine.
Monitoring u 2025. godini je proveden na 44 vodotoka, 61 mjernom mjestu, odnosno na 58 vodnih tijela:

Vodotoci, vodna tijela i mjerna mjesta monitoringa površinskih voda u 2025. godini

R. broj	Vodotok	Vodno tijelo	Mjerno mjesto	Tip kod	Biotip kod	Tip mon.
1.	Bosna	BA_BOS_7[8]	Bosna - Rimski most	Tip_4.4	Tip 5	O
2.	Bosna	BA_BOS_2B[R]	Bosna - Donji Ulišnjak	Tip_2.14	Tip 2	O

3.	Bosna	BA_BOS_2B[8,9]	Bosna – nizv. od Maglaja	Tip_2.14	Tip 2	O
4.	Usora	BOS_USO_1B[8,9]	Usora - ušće	Tip_4.14	Tip 5	O
5.	Spreča	BOS_SPR_1C[8,9]	Spreča - ušće	Tip_3.14	Tip 5	O
6.	Sava	BA_SA_1C[8,9]	Sava - Orašje	Tip_1.15	Tip 1	O
7.	Bosna	BA_BOS_1B[8,9]	Bosna - ušće	Tip_2.14	Tip 2	O
8.	Sava	BA_SA_2A[8,9]	Sava - Svilaj	Tip_1.15	Tip 1	O
9.	Prača	BA_DR_PRA_4	Prača – uzv. od ušća Čemernice (kod naselja Kaljani)	Tip_4.19	Tip 6	O
10.	Kamenička rijeka	DR_PRACA_KAMENICKARIJEKA[9]	Kamenička rijeka - ušće	Tip_5.22	Tip 6	N
11.	Drina	BA_DR_5B[8,9]	Drina - nizv. od Goražda	Tip_2.16	Tip 3	O
12.	Drina	BA_DR_6[8]	Drina - Vitkovići	Tip_2.16	Tip 3	O
13.	Bioštica	BA_BOS_KRI_BIO_1	Bioštica – uzv. od mjesta incidentnog zagađenja	Tip_4.7	Tip 6	I
14.	Bioštica	BA_BOS_KRI_BIO_1	Bioštica – nizv. od mjesta incidentnog zagađenja	Tip_4.7	Tip 6	I
15.	Bioštica	BA_BOS_KRI_BIO_1	Bioštica – Zeleni vir	Tip_4.7	Tip 6	I
16.	Krivaja	BA_BOS_KRI_4	Krivaja nizv od Olova	Tip_4.8	Tip 7	O
17.	Tribija	BOS_KRI_TRI_1	Tribija - ušće	Tip_5.16	Tip 6	N
18.	Vijačica	BOS_KRI_TRIBIJA_VIJACICA_1*	Vijačica - ušće	Tip_5.20	Tip 7	N
19.	Duboštica	BOS_KRI_DUB_1	Duboštica - ušće	Tip_5.16	Tip 6	N
20.	Ravna rijeka	BOS_KRI_DUBOST_RAVNARIJEKA_1	Ravna rijeka - uzv. od spoja sa Strmac	Tip_5.20	Tip 7	I
21.	Strmac	BOS_KRI_DUBOSTICA_STRMAC_1	Strmac - uzv. od spoja sa Ravna rijeka	Tip_5.23	Tip 7	I
22.	Župeljeva	BOS_KRI_ZUP_1	Župeljeva - ušće	Tip_5.16	Tip 6	N
23.	Velika Maoča	BOS_KRI_ZUPELJ_VELIKAMAOCA_1	Velika Maoča - ušće	Tip_5.20	Tip 7	N
24.	Mala Maoča	BOS_KRIVAJA_MALAMAOCA_1	Mala Maoča - ušće	Tip_5.20	Tip 7	N
25.	Dištica	BOS_KRIVAJA_DISTICA_1	Dištica - ušće	Tip_5.17	Tip 5	N
26.	Velika Ribnica	BA_BOS_KRI_RIB_2	Velika Ribnica - ušće	Tip_5.20	Tip 7	N
27.	Željova rijeka	BOS_KRI_RIB_ZELJOVARIJEKA_1	Željova rijeka - ušće	Tip_5.17	Tip 5	N
28.	Kamenica	BOS_KRI_KAMENICA_1	Kamenica - ušće	Tip_5.17	Tip 5	N
29.	Lašva	BA_BOS_LAS_5	Lašva – Hatarići	Tip_5.22	Tip 6	O
30.	Lašva	BA_BOS_LAS_3	Lašva - naselje Mali Mošunj	Tip_4.17	Tip 5	O
31.	Bila	BA_BOS_LAS_BILA_1	Bila ušće u rijeku Lašvu	Tip_4.16	Tip 6	O
32.	Kozica	BA_BOS_LAS_KOZ_1	Kozica-ušće	Tip_4.5	Tip 5	O
33.	Mlava	BA_BOS_FOJ.R_MLA_1	Mlava - ušće	Tip_5.30	Tip 4	O
34.	Kreševka	BA_BOS_FOJ.R_LEP_KRE_1	Kreševka - ušće	Tip_5.18	Tip 4	O
35.	Lepenica	BA_BOS_FOJ.R_LEP_2	Lepenica - uzv. od Kreševke	Tip_4.14	Tip 5	O
36.	Vrbas	BA_VRB_6	Vrbas - Bravnice	Tip_3.4	Tip 6	O

37.	Vrbas	BA_VRB_5	Vrbas - Podmilačje	Tip_3.4	Tip 6	O
38.	Vrbas	BA_VRB_4B[8,9]	Vrbas - Jajce II	Tip_3.4	Tip 6	O
39.	Pliva	BA_VRB_PLIVA_1	Pliva - ušće	Tip_3.4	Tip 6	O
40.	Sana	BA_UNA_SAN_4A[8,9]	Sana - uzv. od Ključa	Tip_3.4	Tip 6	O
41.	Kozica	BA_UNA_SANA_KOZ_1	Kozica - ušće	Tip_4.4	Tip 5	O
42.	Sana	BA_UNA_SAN_2C[8,9,R]	Sana - Čaplje	Tip_3.2	Tip 5	O
43.	Una	BA_UNA_3[9R]	Una poslije ušća Unca - Una uzv. od Kulen Vakufa	Tip_3.4	Tip 6	O
44.	Unac	BA_UNA_UNAC_1	Unac - ušće	Tip_4.4	Tip 5	O
45.	Drvara	BA_UNA_UNAC_DRVARA_1	Drvara - ušće	Tip_5.8	Tip 6	N
46.	Drobnjak	BA_UNA_UNAC_DROBNJAK_1	Drobnjak - ušće	Tip_5.8	Tip 6	N
47.	Unac	BA_UNA_UNAC_4	Unac - nizv. od akumulacije Župica	Tip_5.8	Tip 7	N
48.	Unac	BA_UNA_UNAC_5	Unac - uzv. od akumulacije Župica	Tip_5.10	Tip 6	N
49.	Gudaja	BA_UNA_UNAC_GUDAJA_1	Gudaja - ušće	Tip_5.10	Tip 7	N
50.	Mutnica	BA_KORANA_MUTN_2	Mutnica - naselje Samardžići - Pjanići	Tip_4.30	Tip 4	N
51.	Mutnica	BA_KORANA_MUTN_1	Mutnica - ušće	Tip_4.30	Tip 4	O
52.	Korana	BA_KORANA[9]	Korana – Tržac - Kupalište Memin brod	Tip_4.2	Tip 5	O
53.	Glina	BA_GLINA[9]	Glina - carinski terminal	Tip_4.14	Tip 5	O
54.	Glinica	BA_GLINA_GLI_1[9]	Glinica - naselje Elezovići	Tip_4.14	Tip 5	O
55.	Glinica	BA_GLINA_GLI_2	Glinica - uzv. od ušća Bojne	Tip_4.14	Tip 5	N
56.	Devetak	BA_GLI_BUZ_CAGL_DEVETAK_1	Devetak - ušće	Tip_5.5	Tip 5	N
57.	Čaglica Rijeka	BA_GLINA_GLI_BUZ_CAG-RIJ_2	Čaglica Rijeka - uzv. od ušća Devetak	Tip_5.3	Tip 4	N
58.	Mrceljica	BA_GLI_BUZ_CAGL_MRCELJICA_1	Mrceljica - ušće	Tip_5.5	Tip 5	N
59.	Čaglica Rijeka	BA_GLINA_GLI_BUZ_CAG-RIJ_3	Čaglica -Rijeka - uzv. od ušća Mrceljice	Tip_5.5	Tip 5	N
60.	Pivnica	BA_GLINA_GLI_BUZ_CAG-RIJ-PIV_4	Pivnica - naselje Ljubijankići	Tip_5.5	Tip 5	N
61.	Una	BA_UNA_2C[8,9,**]	Una - nizv. od Bosanske Krupe	Tip_3.1	Tip 5	O

N nadzorni monitoring, O operativni monitoring, I istraživački monitoring
8 EIONET mjerni profili
9 Međuentitetska i prekogranična vodna tijela
R Referentno mjerno mjesto
** Istraživanje stanja okolišnih komponenti - Trgovska gora
* Kandidati za JIVT vodnog područja rijeke Save FBiH

Monitoring podzemnih voda

Monitoring podzemnih voda u 2025. godini obavljen je na 20 lokacija/piozometara, koje su već bile predmet monitoringa, radi utvrđivanja stanja vodnog tijela:

Vodna tijela i mjerna mjesta monitoringa podzemnih vodnih tijela u FBiH u 2025. godini

Podzemna vodna tijela			
R.b.	**Podzemno vodno tijelo**	**Kod GVTPV-a**	**Mjerno mjesto**
1.	Posavina	BA_SA_GW_I_1	Odžak Donji Svilaj
2.	Posavina	BA_SA_GW_I_1	Odžak Tukovi
3.	Posavina	BA_SA_GW_I_1	Gradačac Okanovići
4.	Posavina	BA_SA_GW_I_1	Orašje Kostrč
5.	Tuzlansko-sprečko polje	BA_BO_GW_I_1	Živinice Strašanj
6.	Tuzlansko-sprečko polje	BA_BO_GW_I_1	Kalesija Krušik
7.	Posavina - Dolina Usore	BA_SA_GW_I_1	Jelah Tešanj
8.	Posavina - Dolina Usore	BA_SA_GW_I_1	Jelah Tešanj
9.	Posavina- Dolina Bosne	BA_SA_GW_I_1	Maglaj Misurići
10.	Sarajevsko –zeničko polje	BA_BO_GW_I_3	Ilidža Sokolović kolonija
11.	Sarajevsko –zeničko polje	BA_BO_GW_I_3	Ilidža Sokolović kolonija
12.	Posavina	BA_SA_GW_I_1	Domaljevac
13.	Tuzlansko-sprečko polje	BA_BO_GW_I_1	Lukavac
14.	Tuzlansko-sprečko polje	BA_BO_GW_I_1	Gračanica
15.	Tuzlansko-sprečko polje	BA_BO_GW_I_1	Doboj Istok
16.	Sarajevsko –zeničko polje	BA_BO_GW_I_2	Kakanj
17.	Sarajevsko –zeničko polje	BA_BO_GW_I_2	Visoko
18.	Tuzlansko -sprečko polje	BA_BO_GW_I_1	Gračanica- Stjepan Polje
19.	Tuzlansko -sprečko polje	BA_BO_GW_I_1	Lukavac - Hrvati
20.	Posavina	BA_SA_GW_I_1	Orašje





Sektor Laboratorija za vode je tokom 2025. godine obavio analize parametra na svim vodnim tijelima površinskih i podzemnih voda u skladu sa Planom monitoringa za 2025. godinu. Godišnji izvještaj o stanju voda sliva rijeke Save na području Federacije Bosne i Hercegovine u 2025. godini bit će završen do kraja aprila 2026. godine. Svi pojedinačni rezultati parametara kvaliteta površinskih voda uneseni su u bazu podataka Informacionog sistema voda (ISV).

Aktivnosti vezane za postupanja u slučaju akcidenta AVP Sava je provodila u skladu sa Zakonom o vodama („Službene novine Federacije BiH˝, broj 70/06) i Pravilnikom o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenata na vodama i obalnom vodnom zemljištu ("Službene novine Federacije BiH", broj 71/09, 102/18, 70/24).

-U skladu sa aktom Vlade Federacije BiH broj: 01-13-314-12/24 od 15.05.2025. godine AVP Sava se obratilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma sa zahtjevom za dostavljanje informacija radi pripreme sveobuhvatne informacije potrebne za sjednicu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Aktom Vlade je traženo da se napravi informcija sa jasnom analizom nadležnosti institucija Federacije BiH, kantona i općine u ovom slučaju, te pregled do sada poduzetih aktivnosti i ko je poduzeo predmetne aktivnosti u vezi sa predmetom rudnik olova „Geomet". Naime, Uredu premijera Federacije BiH obratilo se Pravobranilaštvo Općine Olovo, aktom broj U-22/274 od 24.04.2025. godine, u vezi sa pitanjem rada rudnika „Geomet" d.o.o. Olovo i posljedičnog zagađenja rijeke Bioštice. S tim u vezu, napravljena je Informacija o poduzetim mjerama na rijeci Bioštici akt broj 60/40-783/25 od 02.06.2025. godine i dostavljena Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.

- JU Zavod za javno zdravstvo, Bosansko–podrinjskog kantona, Goražde uputio je 27.06.2025. godine AVP Sava upit broj: 01-45-149/25 od, a vezno za ekološki incident na rijeci Ćehotini koji se, prema navodima medija, desio u blizini rudnika olova i cinka „Šuplja stijena" kod Pljevalja, a koji je doveo do isticanja kontaminiranih voda i taloga u rijeku Ćehotinu. Zbog činjenice da se rijeka Ćehotina uljeva u rijeku Drinu, te da se nizvodno, u naselju Vitkovići nalazi vodozahvat koji služi za navodnjavanje Grada Goražda, odmah nakon zaprimljene informacije Agencija za vodno područje rijeke Save je odgovorila istog dana (27.06.2025. godine) dopisom broj 60-936-2/25 u kojem je navedeno da se o predmetnom događaju saznalo iz dopisa Zavoda za javno zdravstvo iz Goražda i da se po saznanju odmah stupilo u kontakt sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove. U skladu sa svojim zakonskim nadležnostima, uposlenici AVP Sava su 03.07.2025. godine izvršili uzorkovanje površinske vode rijeke Drine u naselju Vitkovići gdje je i vodozahvat koji služi za snadbjevanje grada Goražda. Nakon provedenih opsežnih analiza u Laboratoriji za vode Agencije za vodno područje rijeke Save, konstatovano je da nije bilo odstupanja odabranih parametara od zahtjevanih klasa, odnosno graničnih vrijednosti ekoloških i hemijskih elemenata kvaliteta za dobro stanje rijeke Drine u naselju Vitkovići. Provedene su analize hemijskih, bioloških i mikrobioloških parametara kvaliteta voda. Osim osnovnih fizičko-hemijskih parametara, kao što su miris, boja, temperatura vode, elektroprovodljivost, otopljeni kiseonik, zasićenost kisonikom, suspendovane materije - analizirani su BPK_5, HPK, nutrijenti, specifične zagađujuće materije kao što su olovo, nikl, kadmij, arsen, hrom, bakar, živa, željezo, PAH-ovi. Hemijskom analizom je bilo obuhvaćeno 50 različitih parametara. Od bioloških, rađena je analiza kvalitativno kvantitativnog sastava makroinvertebrata bentosa SI (Pantle Buck, 1955), identifikacija i brojanje bentičkih diatomeja SI (Pantle Buck, 1955). Od mikrobioloških parametara rađeno je brojanje uzgojenih mikroorganizama – određivanje broja kolonija cijepljenjem agar hranjeve podloge za gajenje, *Escherichia coli* i koliformnih bakterija i intestinalne enterokoke. Za ocjenu je korištena Odluka o karakterizaciji površinskih i podzemnih voda, referentnim uvjetima i parametrima za ocjenu stanja voda i monitoringu voda (˝Službene novine Federacije BiH˝, 1/14). Izvještaj PV-001/25 od 24.07.2025. godine dostavljen je JU Zavodu za javno zdravstvo Goražde (dopis 60-936-3/25 od 28.07.2025. godine), informacija putem medija i na web stranici Agencije.

- U skladu s usmenim nalogom Glavnog federalnog vodnog inspektora uposlenici Agencije za vodno područje rijeke Save su dana 17.05.2025. godine, zajedno s Glavnim federalnim vodnim inspektorom, obavili obilazak terena i uzorkovanje na rijeci Bosni na tri lokacije: Bosna- nizvodno od Zenice i Bosna- Vranduk-ispod plavog mosta i Bosna – Vranduk ispod plavog mosta (rukavac s uginulom ribom). Pismeni nalog broj 14-21-7-00399/2025-1405-1-P od 16.07.2025. godine je zaprimljen na protokol Agencije za vodno područje rijeke Save dana 23.07.2025. godine. Nalogom je traženo uzorkovanje rijeke Bosne u povodu pomora ribe koji se desio 14.07.2025. godine na lokalitetu mjesta Jelina i Vranduk, grad Zenica, kako je navedeno u nalogu. S tim u vezi, Agencija za vodno područje rijeke Save na dan 14.07.2025. godine nije bila obaviještena od strane ribočuvara, niti od kantonalne, odnosno federalne vodne inspekcije da je u toku noći 13.07.2025. godine došlo do značajnog pomora ribe u vodotoku rijeke Bosne u rejonu grada Zenice, ispod industrijske zone nizvodno, te iz navedenog razloga Agencija nije bila na licu mjesta dana 14.07.2025. godine kada je kantonalna vodna inspektorica vršila inspekcijski nadzor, odnosno uviđaj. Agencija za vodno područje rijeke Save, u slučaju incidentnog (akcidenta) zagađenja postupa u skladu sa Zakonom o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), Pravilnikom o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenata na vodama i obalnom vodnom zemljištu ("Službene novine Federacije BiH", broj 71/09), Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenata na vodama i obalnom zemljištu ("Službene novine Federacije BiH", broj 102/18) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenata na vodama i obalnom zemljištu ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/24). Nakon prijema uzoraka u Laboratoriji za vode provedena je hemijska analiza, mikrobiološka analiza i test akutne toksičnosti (48h LC_{50}) sa test organizmom *Daphnia magna* Straus. Izvještaji I-001/25- Bosna nizvodno od Zenice, I-002/25- Bosna Vranduk-ispod plavog mosta i I-003/25- Bosna Vranduk-ispod plavog mosta (rukavac s uginulom ribom) dostavljeni su Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, Sektoru 10, Sektoru 60, a/a, Udruženju građana sportskih ribolovaca „Bistro" Zenica, Upravi policije PU 1, Ministarstvu unutarnjih poslova Zenica.

-Agenija za vodno područje rijeke Save je dana 16.07.2025. godine telefonskim putem obavještena od strane komunalno-vodnog inspektora Samira Beganovića, Služba za urbanizam, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove, Unsko–sanski kanton, Cazin, da je dobio usmeni zahtjev za izlazak na teren (telefonska dojava) zbog promjene boje rijeke Korane. Predmetni događaj je detaljno opisan u službenoj zabilješki broj 04-21-95825/25 od 16.07.2025. godine koju je sačinio komunalno-vodni inspektor Samir Beganović i koja je putem pošte dostavljena AVP Sava. Zbog hitnosti djelovanja, dogovoreno je sa Glavnim federalnim vodnim inspektorom i komunalno-vodnim inspektorom da se angažira najbliža laboratorija za uzimanje i analizu fizičko-hemijskih parametara kvaliteta vode, što je u skladu s Pravilnikom o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenata na vodama i obalnom vodnom zemljištu ("Službene novine Federacije BiH", broj 71/09, 102/18, 70/24). Pismeni nalog Federalnog vodnog inspektora broj UP1-14-21-2-04235/2025-14-1 od 21.07.2025. godine je zaprimljen naknadno na protokol AVP Sava dana 23.07.202. godine. Shodno navedenom, AVP Sava je angažirala Zavod za javno zdravstvo USK Bihać za uzorkovanje i analizu fizičko-hemijskih parametara kvaliteta vode. Agenciji je Zavod za javno zdravstvo USK Bihać dostavio izvještaj o ispitivanju vode - Izvještaj broj 7749/25 od 22.07.2025. godine koji je potom proslijeđen Fedralnoj upravi za inspekcijske poslove i Službi za urbanizam, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove, Unsko–sanski kanton, Cazin. Uposlenici AVP Sava su izvršili uzorkovanje na lokaciji Korana – Granični prelaz dana 29.07.2025. godine i obavili analize fizičko-hemijskih

parametara kvaliteta voda. Izvještaj o provedenoj analizi broj I-004/25 od 19.08.2025. godine Agencija za vodno područje rijeke Save je dostavila Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i Službi za urbanizam, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona, Grad Cazin.

- Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo je dana 12.08.2025. godine u 16:30 sati telefonskim putem obaviještena od strane Glavnog federalnog vodnog inspektora da je dobio dojavu o zamućenju i promjeni boje rijeke Une od strane Udruženja „Unski lađari" na potezu od Grad Bihać nizvodno prema ušću u rijeku Savu. Pismeni nalog Federalnog vodnog inspektorata broj 14-21-4-05115/2025-14-2-P od 14.08.2025. godine je zaprimljen naknadno na protokol Agencije za vodno područje rijeke Save dana 15.08.2025. godine. Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo je, nakon dojave, dana 13.08.2025. godine uputila uposlenike na teren radi obilaska terena, uzimanja uzoraka i terenskih analiza rijeke Une. Obavljeno je uzorkovanje na 4 (četiri) lokaliteta i to: Una – uzvodno od Bihaća (most Ripač), koordinate: 44.949226, 16.169231, Una - nizvodno od Bihaća (UPOV; Hidrološka stanica Kostolac), koordinate: 44.880748, 158955004. Una – Ostožac na Uni, BP Petrol Prošić, koordinate: 44.8973776, 15.934643 i Una – Bosanska Otoka, koordinate: 44.772261, 15.948207. Uposlenici AVP Sava su, po zahtjevu Glavnog federalnog vodnog inspektora, preuzeli 3 (tri) uzorka od komunalnog vodnog inspektora Beganović Samira iz Cazina, koje je uzorkovao dana 12.08.2025. godine na slijedećim lokacijama: Una – Ostožac na Uni, BP Petrol Prošić, Una – Bosanska Krupa – Most u centru grada, Una – Bosanska Otoka – most u centru grada. Izvještaji I-005/25 - Rijeka Una – Bosanska Otoka. Izvještaji I-006/25 - Rijeka Una – Ostrožac na Uni, BP Petrol Prošić, I-007/25 - Rijeka Una – nizvodno od Bihaća (UPOV), Hidrološka stanica Kostela, I-008/25 - Rijeka Una – uzvodno od Bihaća, most Ripač, I-009/25 - Rijeka Una – Ostrožac na Uni, BP Petrol Prošić, I-010/25 - Rijeka Una – Bosanska Krupa, most u centru grada, I-011/25 - Rijeka Una – Bosanska Otoka, most u centru grada su dostavljeni Federalnoj upravi za inspekcijeske poslove, Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, Sektor 10, Sektoru 60, a/a, medijima i na web stranici AVP Sava.

- Rješenjem Federalnog ministra poljoprivrede vodoprivrede i šumarstvo broj UPI – I – 07-21/1 – 1252/23 od 20.07.2023. godine Laboratorija za vode može vršiti kontrolna ispitivanja tereta zagađenja otpadnih voda pojedinih zagađivača direktnim mjerenjem u saradnji sa nadležnim organom za inspekcijske poslove, prema zahtjevu FMPVŠ, nadležne Agencije za vodno područje ili vodne inspekcije, a u skladu s članom 35. Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati referentne, odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaju i načinu davanja ovlasti ("Službene novine Federacije BiH", broj 14/10, 14/13, 26/14, 15/17, 23/17). Posebne vodne naknade (PVN) su utvrđene članom 170. Zakona o vodama (˝Službene novine Federacije BiH˝, broj 70/06), u kojem je propisano da se naknada za zaštitu voda obračunava na osnovu količine zagađenja voda izraženog preko ekvivalentnog broja stanovnika (EBS). Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada (˝Službene novine Federacije BiH˝, broj 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12), u daljem tekstu: Pravilnik, tačka 12., utvrđeno je da je obveznik plaćanja PVN za zaštitu voda fizičko i pravno lice koje vrši direktno ispuštanje otpadnih voda u površinske vode, indirektno ispuštanje otpadnih voda u podzemne vode, ispuštanje otpadnih tehnoloških voda u javni kanalizacioni sistem iz objekata i postrojenja koja podliježu obavezi pribavljanja okolinske dozvole u smislu

odredbi Zakona o zaštiti okoliša (˝Službene novine Federacije BiH˝, broj 33/03). U skladu sa tačkom 31. Pravilnika, obveznici obračunavanja i plaćanja PVN za zaštitu voda čija ukupna godišnja količina zagađenja (EBS) prelazi 500 ES, dužni su najmanje jedanput u dvije godine vršiti ispitivanje uzoraka otpadne vode, odnosno otpadnih voda prije njihovog ispuštanja. Na osnovu „Procedure i kriterija za odabir zagađivača voda za kontrolna ispitivanja tereta zagađenja otpadnih voda izraženog preko EBS-a broj 50-82-2/24 od 02.02.2024. godine, Sektor 60 je u saradnji sa službom za prikupljanje vodnih naknada Sektora 50 i Odjeljenjem za zaštitu i korištenje voda Sektora 10, izradio plan kontrolnih mjerenja tereta zagađenja otpadnih voda pojedinih zagađivača u 2025. godini. Na listi su bili sljedeći zagađivači: Global Ispat Koksna Industrija (GIKIL, Koksara Lukavac), Fah – Kožar d.o.o. Visoko, Farma Spreča d.o.o. Kalesija, EUROSJAJ d.o.o. Konjic i UNISGAL d.o.o. Konjic. Od navedenih zagađivača kontrolna mjerenja tereta zagađenja otpadnih voda izraženog preko ekvivalentnog broja stanovnika (EBS) su provedena u „FAH – KOŽAR" d.o.o. Visoko i „Farma Spreča" d.o.o. Kalesija. Za navedena kontrolna ispitivanje Sektor laboratorija za vode je izradio izvještaje koji su proslijeđeni Sektoru 50 i Sektoru 10 AVP Sava.



Kontrolno mjerenje tereta zagađenja otpadnih voda (EBS) – Farma Spreča



Kontrolno mjerenje tereta zagađenja otpadnih voda (EBS) – FAH KOŽAR

Putem e-mail-a smo obaviješteni od strane AVP Jadranskog mora da su subjekti Eurosjaj i Unisgal u postupku izdavanja vodnih dozvola i da je kroz upravni postupak organizirano ispitivanje za potrebe utvrđivanja tereta zagađenja, tako da nije bilo potrebe za kontrolnim elaboratima, kako je navedeno u e-mail-u. Uzevši u obzir informacije iz medija o trenutnoj lošoj situaciji u Koksari d.o.o. Lukavac, obratli smo se dopisom 60-1714-1/25 od 04.12.2025. godine u kojem smo tražili informaciju o mogućnosti provođenja kontrolnog mjerenja tereta zagađenja otpadnih voda izraženog preko ekvivalentnog broja stanovnika (EBS). Dobili smo informaciju putem dopisa broj 3349-12-49444/25 od 16.12.2025. godine, da je za kompaniju proglašen stečaj, te da zbog teške situacije i nedostatka sredstava kompanija trenutno nije u mogućnosti obezbijediti uslove za provođenje aktivnosti kontrolnog ispitivanja tereta zagađenja otpadnih voda u „Koksara" d.o.o. Lukavac, u stečaju.

-Laboratorija za vode AVP Sava je u periodu od 21.10.2025. do 22.10. 2025. godine provela jednokratno mjerenje otpadnih voda na Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda Grada Bihaća. Ispitivanje usklađenosti rada „Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Grada Bihaća" urađeno je u skladu sa Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije (˝Službene novine Federacije BiH˝, broj 26/20, 96/20, 01/24) (u daljem tekstu: Uredba), a na Zahtjev Ureda premijera Federacije BiH broj 01-19-542/25 od 20.08.2025. godine vezano za akt Gradskog organa Grada Bosanska Krupa, broj 01-19-6753/25 od 05.08.2025. godine, kojim se tražio inspekcijski nadzor na lokaciji Velhovskog polja zbog sumnje da rad Postrojenja za prečišćavanje otpadni voda u Bihaću nije u skladu sa propisima, za što se pretpostavlja da je jedan od mogućih uzroka navodnog ekološkog incidenta na rijeci Uni. Izvještaji su dostavljeni Uredu premijera Federacije BiH, Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, Gradu Bihaću.




„Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Grada Bihaća"

- Svi uposlenici Laboratorije rade na razvoju i primjenjivanju sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018 u svim segmentima rada laboratorije. Laboratorija za vode AVP Sava posjeduje i koristi važeća izdanja standarda, kalibracije, učestvuje u programima međulaboratorijskog poređenja (interkalibracije) i raspolaže sa svim potrebnim certifikatima. Sektor laboratorija za vode je 22.12.2025., 23.12.2025. i 29.12.2025. godine imala ocjenjivanje na licu mjesta u svrhu drugog redovnog nadzora i proširivanja akreditacije, koje je provedeno u skladu sa pravilima i procedurama Sistema akreditiranja BiH (SABiH). Prema preliminarnom izvještaju o ocjenjivanju preporuka

tima za ocjenjivanje je potvrditi status odobrene akreditacije, uključujući izmjene, nakon otklanjanja utvrđenih neusklađenosti u dogovorenim rokovima, te odobriti proširivanje akreditacije za zahtijevano područje, uključujući izmjene, ali nakon otklanjanja utvrđenih neusklađenosti u dogovorenim rokovima.Sektor laboratorija za vode akreditovana je do sada za pedeset osam (58) metoda, odnosno osamdeset devet parametara (89). Prema svemu gore navedenom, sistem upravljanja u Laboratoriji za vode je u svemu usklađen sa zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018. Svi detalji vezani za akreditaciju i dodatak akreditaciji se nalaze na zvaničnoj web stranici Instituta za akreditiranje BiH (BATA) http://www.bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Dodaci/LI/LI-91-01.pdf.
Nakon otklanjanja utvrđenih neusklađenosti u dogovorenim rokovima, Sektor laboratorija za vode će biti akreditovana za šezdeset dvije (62) metode, odnosno devedeset tri parametra (93).

-U 2025. godini izrađen je i Plan monitoringa stanja voda na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH u 2026. godini. Odobreni Plan broj: 60-51-1/26 je dostavljen Sektorima 10, 20 i 60.
-Puno vremena i rada je uloženo u poslove koji su se odnosili na javnu nabavku (30 postupaka) kao što su istraživanje tržišta, tehničke specifikacije, pisanje odgovora na žalbe, učešće u projektima itd. Sektor 60 je, u 2025. godini, učestvovao u pripremi Plana integriteta AVP Sava, učestvovali u pripremi i donošenju prijedloga pravilnika i drugih akata. Uposlenici Sektora 60 su članovi interresornog stručnog tima projekta Unapređenje kvaliteta voda kroz istraživanje i mjere za upravljanje cvjetanjem mikroorganizama na akumulacijama Jablanica i Modrac u Federaciji Bosne i Hercegovine čiji je zadatak da pripremi i osmisli cjelovit projekt rješavanja problema, uključujući istraživanja te predlaganje i definiranje kratkoročnih i dugoročnih aktivnosti i mjera u svrhu otklanjanja problema cvjetanja te unapređenja stanja kvaliteta voda u akumulacijama/jezerima Federacije BiH. Ispred AVP Sava prisustvovali na sastanaku koji je organizovan povodom predstavljanja izvještaja „Okoliš Europe 2025" za regiju zapadnog Balkana, te održavanja dvodnevnih tematskih radionica u okviru projekta „Integrating Western Balkans into the Work of EEA and Eionet", posvećenih oblastima Zrak, Voda i Tlo. Radionice su bile prilika da zemlje razmotre postojeće stanje, identifikuju zajedničke izazove i definišu prioritete za narednu fazu saradnje s EEA. Za BiH važno je istaknut da se radi o projektu: "Technical assistance for countrywide reporting system related to international environmental obligations (EEA, EIONET, EUROSTAT and international conventions)" – enviR projekat.
Uposlenici Laboratorije se konstatno edusciraju i obučavaju kroz interne obuke i učešće na raznim seminarima, radionicama, a u 2025. godini su to bili:
-Trening kurs u okviru projekat ASAP (Adriatic Sensitive Areas Protection) - Čišćenje naftom onečišćene obale i odgovor na moru. Trening je izvodio ATRAC – Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora,
-Validacija procesa uzorkovanja i doprinos uzorkovanja u vrednovanoj mjernoj nesigurnosti metode – zahtjevi standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017
-Trening u Modriči, a u okviru aktivnosti izrade Studije o nanosu, vodi i bioti u slivu rijeke Save (SDIP Project-Phase I, World Bank and GEF supported), organizovan od strane ISRBC (International Sava River Basin Commission) u saradnji sa Institutom za vode Jaroslav Černi i Institutom za biološka istraživanja Siniša Stanković, a u okviru zadatka D. Projektnog zadatka: "D. Organizing a sediment, water and biota sampling campaing to demonstrate the monitoring of wáter, sediment and biota in accordance with the most appopriate protocols and methods defined for the Sava River basin).

-Prvi Forum za Studiju o sedimentu, vodi i bioti na slivu rijeke Save (First Stakeholder Forum for the Study on Sediment, Water and Biota in the Sava River Basin), koji se pratio online.
-Seminar povodom obilježavanja 150. godišnjice Shimadzu korporacije.
-Kako (ne) pisati nesukladnosti - On-line seminar CROLAB
-Radionica na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu na temu "Čišćenje naftom onečišćene obale (Oiled Shoreline Clean-up)
-Stručni Agilent seminar Spektroskopije i elementne analize, u organizaciji ALTIUM International
-Posjeta Institutu Superlab.
-Radionice – Čišćenje naftom onečišćene obale & Odgovor na moru (Oiled Shoreline Clean-up &At Sea Response)
-TRENING u okviru projekta ASAP (Adriatic Sensitive Areas Protection) od strane Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za saobraćaj i komunikacije.
-Trening u okviru Izrade Studije o nanosu, vodi i bioti u slivu rijeke Save (SDIP Project-Phase I, World Bank and GEF supported)
-Forum za Studiju o sedimentu, vodi i bioti na slivu rijeke Save (First Stakeholder Forum for the Study on Sediment, Water and Biota in the Sava River Basin) eksterna on line obuka
-Radionica - predstavljen nacrt dokumenta "Bosna i Hercegovina - Proces i prijedlog ciljeva u skladu sa Kunming-Montreal Globalnim okvirom za biološku raznolikost (GBF)"
-IPA III Water – WISE-6 putem platforme Microsoft Teams,
-Studijska posjeta Austriji, namijenjenoj stručnjacima iz zemalja Zapadnog Balkana.
-Radionice i radni sastanci Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Fonda za zaštitu okoliša FBiH, posvećenim implementaciji Federalne liste indikatora okoliša (KAV1 i ME1).
-Stručno savjetovanje na temu "Praktične primjene Zakona o zaštiti na radu",
-Sigurnost na Radu i Zaštita od Požara i Zaštita Okoliša – SAFE 2025",
-Završna radionicia WISE 5 i WISE 6, namijenjena NFP i Eionet stručnjacima u BiH,
-Radionica na kojoj je predstavilen nacrt dokumenta "Bosna i Hercegovina - Proces i prijedlog ciljeva u skladu sa Kunming-Montreal Globalnim okvirom za biološku raznolikost (GBF)" u okviru projekta "Podrška ranoj akciji za Globalni okvir biološke raznolikosti (Centralna i Istočna Evropa) – aktivnost za Bosnu i Hercegovinu" (eng. Support to Early Action for the Global Biodiversity Framework - Central and Eastern Europe - Bosnia and Herzegovina), finansiranog od strane Globalnog fonda za okoliš (eng. Global Environment Facility - GEF), uz tehničku i stručnu podršku Programa Ujedinjenih nacija za okoliš (eng. United Nations Environment Programme – UNEP).

Poslovi i aktivnosti Sektora za informacioni sistem voda (Sektor 70)

Sektor za Informacioni sistem voda provodi čitav niz aktivnosti iz svoje nadležnosti i zajedno sa drugim organizacionim jedinicama AVP Sava radi na korištenju, održavanju i daljem razvoju uspostavljenih sistema unutar AVP Sava (upravljanje vodama, planiranje, zaštita i korištenje voda, zaštita od voda, monitoring,...).
Kontinuirano, tokom čitave godine realizuju se aktivnosti na tekućem održavanju raspoloživih sistema:

1. Informacioni sistem voda
2. Hidrološki automatski monitoring sistem površinskih i podzemnih voda
3. Nacionalni sistem prognoze poplava (MIKE platforma)
4. Hidrološka platforma WISKI
5. Informatički sistemi

1. Informacioni sistem voda predstavlja osnovu i glavnu podršku kompletnom Upravljanju vodama, planiranju, kao i drugim segmentima rada AVP Sava. Informacioni sistem voda omogućava sistematično i kontinuirano skladištenje i obradu podataka, pregled, analizu, modeliranje i prezentaciju prostornih i ostalih informacija iz sektora voda u cilju ostvarenja strateških, planskih i operativnih zadataka od značaja za upravljanje vodama.
Prepoznavši važnu ulogu informacione tehnologije i razvijanja Informacionog sistema voda u unapređenju upravljanja vodama, uzimajući u obzir potrebe širokog kruga korisnika - privrednih i društvenih sektora koji su neposredno ili posredno vezani za vode i vodne eko sisteme, te uvažavajući zahtjeve međunarodne zajednice, razvojem informacionog sistema voda postiže se takav nivo informatizacije i tehničke osposobljenosti koja prati razvojna opredjeljenja i aktivnosti sektora voda, uvažava zatečeno stanje tehnologije, poštuje ustanovljene principe i uzima u obzir privredne mogućnosti i zahtjeve za uspostavom odgovarajućih informacionih i komunikacionih standarda u upravljanju vodama.
Razvoj Informacionog sistema voda u širem kontekstu podrazumijeva prostorno i vremensko sagledavanje problematike sektora voda uključujući višesektorski i višedisciplinarni pristup, kao i sagledavanje složenih dinamičkih i međusobno zavisnih procesa s kojima je sektor voda povezan, a odnose se na prirodno, društveno i privredno okruženje.
Kontinuirano održavanje uspostavljenog ISV-a te njegovo stalno unapređivanje i prilagođavanje, omogućava ispunjavanje obaveza AVP Sava, kako prema potrebama Sektora voda tako i potrebama na Nacionalnom nivou, te prema međunarodnim organizacijama (ICPDR, ISRBC, EC-EIONET) i sporazumima koje je potpisala BiH. Razvojem ISV-a pokriven je i dio ispunjavanja obaveza u skladu sa INSPIRE direktivnom EU na način da su podaci unutar ISV-a strukturirani tako da zadovolje principe Inspire direktive.

2. Hidrološki automatski monitoring sistem površinskih i podzemnih voda na kompletnom vodnom području rijeke Save na teritoriji Federacije BiH je u nadležnosti "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo, te se kontinuirano provodi u okviru redovnih aktivnosti AVP Sava. Prikupljanje podataka na terenu se vrši putem sistema automatskih stanica (hidroloških, padavinskih, tj. meteoroloških i stanica za praćenje nivoa podzemne vode) sa kontinuiranim praćenjem hidroloških i hidrometeoroloških parametara i putem vizuelnog praćenja vodostaja očitanjem vodomjernih letvi. Hidrološkim i meteorološkim monitoringom na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH su obuhvaćeni vodotoci I i II kategorije. U sistemu ISV-a prikupljaju se podaci sa ukupno 134 stanica (hidroloških 89, meteoroloških/padavinskih 23 i stanica za podzemne vode 28). Podaci prikupljeni sa mreže automatskih hidroloških i padavinskih stanica u nadležnosti AVP Sava se pored nacionalnih sistema dostavljaju i regionalnim i međunarodnim sistemima SAVA HIS-a i SAVA GIS-a, te DANUBE HIS-u i DANUBE GIS-u kao i EFAS sistemu. Dostavljanje ovih podataka u realnom vremenu je od suštinske važnosti za rad regionalnih sistema prognoze poplava. AVP Sava je jedna od institucija koje obezbjeđuju podatke za ove regionalne sisteme i zajednički sa institucijama iz drugih država omogućava pravilan rad ovih sistema.
Jedna od obaveza i potreba AVP Sava je provođenje monitoringa voda, što podrazumijeva i redovna hidrometrijska mjerenja na vodotocima. Hidrometrija snabdijeva hidrologiju bazičnim podacima na osnovu kojih se donose inženjerske odluke. Aktivnosti na hidrometrijskim mjerenjima za potrebe "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo su redovne aktivnosti koje se vrše kontinuirano, svaku godinu za redom, već duži niz godina shodno raspoloživim finansijskim mogućnostima.

AVP Sava je Pravilnikom o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka („Službene novine FBiH" broj 04/13, 56/16, 62/19 i 63/22) dobila u obavezu da obezbjedi prikaz podataka, sa stanica postavjenih od strane korisnika, nadležnim Inspekcijskim organima vezano za podatke o ekološki prihvatljivom protoku za vodozahvate. Tu obavezu AVP Sava je tehnički pripremila i omogućila prikaz dostavljenih podataka putem hidrološkog sistema Wiski, putem web aplikacije vodostaji.voda.ba.

3. Redovno se obavljaju i aktivnosti u cilju ispunjavanja obaveza AVP Sava po članu 91. ZOV-a. Platforme za hidrološko-hidrauličku prognozu predstavljaju dio sistema ranog upozorenja od poplava kao nestrukturna mjera koja omogućava pravovremeno sagledavanje najavljenih hidrološko-hidrauličkih uslova na terenu, te blagovoremeno davanje informacije nadležnim institucijama koje provode aktivnosti na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara, kao i javnosti. Glavni cilj uspostave platforme na Nacionalnom nivou je, osim programa jačanja kapaciteta, izrada operativnog sistema za predviđanje poplava na glavnim podbazenima vodnog područja rijeke Save u BiH: podbazen rijeke Une sa Sanom u BiH, te podbazen rijeka Vrbas i Bosna, Ukrine, Brke i Tinje. Sistem je razvijen istom metodologijom kao slovenski i hrvatski sistem za predviđanje poplava u realnom vremenu. Ovaj sistem uključuje razmjenu podataka u realnom vremenu, koji pružaju prognozu protoka i vodostaja i podatke o količini padavina po satu u realnom vremenu.

Pored redovnog praćenja i održavanja, dodatno se razvija i poboljšava nacionalni sistem prognoze poplava za glavne podbazene na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, te aktivno učestvuje u radu regionalne platforme za prognozu poplava na slivu rijeke Save pod okriljem Savske komisije. Glavni cilj regionalnog sistema je razvoj i uspostavljanje integrisanog sistema za prognoziranje i upozorenje na poplave u stvarnom vremenu u cijelom slivu rijeke Save (tzv. Sava FFWS), kojim zajednički upravljaju i koga zajednički održava 5 zemalja sliva rijeke Save (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Srbija i Slovenija) u bliskoj saradnji, koordinaciji i podršci Sekretarijata Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (ISRBC).

4. Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo za potrebe rada i funkcioniranja prikupljanja, obrade, analize i distribucije hidrološko-meteoroloških podataka sa automatskog hidrološkog monitoring sistrema u okviru Informacionog sistema voda (ISV) kao osnovu koristi WISKI softversku platformu. Obzirom da se radi o softverskoj platformi koja predstavlja osnovu hidrološkog sistema kontinuirano se vrši održavanje sistema na godišnjem nivou, kao i unapređenje aplikativnih rješenja koja su uspostavljena.

5. Značaj informatičke podrške sistemima AVP Sava, nabavka i razvoj računarske opreme, printera, mreže, mutlimedijalne sale, laptopa, softvera, online meetinga, zatim realizacija aktivnosti po pitanju serverske infrastrukture, računarske i mrežne opreme za potrebe AVP Sava, realizacija aktivnosti po pitanju sisgurnosnih i backup sistema unutar AVP Sava, realizacija aktivnosti po pitanju internet i komunikacionih usluga za potrebe AVP Sava te web stranica AVP Sava.
Pored navedenih glavnih aktivnosti, Sektor za Informacioni sistem voda aktivno realizuje i sljedeće:

- učešće u pripremi i donošenju prijedloga pravilnika i drugih akata od značaja za segment informacioni sistem voda;
- implementacija strategije upravljanja vodama i plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH iz segmenta informacionog sistema voda;

- implementacija plana upravljanja poplavnim rizikom za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH iz segmenta informacionog sistema voda;
- učešće u poslovima i zadacima vezanim za ispunjavanje obaveza po osnovu međunarodnih bilateralnih i multilateralnih sporazuma, ugovora i konvencija;
- učešće u radu međunarodnih radnih grupa, komisija i stručnih tijela;
- provođenje mjere odbrane od poplava u skladu sa FOP-om;
- dostava podataka i dokumentacije po zahtjevu u postupku koji provodi nadležni federalni ili kantonalni vodni ili okolišni inspektor;
- učešće u realizaciji projekata koji se odnose na segment informacionog sistema voda finansiranih od strane međunarodnih finansijskih institucija;
- praćenje rezultata monitoringa zagađivača na vodnom području.

Poslovi i aktvnosti Sektora za pravne poslove (Sektor 80)

Sektor za pravne poslove osnovan je u toku 2025. godine kao mlad i razvojni sektor, s ciljem unapređenja pravne sigurnosti, zakonitosti rada i efikasnog funkcionisanja AVP Sava. Sektor je započeo sa operativnim radom u oktobru 2025. godine, te je izvještajni period obuhvatio tromjesečni dio godine, tokom kojeg su postavljeni temelji za njegov dalji razvoj i stabilno funkcionisanje.
U okviru Sektora za pravne poslove djeluju dvije unutrašnje organizacione jedinice:

- Služba za javne nabavke, i
- Služba za pravne, kadrovske i opće poslove.

Osnivanjem Sektora stvoreni su uslovi za centralizovano i sistematično obavljanje poslova iz oblasti pravnih poslova, javnih nabavki, radnih odnosa, kadrovske evidencije i općih administrativnih poslova, čime je značajno unaprijeđena organizacija rada i usklađenost sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima.
Tokom početnog perioda rada, aktivnosti Sektora bile su usmjerene na uspostavljanje unutrašnje organizacije, definisanje nadležnosti i radnih procedura, kao i na pružanje pravne i administrativne podrške drugim organizacionim jedinicama. Poseban akcenat stavljen je na analizu postojećih akata, identifikovanje potreba za njihovim usklađivanjem sa propisima, te na inicijalno planiranje i provođenje postupaka javnih nabavki.

Iako je izvještajni period bio vremenski ograničen, Sektor je ostvario značajne početne rezultate koji predstavljaju dobru osnovu za dalje unapređenje rada u narednom periodu. Rad Sektora u 2025. godini obilježen je fazom uspostavljanja, prilagođavanja i razvoja, uz jasno definisane pravce djelovanja i kontinuirano jačanje administrativnih i pravnih kapaciteta.
U izvještajnom periodu**,** Odlukom broj: 80-649-20/25 od 07.11.2025. godine**,** usvojen je Plan integriteta Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo, broj: 50-649-16/25 od 11.07.2025. godine.
U skladu sa navedenom odlukom i u cilju unaprjeđenja organizacije rada i usklađivanja sa važećim zakonodavstvom, pokrenuti su postupci za donošenje novog Statuta AVP Sava, kao i izrada Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Ovi postupci predstavljaju ključne korake u institucionalnom jačanju i uspostavljanju funkcionalnog pravnog i organizacionog okvira AVP Sava, s ciljem efikasnijeg upravljanja resursima i osiguranja zakonitog i transparentnog rada u skladu sa principima dobre uprave i integriteta.
U istom periodu, Sektor je pokrenuo postupke usklađivanja rada AVP Sava sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, u cilju osiguranja zakonitog, transparentnog i sigurnog postupanja sa ličnim podacima zaposlenih, korisnika i trećih lica. Ove aktivnosti uključuju identifikaciju obima

ličnih podataka, izradu internih akata i procedura, te implementaciju odgovarajućih tehničkih i organizacionih mjera zaštite, u skladu sa zahtjevima novog zakonodavnog okvira.
Navedeni postupci predstavljaju ključni korak u institucionalnom jačanju sistema zaštite ličnih podataka i osiguranju usklađenosti poslovanja AVP Sava sa važećim propisima, uz unapređenje povjerenja i sigurnosti svih korisnika i zaposlenih.
U narednom periodu očekuje se dalje jačanje uloge Sektora za pravne poslove, unapređenje internih procedura, povećanje efikasnosti u radu, kao i snažniji doprinos zakonitom, transparentnom i odgovornom poslovanju sektora u cjelini.

Služba za javne nabavke

Služba za javne nabavke je do oktobra 2025. godine bila organizaciono pozicionirana u okviru Sektora za ekonomske i pravne poslove, nakon čega je, uspostavljanjem Sektora za pravne poslove, nastavila sa radom u okviru novoformiranog sektora.
Prilikom izrade Plana nabavki za 2025. godinu, uvažene su preporuke Nadzornog odbora AVP Sava, te je ukupan broj javnih nabavki smanjen sa 133 (2024. godina) na 68 (2025. godina), dok je broj direktnih sporazuma sveden sa 4% u 2024. godini na 1% u 2025. godini, a nakon usvajanja stavke C. Plana i Finansijskog plana za 2025. godinu i provedenih nabavki, taj broj je bio cca 0,5%.
Tokom početne faze rada, izvršena je analiza postojećeg stanja u oblasti javnih nabavki, uključujući pregled ranije započetih ili planiranih postupaka, kao i identifikacija potreba organizacionih jedinica. Posebna pažnja posvećena je inicijalnom planiranju nabavki za naredni period.
U izvještajnom periodu, aktivnosti Službe bile su usmjerene na uspostavljanje organizacionih i proceduralnih osnova za zakonito i efikasno provođenje postupaka javnih nabavki, u skladu sa važećim propisima.
Služba je pružala stručnu i savjetodavnu podršku drugim organizacionim jedinicama u vezi sa primjenom propisa iz oblasti javnih nabavki, tumačenjem procedura i pripremom dokumentacije. Također su preduzimane aktivnosti na uspostavljanju evidencija i interne kontrole postupaka javnih nabavki, s ciljem osiguranja transparentnosti, zakonitosti i racionalnog trošenja sredstava.
Tokom 2025. godine, Služba za javne nabavke dodatno je ojačana prijemom novih zaposlenih, čime su unaprijeđeni kadrovski kapaciteti i stvoreni uslovi za kvalitetnije i efikasnije obavljanje poslova iz svoje nadležnosti. Popunjavanjem radnih mjesta u skladu sa aktom o sistematizaciji i raspodjelom poslova prema stručnim kompetencijama zaposlenih, Služba je dostigla zadovoljavajući nivo kapacitiranosti, što je imalo direktan pozitivan efekat na organizaciju rada i ukupnu efikasnost Službe.
Imajući u vidu činjenicu da je prelazak u novi sektor realizovan u posljednjem kvartalu 2025. godine, može se konstatovati da je Služba za javne nabavke uspješno obezbijedila organizacionu stabilnost, očuvala kontinuitet rada i postavila čvrste temelje za dalji razvoj i unapređenje sistema javnih nabavki u narednom periodu**.**
U nastavku izvještaja prezentuju se tabelarni prikazi koji sadrže pregled svih postupaka javne nabavke pokrenutih u toku 2025. godine na nivou AVP Sava.
Tabelarni prikaz 1. daje sistematizovan pregled ukupnog broja pokrenutih postupaka javne nabavke, razvrstanih prema nazivu postupka i vrsti nabavke (robe, usluge i radovi), sa obuhvatom podataka zaključno sa 5. januarom 2026. godine.

Tabelarni prikaz 2. daje pregled ukupnog broja pokrenutih postupaka javne nabavke u 2025. godini, razvrstanih prema nazivu postupka i prema sektorima AVP Sava koji su inicirali predmetne postupke.

NAPOMENA: Pregled obuhvata pokrenutih postupka javnih nabavki i stanje istih sa zaključnim datumom 5.1.2026. godine.

- **Tabelarni prikaz 1.** Obuhvata ukupan Broj svih **pokrenutih** postupka javne nabavke u 2025. godini po nazivu postupka javne nabavke, i po vrsti nabavke (Robe/Usluge/Radovi) na nivou AVP Sava.

Ukupni broj svih pokrenutih postupaka po vrsti postupka	
Otvoreni postupak	50
Pregovarački postupak bez objave obavještenja	-
Direktni sporazum	32
Konkurentski zahtjev	7
Neprioritetne usluge	2
Ukupno	**91**

Ukupan broj postupaka po vrsti nabavke	
Robe	30
Usluge	55
Radovi	6
Ukupno	**91**

- **Tabelarni prikaz 2.** Obuhvata ukupan Broj svih **pokrenutih** postupka javne nabavke u 2025. godini po nazivu postupka javne nabavke, te sektorima koji su pokrenuli iste na nivou AVP Sava.

Pokrenuti postupci po Sektorima/Vrsta postupka javne nabavke	Sek 01	Sek 10	Sek 20	Sek 30	Sek 50	Sek 60	Sek 70	Sek 80	UKUPNO
Otvoreni postupak	-	1	2	13	10	16	7	1	50
Pregovarački postupak	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Direktni sporazum	-	4	-	-	10	14	4	-	32
Konkurentski zahtjev	-	3	-	3	1	-	-	-	7
Neprioritetne usluge	-	-	-	-	2	-	-	-	2
Ukupno	**-**	**8**	**2**	**16**	**23**	**30**	**11**	**1**	**91**

- **Pregled postupaka javne nabavke u kojima je izjavljena žalba u 2025. godini.**

Red. Br.	App. Br.	Opis i Naziv postupka	Vrsta postupka	Procijenjena vrijednost	Vrsta žalbe – Naziv ponuđača	Ugovoren DA/NE	Broj i datum Ugovora
	9	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala, materijala za održavanje čistoće 2 LOT-a.	Otvoreni postupak	100.000,00	Nakon I Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2: AERO EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo, koji nije dostavio popratnu dokumentaciju za član. 45 slijedi preporuka UO za izbor drugorangiranog ponuđača za LOT 2 : DEFTER d.o.o. Sarajevo. Nakon čega UO donosi II Odluku poništenju I Odluke i izboru najpovoljnijeg za LOT 2 kojom se bira drugorangirani ponuđač: DEFTER d.o.o. Sarajevo U međuvremenu je navedeni ponuđač izjavio žalbu na I Odluku, ali je zatim odustao od svoje žabe jer je II Odlukom izabran kao najpovoljniji ponuđač. Okvirni sporazum vrijeme trajanja od 29.9.2025 do 29.9.2029 godine.		
1	9_2	**LOT 2: Nabavka i isporuka materijala za održavanje čistoće.**	**LOT 2**	**40.000,00**		DA	50-689-41/25 29.9.2025
	67	Nabavka laboratorijske opreme u Sektoru laboratorija za vode 3 LOT-a.	Otvoreni postupak	128.000,00	Ponuđač: MPS LAB d.o.o. Sarajevo izjavio Žalbu na Odluku o izboru broj 60-758-29/25 na LOT 3 AVP Sava RJEŠENjE Djelimično se usvaja žalba ponuđača MPSLAB d.o.o Sarajevo poništava se odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br: 60-758-29/25 od 3.9.2025 godine Ponuđač EURO LAB d.o.o. Bijeljina nije dostavio uvjerenje o likvidnosti za transakciski račun, te se bira drugorangirani APICAL d.o.o.Sarajevo. Nakon čega je komisija ustanovila da i ponuđač APICAL d.o.o.Sarajevo nije dostavio dodatnu dokumentaciju vezanu za finansijsku sposobnost te donosi preporuku o poništenju rješenja i donošenju nove odluke o izboru kojom se bira ponuđač: MPSLAB d.o.o Sarajevo		
2	67_3	**LOT 3 - Nabavka termometara i termohigrometara za provjere u Laboratoriji za vode.**	**LOT 3**	**5.000,00**		DA	60-758-54/25 5.11.2025
	74	Studija stanja podzemnih voda vodnog područja rijeke Save u Federacije BiH i procjena rizika po kvalitet i rezerve podzemnih voda.	Otvoreni postupak	1.700.000,00	Žalba na Odluku o izboru za LOT 1 i LOT 3 izjavljena od strane ponuđača: ALTIUM INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo ZAKLJUČAK URŽ-a LOT 1 i LOT 3 - Obustavlja se postupak pokrenut po žalbi ALTIUM INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo jer je žalitelj odustao od svoje Žabe.		
	74_1	**LOT 1 - Nabavka gasnog hromatografa sa FPD detektorom.**	**LOT 1**	**85.470,10**			
3	74_3	**LOT 3 - Nabavka jonskog hromatografa.**	**LOT 3**	**213.675,21**		NE	Poništen L1 Poništen L3
Ukupan broj Postupaka javne nabavke u kojima je izjavljena Žalba iznosi :							**3**

- Pregled pokrenutih postuoaka javne nabavke **-otvoreni postupak** u 2025. godini.

Red. Br.	App. Br.	Opis i Naziv postupka	Procijenjena vrijednost	1 – robe 2 – usluge 3 - radovi	Vrsta postupka	LOT	Naziv ponuđača	Vrijednost ugovora (sa PDV-om)	Broj i datum Ugovora
1	45	Ažuriranje Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022-2027.)	1.025.000,00	2	Otvoreni postupak	NE	GRUPA PONUĐAČA ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo i INSTITUT ZA HIDROTEHNIKU d.d. Sarajevo	1.198.044,90	20-423-14/25 28.7.2025
2	46	Ihtiološka istraživanja sliva rijeke Save u Federaciji BiH u 2025. godini	170.900,00	2	Otvoreni postupak	NE	UNIVERZITET U SARAJEVU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET Sarajevo	199.953,00	20-424-16/25 29.5.2025
3	55	Izvođenje radova 2 LOT-a.	1.281.000,00	3	Otvoreni postupak	1	GRADNJA 1 d.o.o. Tešanj	699.066,08	30-604-17/25 5.8.2025
						2	GRADNJA 1 d.o.o. Tešanj	798.947,32	30-604-18/25 8.8.2025
4	52	Izrada projektne dokumentacije 5 LOT-ova:	59.400,00	2	Otvoreni postupak	1	LOT 1 - SPREČA d.d. Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost Tuzla	3.582,00	30-603-51/25 7.8.2025
						2	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO IG d.o.o. Banja Luka	7.999,00	30-603-52/25 8.8.2025 Raskid ugovora
						3	RADIS d.o.o. Istočno Sarajevo	4.400,00	30-603-53/25 22.8.2025
						4	TEAM HIDRO d.o.o. Sarajevo	9.350,00	30-603-54/25 4.8.2025
						5	RADIS d.o.o. Istočno Sarajevo	9.400,00	30-603-55/25 22.8.2025 Raskid ugovora
5	60	Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektima 2 LOT-a:	26.000,00	2	Otvoreni postupak	1	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	0,01	30-606-41/25 20.8.2025
						2	RADIS d.o.o. Istočno Sarajevo	0,01	30-606-42/25 20.8.2025

Red. Br.	App. Br.	Opis i Naziv postupka	Procijenjena vrijednost	1 – robe 2 – usluge 3 - radovi	Vrsta postupka	LOT	Naziv ponuđača	Vrijednost ugovora (sa PDV-om)	Broj i datum Ugovora
6	16	Nabavka specijalnih plinova za potrebe rada analitičke opreme u Laboratoriji za vode	15.000,00	1	Otvoreni postupak	NE	Na protokol Agencije nije pristigla nijedna ponuda za predmetnu nabavku do roka za dostavljanje ponuda. Postupak javne nabavke poništen.	0,00	Poništen
7	15	Nabavka hemikalija i standarda za kalibraciju i provjeru u Laboratoriji za vode 4 LOT-a	60.000,00	1	Otvoreni postupak	1	KEFO d.o.o. Istočno Sarajevo	22.581,00	60-619-29/25 21.8.2025
						2	KEFO d.o.o. Istočno Sarajevo	23.388,29	60-619-30/25 21.8.2025
						3	KEFO d.o.o. Istočno Sarajevo	2.340,00	60-619-31/25 21.8.2025
						4	MIKRO+POLO d.o.o. Sarajevo	5.756,40	60-619-32/25 15.9.2025
8	14	Nabavka potrošnog materijala u Laboratoriji za vode 3 LOT-a:	51.000,00	1	Otvoreni postupak	1	KEFO d.o.o. Istočno Sarajevo	46.607,11	60-617-33/25 18.8.2025
						2	KEFO d.o.o. Istočno Sarajevo	5.265,00	60-617-34/25 18.8.2025
						3	KEFO d.o.o. Istočno Sarajevo	5.819,58	60-617-35/25 18.8.2025
9	57	Vršenje usluga revizije na projektima koji su ugovoreni u 2024. godini 4 LOT-a:	4.000,00	2	Otvoreni postupak	1	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO IG d.o.o. Banja Luka	348,00	30-605-36/25 8.10.2025
						2	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO IG d.o.o. Banja Luka	476,00	30-605-37/25 8.10.2025
						3	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	614,00	30-605-33/25 10.9.2025
						4	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	690,00	30-605-34/25 10.9.2025
10	4	Održavanje web portala i mail servera za potrebe AVP Sava	61.600,00	2	Otvoreni postupak	NE	Postupak javne nabavke poništen, dvije ponude koje su pristigle na protokol su neprihvatljive.	0,00	Poništen
11	41	Zbrinjavanje opasnog otpada	17.094,00	2	Otvoreni postupak	NE	C.I.A.K. d.o.o. Sarajevo	19.888,83	60-1172-13/25 18.11.2025
12	26	Validacija, servis i nabavka dijelova AMA 254 analizatora	10.000,00	2	Otvoreni postupak	NE	Na protokol Agencije nije stigla nijedna ponuda te se postupak javne nabavke poništava.	0,00	Poništen
13	9	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala, materijala za održavanje čistoće 2 LOT-a.	100.000,00	1	Otvoreni postupak	1	DEFTER d.o.o. Sarajevo Okvirni sporazum	69.911,89	50-689-40/25 22.9.2025
						2	DEFTER d.o.o. Sarajevo **Okvirni sporazum**	46.701,49	50-689-41/25 29.9.2025
14	29	Usluge popravke i održavanja vozila Volskwagen	40.000,00	2	Otvoreni postupak	NE	KARE d.o.o Sarajevo **Okvirni sporazum**	37.440,00	50-691-15/25 14.11.2025

Red. Br.	App. Br.	Opis i Naziv postupka	Procijenjena vrijednost	1 – robe 2 – usluge 3 - radovi	Vrsta postupka	LOT	Naziv ponuđača	Vrijednost ugovora (sa PDV-om)	Broj i datum Ugovora
15	23	Nabavka usluga održavanja i čiščenja područnih ureda 2 LOT-a.	24.000,00	2	Otvoreni postupak	1	Od ovog postupka se odustaje u cijelosti, jer se naknadno utvrdilo na osnovu ranije sprovedenih postupaka za iste usluge mogu samo vršiti manja obrtnička društva, te da je potrebno izmjeniti planirano trajanje ugovora, a samim tim i procjenjenu vrijednost nabavke, isti će se dakle sprovesti kao Direktni sporazum za period od 12 mjeseci pod red. br.: 109.	0,00	Poništen
16	38	Nabavka usluga oglašavanja u dnevnim listovima 2 LOT-a.	112.000,00	2	Otvoreni postupak	1	O MEDIA d.o.o. Sarajevo **Okvirni sporazum**	80.086,50	50-692-22/25 8.9.2025
						2	Za LOT 2 na protokol Agencije nije pristigla nijedna ponuda za predmetnu nabavku do roka za dostavljanje ponuda.	0,00	Poništen L
17	67	Nabavka laboratorijske opreme u Sektoru laboratorija za vode 3 LOT-a.	28.000,00	1	Otvoreni postupak	1	LOT 1 Poništen ponuđači nisu dostavili popratnu dokumentaciju nakon odluke. (dvije odluke i preporuka)	0,00	Poništen L
						2	LOT 2 Poništen ponuđači nisu dostavili popratnu dokumentaciju nakon odluke. (tri odluke)	0,00	Poništen L
						3	MPS LAB d.o.o. Sarajevo	5.827,51	60-758-54/25 5.11.2025
18	50	Unapređenje postojeće WISKI WEB PUBLIC aplikacije za prikaz hidroloških podataka	20.500,00	2	Otvoreni postupak	NE	Ugovor u fazi potpisivanja nije vraćen u službu. KISTERS AG Aachen	23.985,00	U fazi potpisivanja.
19	27	Servis i održavanje električnih aparata/instrumenat i kontrola i servis tehničke ispravnosti digestora u Laboratoriji za vode 3 LOT-a	19.000,00	2	Otvoreni postupak	1	Za LOT 1 na protokol Agencije nije pristigla nijedna ponuda za predmetnu nabavku do roka za dostavljanje ponuda.	0,00	Poništen L
						2	APICAL d.o.o. Sarajevo	7.020,00	60-847-14/25 17.9.2025
						3	Za LOT 3 na protokol Agencije nije pristigla nijedna ponuda za predmetnu nabavku do roka za dostavljanje ponuda.	0,00	Poništen L

Red. Br.	App. Br.	Opis i Naziv postupka	Procijenjena vrijednost	1 – robe 2 – usluge 3 - radovi	Vrsta postupka	LOT	Naziv ponuđača	Vrijednost ugovora (sa PDV-om)	Broj i datum Ugovora
20	18	Nabavka i ugradnja potrošnog materijala za postojeći aparat za ultračistu vodu proizvođača Merk (Ultrapure water Systems Milii-Q EQ 7008/7016)	15.000,00	1	Otvoreni postupak	NE	ALTIUM INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo	17.421,30	60-800-11/25 12.9.2025
21	11	Nabavka auto guma	24.000,00	1	Otvoreni postupak	NE	Ove godine nije bilo potrebe za novim gumama, a u međuvremenu se vršila nabavka novog vozila pa je procjenjeno da će se iduće godine u nabavci uzeti u obzir i novonabavljeno auto.	0,00	Poništen int.
22	66	Nabavka i nadogradnja postojeće analitičke opreme TOC-V serije i LC-20AT proizvođača Shimadzu u Laboratoriji za vode	35.000,00	1	Otvoreni postupak	NE	SHIMADZU d.o.o. Sarajevo	34.686,58	60-1005-11/25 1.10.2025
23	70	Nabavka specijalnih plinova za potrebe rada analitičke opreme u Laboratoriji za vode (ponovljeni postupak)	15.000,00	1	Otvoreni postupak	NE	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	14.736,24	60-1004-11/25 10.10.2025
24	71	Održavanje web portala i mail servera za potrebe AVP Sava (ponovljeni postupak)	61.600,00	2	Otvoreni postupak	NE	Na protokol Agencije nije pristigla nijedna ponuda za predmetnu nabavku do roka za dostavljanje ponuda.	0,00	Poništen
25	37	Nabavka usluga održavanja službene Facebook stranice AVP Sava	24.000,00	2	Otvoreni postupak	NE	Odluka o izboru trećerangiranog ponuđača u fazi potpisivanja: REPRESENT COMMUNICATIONS d.o.o. Sarajevo	22.113,00	Odluka o izboru u fazi potpisivanja
26	7	Nabavka usluga vodovoda i kanalizacije - 3 LOT-a	18.000,00	2	Otvoreni postupak	1 2 3	Postupak poništen u cijelosti. Prilikom istraživanja tržišta, u direktnom kontaktu sa ponuđačom dobili smo informaciju od KJKP VIK da ne dostavljaju ponude s obzirom da su im računi blokirani. Nabavka će biti provedena naredne godine.	0,00	Poništen int.
27	53	Izvođenje radova 7 LOT-ova.	3.769.190,00	3	Otvoreni postupak	1 2 3	GRADNJA 1 d.o.o. Tešanj IZGRADNJA TOJAGA d.o.o. Mostar GRUPA PONUĐAČA: ŠPIC BETON d.o.o. Zenica i MIBRAL d.o.o. Sarajevo	999.942,66 447.731,95 1.598.220,00	30-1141-34/25 22.10.2025 30-1141-42/25 7.11.2025 30-1141-43/25 3.11.2025

Red. Br.	App. Br.	Opis i Naziv postupka	Procijenjena vrijednost	1 – robe 2 – usluge 3 - radovi	Vrsta postupka	LOT	Naziv ponuđača	Vrijednost ugovora (sa PDV-om)	Broj i datum Ugovora
						4	STRUKTURA d.o.o. Jajce	617.759,99	30-1141-44/25 31.10.2025
						5	ROADING d.o.o. Gračanica	458.689,14	30-1141-45/25 10.11.2025
						6	STRUKTURA d.o.o. Jajce	99.501,41	30-1141-46/25 31.10.2025
						7	GRADNJA 1 d.o.o. Tešanj	98.857,40	30-1141-35/25 23.10.2025
28	74	Nabavka analitičke opreme: GC/FPD, TOC/TN i IC za potrebe Laboratorije za vode 3 LOT-a.	427.350,43	1	Otvoreni postupak	1	Žalba, nije potpisan ugovor LOT 1	0,00	Poništen L1
						2	SHIMADZU d.o.o. Sarajevo	108.225,00	60-1137-28/25 27.11.2025
						3	Žalba, nije potpisan ugovor LOT 3	0,00	Poništen L3
29	75	Nabavka laboratorijske opreme potrebne za rad u Laboratoriji za vode 5 LOT-ova.	117.948,72	1	Otvoreni postupak	1	APICAL d.o.o. Sarajevo	39.930,93	60-1142-34/25 28.11.2025
						2	BORGIOT d.o.o. Sarajevo	3.744,00	60-1142-35/25 1.12.2025
						3	EURO LAB d.o.o. Bijeljina	23.388,30	60-1142-36/25 10.12.2025
						4	ALTIUM INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo	19.890,00	60-1142-37/25 27.11.2025
						5	EURO LAB d.o.o. Bijeljina	12.870,00	60-1142-38/25 10.12.2025
30	72	Nabavka uređaja za analizu metala ICP/MS	341.880,00	1	Otvoreni postupak	NE	ALTIUM INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo	194.454,00	60-1138-19/25 13.11.2025
31	80	Glavni projekat izrade pragova u koritu rijeke Usore u cilju poboljšanja vodosnabdjevanja Općine Tešanj	21.360,00	2	Otvoreni postupak	NE	HIGRACON d.o.o. Sarajevo	9.945,00	30-1174-18/25 29.10.2025
32	73	Nabavka terenskog motornog vozila	128.205,00	1	Otvoreni postupak	NE	GRAND AUTOMOTIVE d.o.o. Sarajevo	120.000,00	60-1157-11/25 7.10.2025
33	76	Validacija, servis i nabavka dijelova AMA 254 analizatora (ponovljeni postupak)	10.000,00	2	Otvoreni postupak	NE	LABEKO d.o.o. Jastrebarsko	8.997,40	60-1166-11/25 30.10.2025
						1	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	4.095,00	30-1202-61/25 13.11.2025
						2	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	3.510,00	30-1202-62/25 13.11.2025
						3	HIGRACON d.o.o. Sarajevo	7.956,00	30-1202-63/25 14.11.2025
34	82	Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektima 7 LOT-ova.	75.270,00	2	Otvoreni postupak	4	RADIS d.o.o. Istočno Sarajevo	3.311,10	30-1202-64/25 14.11.2025

Red. Br.	App. Br.	Opis i Naziv postupka	Procijenjena vrijednost	1 – robe 2 – usluge 3 - radovi	Vrsta postupka	LOT	Naziv ponuđača	Vrijednost ugovora (sa PDV-om)	Broj i datum Ugovora
						5	IBIS d.o.o. Zavidovići	2.866,50	30-1202-65/25 17.11.2025
						6	RADIS d.o.o. Istočno Sarajevo	1.053,00	30-1202-66/25 14.11.2025
						7	RADIS d.o.o. Istočno Sarajevo	1.053,00	30-1202-67/25 14.11.2025
35	77	Nabavka i ugradnja novih klima uređaja.	23.094,00	1	Otvoreni postupak	NE	ICE-NET d.o.o. Sarajevo	18.133,83	60-1197-21/25 19.12.2025
36	78	Nabavka padavinskih/kišomjernih i hidroloških stanica	85.470,00	1	Otvoreni postupak	NE	ALEM SISTEM d.o.o. Sarajevo	99.999,90	70-1195-11/25 2.12.2025
37	65	Nabavka računarske opreme	67.735,00	1	Otvoreni postupak	NE	PING d.o.o. Sarajevo	79.220,70	70-1185-15/25 3.12.2025
38	81	Regulacija rijeke Željeznice u Otesu na dionici od P16 – P23, Općina Ilidža	1.598.290,00	3	Otvoreni postupak	NE	Grupa ponuđača: HARYSCO d.o.o. Sarajevo i EKO-EURO TIM d.o.o. Banja Luka	1.776.888,36	30-1231-25/25 7.11.2025
39	2	Nabavka električne energije 2 LOT-a	200.000,00	1	Otvoreni postupak	1	ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo	27.417,72	50-1196-17/25 1.12.2025
						2	Za LOT 2 na protokol Agencije nije pristigla nijedna ponuda za predmetnu nabavku do roka za dostavljanje ponuda.	0,00	Poništen L
40	87	Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektu Regulacija rijeke Željeznice u Otesu na dionici od P16 – P23, Općina Ilidža	31.965,80	2	Otvoreni postupak	NE	RADIS d.o.o. Istočno Sarajevo	7.371,00	30-1288-18/25 26.11.2025
41	39	Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja u 2025. godini	27.000,00	2	Otvoreni postupak	NE	Zapisnik i Odluka poslani ponuđačima. Najpovoljniji ponuđač: REcons d.o.o. Sarajevo	28.080,00	Žalbeni rok u toku.
42	93	Održavanje web portala i mail servera za potrebe AVP Sava (III ponovljeni postupak)	21.000,00	2	Otvoreni postupak	NE	ĐIKIĆ d.o.o. Sarajevo	24.570,00	70-1343-12/25 10.12.2025
43	3	Nabavka i isporuka prirodnog gasa.	20.000,00	1	Otvoreni postupak	NE	Izabran ponuđač: KJKP SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo	17.560,73	Potpis ugovora u toku.
						1	Izabran ponuđač:ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	1.500,00	Potpis ugovora u toku.
						2	Izabran ponuđač:ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	1.000,00	Potpis ugovora u toku.
44	98	Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na obezbjeđenju proticajnog profila na 3 LOT-a.	15.710,00	2	Otvoreni postupak	3	Izabran ponuđač:ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	600,00	Potpis ugovora u toku.

Red. Br.	App. Br.	Opis i Naziv postupka	Procijenjena vrijednost	1 – robe 2 – usluge 3 - radovi	Vrsta postupka	LOT	Naziv ponuđača	Vrijednost ugovora (sa PDV-om)	Broj i datum Ugovora
						1	LOT 1 se poništava u skladu sa članom 69. stav (3) (neusklađenost procjenjene vrijednosti)	0,00	Poništen L
						2	Izabran ponuđač: TERMO-BETON d.o.o. Breza	292.500,00	30-1459-24/25 12.1.2026
45	95	Obezbjeđenje proticajnog profila na 3 LOT-a.	786.320,00	3	Otvoreni postupak	3	Izabran ponuđač: ROADING d.o.o. Gračanica	215.514,00	30-1459-25/25 12.1.2026
						1	Izabran ponuđač: STRUKTURA d.o.o. Jajce	495.833,80	Potpis ugovora u toku.
46	84	Izvođenje radova 2 LOT-a.	615.380,00	3	Otvoreni postupak	2	Izabran ponuđač: STRUKTURA d.o.o. Jajce	216.467,06	Potpis ugovora u toku.
47	97	Ažuriranje preliminarne procjene rizika od poplava na vodnom području rijeke Save i Jadranskog mora u Federaciji BiH.	260.000,00	2	Otvoreni postupak	NE	INSTITUT ZA HIDROTEHNIKU d.d. Sarajevo	304.200,00	10-1399-20/25 6.1.2025
						1	RADIS d.o.o. Istočno Sarajevo	4.914,00	30-1458-18/25 6.1.2026
48	62	Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektima 2 LOT-a.	21.400,00	2	Otvoreni postupak	2	RADIS d.o.o. Istočno Sarajevo	1.638,00	30-1458-18/25 6.1.2026
49	40	Nabavka usluga "Procjena rizika na radnim mjestima u Agenciji za vodno područje rijeke Save"	30.000,00	2	Otvoreni postupak	NE	Zapisnik i Odluka poslani izabranom ponuđaču: INSTITUT ZA KVALITET, STANDARDIZACIJU I EKOLOGIJU TQM d.o.o. Tuzla	14.713,92	1 ponuđač, Potpis ugovora u toku.
50	48	Nadogradnja ISV sistema u skladu sa potrebama AVP Sava i AVP Jadransko more (zajednička nabavka usluga)	78.000,00	2	Otvoreni postupak	NE	Zapisnik i Odluka poslani izabranom ponuđaču: GDi d.o.o. Sarajevo	91.260,00	1 ponuđač, Potpis ugovora u toku.
Ukupna ugovorena vrijednost otvorenih postupaka iznosi :								**24.129.158,79**	**(sa PDV-om)**
Ukupan broj pristiglih ugovora u službu do dana sačinjavanja ovog izvještaja za otvoreni postupak iznosi:								**66**	
Ukupan broj pokrenutih otvorenih postupaka iznosi :								**50**	
Poništeni postupci u cijelosti pod red.br : 16,4,26,71,23, 7, 11							**Ukupno :**	**7**	
Redni broj poništenih lotova : 38-L2, 67-L1, 67-L2, 27-L1, 27-L3, 2-L2, 95-L1, 74-L1, 74-L3							**Ukupno :**	**9 – lotova poništeno**	

- Pregled pokrenutih postupaka javne nabavke - **konkurentski zahtjev** u 2025. godini.

Red. Br.	App. Br.	Opis i Naziv postupka	Procijenjena vrijednost	1 – robe 2 – usluge 3 - radovi	Vrsta postupka	LOT	Naziv ponuđača	Vrijednost ugovora (sa PDV-om)	Broj i datum Ugovora
1	85	Sanacija ustave Starača, općina Odžak	50.000,00	3	Konkurentski zahtjev	NE	VODOPRIVREDA POSAVINA d.o.o. Odžak	58.266,00	10-1229-9/25 16.10.2025
2	88	Vršenje usluga nadzora nad vađenjem materijala iz vodotoka 3 LOT-a.	5.000,00	2	Konkurentski zahtjev	1 2 3	Na protokol AVP Sava nije pristigla niti jedna ponuda. Postupak poništen.	0,00	Poništen
3	100	Vršenje usluga nadzora nad vađenjem materijala iz vodotoka 2 LOT-a.	5.000,00	2	Konkurentski zahtjev	1 2	RADIS d.o.o. Istočno Sarajevo RADIS d.o.o. Istočno Sarajevo	421,20 920,00	30-1476-21/25 23.12.2025 30-1476-22/25 23.12.2025
4	94	Vršenje usluga revizije na projektima koji su ugovoreni u 2024. godini 2 LOT-a.	1.500,00	2	Konkurentski zahtjev	1 2	S obzirom da su preostale samo dvije prihvatljive ponude sa identičnom cijenom ovaj LOT 1 se poništava. ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	0,00 702,00	Poništen L1 Potpis ugovora u toku.
5	101	Izrada Glavnog projekta sanacije parapetnog zida na odbrambenom nasipu uz rijeku Bosnu u naselju Neteka, općina Odžak	12.820,00	2	Konkurentski zahtjev	NE	HKP CONSULTING d.o.o. Banja Luka	11.934,00	Potpis ugovora u toku.
6	102	Nadzor za radove odbrane od poplava – Faza pripremnih mjera – na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Posavskog kantona u 2026. godini 2 LOT-a.	17.000,00	2	Konkurentski zahtjev	1 2	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo	1.170,00 1.170,00	Potpis ugovora u toku. Potpis ugovora u toku.
7	105	Pružanje usluge kolektivnog osiguranja radnika.	24.000,00	2	Konkurentski zahtjev	NE	ASA CENTRAL OSIGURANJE d.d. Sarajevo	19.278,00	Potpis Okvirnog sporazuma u toku.
Ukupna ugovorena vrijednost konkurentskih zahtjeva iznosi :								**93.861,20**	**(sa PDV-om)**
Ukupan broj pristiglih ugovora u službu do dana sačinjavanja ovog izvještaja za konkurentski zahtjev iznosi:								**3**	
Ukupan broj pokrenutih konkurentskih zahtjeva iznosi :								**7**	
Poništeni postupci u cijelosti pod red.br : 88							**Ukupno :**	**1**	
Redni broj poništenih lotova : 94-L1							**Ukupno :**	**1 - lotova poništeno**	

- Pregled pokrenutih postupaka javne nabavke – **direktni sporazum** u 2025. godini.

Red. Br.	App. Br.	Opis i Naziv postupka	Procijenjena vrijednost	1 – robe 2 – usluge 3 - radovi	Vrsta postupka	LOT	Naziv ponuđača	Vrijednost ugovora (sa PDV-om)	Broj i datum Ugovora
1	P1	Nadzor nad izvođenjem radova odbrane od poplava - Faza pripremnih mjera- na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Srednje Posavine u 2025. godini.	6.000,00	2	Direktni sporazum	NE	RADIS d.o.o. Istočno Sarajevo	4.855,50	10-57-11/25 24.2.2025
2	P2	Nadzor za radove odbrane od poplava - Faza pripremnih mjera- na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Odžačke Posavine u 2025. godini.	6.000,00	2	Direktni sporazum	NE	RADIS d.o.o. Istočno Sarajevo	4.855,50	10-56-11/25 24.2.2025
3	P3	Osmatranje nivoa podzemnih voda u pijezometrima na dionicama rekonstruisanih savskih nasipa u 2025. godini.	6.000,00	2	Direktni sporazum	NE	RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla	6.832,80	10-58-10/25 19.2.2025
4	10	Nabavka tonera	6.000,00	1	Direktni sporazum	NE	ALFOM d.o.o. Banja Luka	3.206,38	50-607-13/25 12.6.2025
5	13	Nabavka čizama i kišnih odijela za potrebe uzorkovanja na površinskim i otpadnim vodama	3.000,00	1	Direktni sporazum	NE	DEFTER d.o.o. Sarajevo	1.021,47	60-685-14/25 22.7.2025
6	1	Plaćanje cestarine nabavka dopuna ACC TAG-a	2.500,00	2	Direktni sporazum	NE	Pristupnica za ACC uslugu (JP Autoceste FBiH) je važeća (dokument koji ima treman ugovora), te s obzirom na isto nije postojala potreba za ovom nabavkom.	0,00	Nije pokrenuto
7	12	Nabavka i zamjena akumulatorske baterije na postojećem UPS uređaju Eaton Tip PW 9355 15kVA	4.000,00	1	Direktni sporazum	NE	EXEOM S.P. Istočno Sarajevo	2.340,00	60-686-10/25 5.6.2025
8	31	Održavanje travnatih površina u krugu Laboratorije za vode (usluge košenja trave, orezivanje grmova i sl.)	4.000,00	2	Direktni sporazum	NE	HORTICAL d.o.o. Konjic	4.387,50	60-684-8/25 9.6.2025
9	42	Učešće u međunarodnoj interkalibraciji (PT/ILC) za fizičko-hemijske parametre kvaliteta voda	5.000,00	2	Direktni sporazum	NE	LGC Standards GmbH Wesel Germany (Inostrani ponuđač)	4.179,61	Narudžbenica

Red. Br.	App. Br.	Opis i Naziv postupka	Procijenjena vrijednost	1 – robe 2 – usluge 3 - radovi	Vrsta postupka	LOT	Naziv ponuđača	Vrijednost ugovora (sa PDV-om)	Broj i datum Ugovora
10	69	Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja u 2024. godini	6.000,00	2	Direktni sporazum	NE	MARIGOLD d.o.o. Banja Luka	6.000,00	50-796-11/25 10.6.2025
11	25	Usluga zaštite od požara u Laboratoriji za vodi (periodični pregled i servisiranje aparata za gašenje požara, atestacija vatrodojave, pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija, električnih instalacija i hidranata)	6.000,00	2	Direktni sporazum	NE	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	2.433,60	60-801-9/25 20.8.2025
12	19	Nabavka plastične ambalaže za uzorkovanje	500,00	1	Direktni sporazum	NE	Postupak javne nabavke se poništava nijedna ponuda nije pristigla na portal za Javne nabavke.	0,00	Poništen
13	49	Troškovi održavanja backup i sigurnosnog sistema AVP Sava (Fortinet i antivirus)	6.000,00	2	Direktni sporazum	NE	PING d.o.o. Sarajevo	6.973,20	70-1100-7/25 11.9.2025
14	47	AI chatbot sistem u AVP Sava – korištenje licence na godišnjem nivou	6.000,00	2	Direktni sporazum	NE	Nijedna ponuda nije pristigla na portal Agencije za JN BiH. Postupak se poništava.	0,00	Poništen
15	22	Nabavka i ugradnja potrošnog materijala za vodo i elektro instalacije u Laboratoriji za vode	6.000,00	1	Direktni sporazum	NE	Nijedna ponuda nije pristigla na portal Agencije za JN BiH. Postupak se poništava.	0,00	Poništen
16	28	Održavanje serverske i računarske opreme i infrastrukture	6.000,00	2	Direktni sporazum	NE	SYSTEM ONE d.o.o. Sarajevo	2.983,50	70-1193-8/25 30.9.2025
17	20	Nabavka i ugradnja potrošnih dijelova za centralno grijanje u Laboratoriji za vode	2.000,00	1	Direktni sporazum	NE	Nijedna ponuda nije pristigla na portal Agencije za JN BiH. Postupak je poništen.	0,00	Poništen
18	30	Usluge o montaži , demontaži, balansiranju i skladištenju guma u hotel za gume	6.000,00	2	Direktni sporazum	NE	GUMA VP 200 d.o.o. Mostar	2.583,36	50-1277-8/25 4.11.2025

Red. Br.	App. Br.	Opis i Naziv postupka	Procijenjena vrijednost	1 – robe 2 – usluge 3 - radovi	Vrsta postupka	LOT	Naziv ponuđača	Vrijednost ugovora (sa PDV-om)	Broj i datum Ugovora
19	24	Usluge registracije vozila	6.000,00	2	Direktni sporazum	NE	OSING - OSIGURANJE INŽENJERING d.o.o. Sarajevo	3.091,54	50-1276-7/25 7.10.2025
20	17	Nabavka ISO standardnih metoda	400,00	1	Direktni sporazum	NE	INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BIH	160,00	Faktura/Račun 28.8.2025
21	32	Servis i održavanje postojećeg sistema grijanja u prostorijama ureda u Zenici.	1.000,00	2	Direktni sporazum	NE	E+E+E-ENERGY d.o.o. Sarajevo	1.000,00	50-1290-7/25 29.10.2025
22	92	AI chatbot sistem u AVP Sava – korištenje licence na godišnjem nivou (ponovljeni postupak)	6.000,00	2	Direktni sporazum	NE	ENTROPY387 d.o.o. Sarajevo	5.601,96	70-1317-7/25 29.10.2025
23	21	Nabavka biološkog materijala za izvođenje testa toksičnosti (Daphnia magna)	6.000,00	1	Direktni sporazum	NE	ANALITIKA d.o.o. Sarajevo	5.341,05	60-1318-8/25 7.11.2025
24	91	Nabavka i ugradnja potrošnog materijala za vodo i elektro instalacije u Laboratoriji za vode (ponovljeni postupak)	6.000,00	1	Direktni sporazum	NE	OD ADAPTACIJE Sarajevo	6.967,35	60-1346-7/25 24.11.2025
25	90	Nabavka i ugradnja potrošnih dijelova za centralno grijanje u Laboratoriji za vode (ponovljeni postupak)	2.000,00	1	Direktni sporazum	NE	AS-GAS d.o.o. Sarajevo	1.977,30	60-1345-7/25 1.12.2025
26	89	Nabavka plastične ambalaže za uzorkovanje (ponovljeni postupak)	500,00	1	Direktni sporazum	NE	Nijedna ponuda nije pristigla na portal Agencije za JN BiH. Postupak je poništen.	0,00	Poništen
27	96	Nabavka softvera i nadogradnja na postojeći HPLC sistem (LC-20AT) proizvođača Shimadzu u Laboratoriji za vode.	3.000,00	1	Direktni sporazum	NE	SHIMADZU d.o.o. Sarajevo	3.123,90	60-1490-7/25 11.12.2025
28	106	Usluga pranja vozila.	5.000,00	2	Direktni sporazum	NE	CarMax d.o.o	4.924,86	Potpisivanje ugovora u toku.

Red. Br.	App. Br.	Opis i Naziv postupka	Procijenjena vrijednost	1 – robe 2 – usluge 3 - radovi	Vrsta postupka	LOT	Naziv ponuđača	Vrijednost ugovora (sa PDV-om)	Broj i datum Ugovora
29	110	Nabavka usluga medijske prezentacije o aktivnostima AVP Sava.	5.000,00	2	Direktni sporazum	NE	Čekamo ponudu sa protokola. Jedan ponuđač: Federalna novinska agencija (FENA)	4.200,00	Postupak u toku.
30	107	Izrada idejnog rješenja sa predmjerom radova i izvedbenim projektom za uređenje i adaptaciju multimedijalne sale, arhive, magacina i biblioteke na V spratu.	6.000,00	2	Direktni sporazum	NE	WINDOW arch.desing d.o.o. Sarajevo	5.850,00	Potpis ugovora u toku.
31	111	Edukacija iz oblasti zaštite od požara.	1.000,00	2	Direktni sporazum	NE	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	1.053,00	Potpis ugovora u toku.
32	109	Nabavka usluga održavanja i čišćenja područnih ureda 2 LOT-a.	6.000,00	2	Direktni sporazum	1	Ponuđači dostvaili ponude evaluacija istih u toku.	0,00	Postupak u toku.
						2	Ponuđači dostvaili ponude evaluacija istih u toku.	0,00	Postupak u toku.
Ukupna ugovorena vrijednost direktnih sporazuma iznosi :								**80.968,52**	**(sa PDV-om)**
Ukupan broj pristiglih ugovora u službu do dana sačinjavanja ovog izvještaja za direktni sporazum iznosi:								**20**	
Ukupan broj pokrenutih direktnih sporazuma iznosi :								**32**	
Poništeni postupci u cijelosti pod red.br : 19, 47, 22, 20, 89							**Ukupno :**	**5**	
Redni broj poništenih lotova : nema poništenih lotova							**Ukupno :**	**0 - lotova poništeno**	

- Pregled pokrenutih postupaka javne nabavke – **neprioritetne usluge** u 2025. godini.

Red. Br.	App. Br.	Opis i Naziv postupka	Procijenjena vrijednost	1 – robe 2 – usluge 3 - radovi	Vrsta postupka	LOT	Naziv ponuđača	Vrijednost ugovora (sa PDV-om)	Broj i datum Ugovora
1	44	Nabavka usluga sistematskog pregleda radnika	15.000,00	2	Neprioritetne usluge	NE	JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU Sarajevo	14.495,00	50-1331-9/25 11.11.2025.
2	5	Nabavka poštanskih usluga i kurirskih usluga	29.800,00	2	Neprioritetne usluge	NE	Javni poziv - Rok za preuzimanje javnog poziva do 21.8.2027 godine do 15:30 sati	18.522,71	U skladu sa Pravilnikom o uslugama iz Aneksa II i Javnim pozivom u slučaju da se predmetne usluge nabavljaju od više ponuđača nije obavezno zaključenje ugovora, te se račun za pruženu uslugu može smatrati ugovorom.
Ukupna ugovorena vrijednost neprioritetnih usluga iznosi :								**33.017,71**	**(sa PDV-om)**
Ukupan broj pristiglih ugovora u službu do dana sačinjavanja ovog izvještaja za neprioritetne usluge iznosi:								**1 ugovor i 46 računa**	
Ukupan broj pokrenutih neprioritetnih usluga iznosi :								**2**	
Poništeni postupci u cijelosti pod red.br : nema poništenih							**Ukupno :**	**0**	
Redni broj poništenih lotova : nema poništenih lotova							**Ukupno :**	**0**	

Rekapitulacija:

Ukupan broj Pokrenutih postupaka javne nabavke:	**91**
Ukupan broj pristiglih ugovora u službu do dana sačinjavanja ovog izvještaja iznosi:	**91**
Ukupan broj Poništenih postupaka javne nabavke:	**13**
Ukupan broj Poništenih lotova u postupcima javnih nabavki:	**10**

Total Ugovorenih Vrijednosti otvoreni postupak:	**66**	24.129.158,79
Total Ugovorenih Vrijednosti konkurentski zahtjev:	**3**	93.861,20
Total Ugovorenih Vrijednosti direktni sporazum:	**20**	80.968,52
Total Ugovorenih Vrijednosti neprioritetne usluge:	**2**	33.017,71
Ukupno:	**91**	**24.337.006,22**

Služba za pravne, kadrovske i opće poslove

Služba za pravne, kadrovske i opće poslove je do oktobra 2025. godine bila organizaciono pozicionirana u okviru Sektora za ekonomske i pravne poslove, nakon čega je, uspostavljanjem Sektora za pravne poslove, nastavila sa radom u okviru novoformiranog sektora. Služba je sa radom u novoj organizacionoj strukturi započela u oktobru 2025. godine, pri čemu je obezbijeđen pun kontinuitet u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti.
U izvještajnom periodu, Služba je bila nosilac ključnih aktivnosti u oblasti pružanja pravne podrške, upravljanja ljudskim resursima i obavljanja općih administrativnih poslova, s ciljem osiguranja zakonitog, urednog i efikasnog funkcionisanja AVP Sava.
U segmentu kadrovskih poslova, Služba je učestvovala u uspostavljanju i vođenju osnovnih kadrovskih evidencija, upravljanju personalnom dokumentacijom zaposlenih, te primjeni propisa iz oblasti radnih odnosa. Aktivnosti su bile usmjerene na uspostavljanje urednog, transparentnog i zakonitog sistema upravljanja ljudskim resursima.
U okviru općih poslova, Služba je obavljala administrativno-tehničke poslove, poslove pisarnice, pripreme akata i službene korespondencije, kao i pružala kontinuiranu logističku i organizacionu podršku nesmetanom radu ostalih organizacionih jedinica.
Imajući u vidu da se izvještajni period odnosi na početnu fazu rada u okviru novoformiranog Sektora za pravne poslove, aktivnosti Službe za pravne, kadrovske i opće poslove u 2025. godini bile su prvenstveno usmjerene na stabilizaciju rada, uspostavljanje funkcionalnog sistema i stvaranje neophodnih organizacionih i proceduralnih preduslova za efikasnije i obimnije djelovanje u narednom periodu.
U izvještajnom periodu, u okviru općih poslova, posebno u segmentu protokola, evidentirani su određeni izazovi u radu, koji su prvenstveno bili posljedica nedovoljne kadrovske popunjenosti, uz istovremeno povećan obim poslova. Navedeni poslovi su se u značajnoj mjeri obavljali od strane jednog izvršioca, što je objektivno uticalo na dinamiku i opterećenost rada u ovom segmentu.
Imajući u vidu navedene okolnosti, Služba je, uprkos ograničenim kadrovskim kapacitetima, nastojala obezbijediti kontinuitet u obavljanju poslova protokola, uz primjenu raspoloživih organizacionih i operativnih mjera. Navedena situacija ukazala je na potrebu za daljim jačanjem kadrovskih kapaciteta u ovom segmentu, s ciljem unapređenja efikasnosti, rasterećenja postojećih izvršilaca i obezbjeđenja održivog i kvalitetnog obavljanja poslova u narednom periodu.
U izvještajnom periodu, novoformirani Sektor za pravne poslove suočio se i sa izazovima u oblasti održavanja higijene poslovnog prostora-zgrade, koji su proizašli iz nedovoljne kadrovske popunjenosti na poslovima čišćenja i održavanja. Naime, poslovi održavanja higijene bili su organizovani sa jednim izvršiocem, što se, imajući u vidu prostorni obuhvat objekta od pet spratova, pokazalo kao objektivno nedovoljno za osiguranje adekvatnog nivoa higijene i redovnog održavanja poslovnog prostora.
Navedena okolnost ukazala je na potrebu za preispitivanjem postojećeg načina organizacije ovih poslova, kao i za razmatranjem mogućnosti dodatnog kadrovskog ili organizacionog jačanja u cilju obezbjeđenja propisanih i očekivanih standarda higijene u narednom periodu.
U izvještajnom periodu evidentirani su i izazovi u oblasti arhiviranja dokumentacije, koji se odnose na nedostatak adekvatnog arhivskog prostora. Postojeći prostorni kapaciteti nisu u potpunosti prilagođeni obimu dokumentacije koja se generiše u redovnom radu AVP Sava, što otežava sistematično odlaganje, razvrstavanje i čuvanje arhivske građe u skladu sa važećim propisima i standardima.

Navedena situacija ukazala je na potrebu za unapređenjem prostorno-tehničkih uslova za rad arhive, kroz obezbjeđenje dodatnog prostora ili reorganizaciju postojećih kapaciteta, kako bi se osigurali uslovi za uredno, bezbjedno i propisno upravljanje dokumentarnom i arhivskom građom u narednom periodu.

Javnost rada i podizanje svijesti o vodi

U 2025. godini nastavljene su aktivnosti na podizanju javne svijesti o upravljanju vodama i značaju očuvanju vodnih resursa, u isto vrijeme promociji rada Agencije za vodno područje rijeke Save. Medijske objave su praksa (saopćenja, informacije, obavještenja), posebno u slučaju poplavnih događaja. Distribuiramo ih sredstvima javnog informiranja prema dinamici koju odredimo, a u zavisnosti od situacije na terenu. Kao što je AVP Sava odgovorila na svaki novinarski upit u prethodnom periodu, takva praksa nastavljena je i u 2025. godini.

WEB STRANICA AVP SAVA
Informiranje javnosti putem web stranice prioritet je u plasiranju informacija o aktivnostima Agencije za vodno područje rijeke Save. Informacije su praćene adekvatnim fotografijama i video sadržajima.

FACEBOOK
Informacije o aktivnostima Agencije objavljene na web-u, redovan su sadržaj i FACEBOOK stranice. Osim informacija, zahvaljujući saradnji s medijima, postavljan je i video sadržaj – prilozi, izjave, reportaže o aktivnostima Agencije za vodno područje rijeke Save. Primjer su martovska dešavanja kada su provođene mjere redovne odbrane od poplava na poplavnom području Odžačke i Srednje Posavine. Građani su na FB stranici mogli dobiti sve informacije praćene fotografijama o stanju vodotoka u nadležnosti AVP Sava, posebno savskog nasipa.

DAN VODA
U 2025. godini Agencija za vodno područje rijeke Save bila je domaćin i jedan od organizatora manifestacije obilježavanja Dana voda - 22. marta. Centralna manifestacija održana je u Sarajevu. U saradnji s Agencijom za vodno područje Jadranskog mora i Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva oglasili smo se saopćenjem za javnost. Radni dio manifestacije otvoren je reportažom - osvrtom na ekstremne poplave koje su se desile od 2010. do marta 2025. godine. Reportaža je montirana u koprodukciji s TVSA. Arhivski materijal su ustupili Federalna uprava civilne zaštite, TVUSK, TVBPK–Goražde te Grad Konjic. S obzirom da su obuhvaćeni poplavni događaji na području slivova Save i Jadranskog mora, reportaža je vrijedan arhivski materijal u vlasništvu AVP Sava. Također, video materijal o poplavama u ovom periodu, ustupljen je Agenciji za vodno područje rijeke Save. Panel diskusija "Odgovor na klimatske promjene u borbi s poplavama", u okviru manifestacije obilježavanja Dana voda, okupila je predstavnike institucija, agencija i zavoda na nivou Federacije BiH, civilne zaštite, akademske zajednice te Alijanse za vode BiH. (Spisak panelista: ALMA IMAMOVIĆ-Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva, BOŠKO KENJIĆ-ambasada Švicarske u BiH, prof.dr. MUHAMED BAJRIĆ - profesor Šumarskog fakulteta u Sarajevu, HARIS KALAJDŽISALIHOVIĆ- docent na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i šef Odsjeka za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo, SAMIR DŽIHIĆ-Federalna uprava civilne zaštite. ALMIR BIJEDIĆ-Federalni hidrometeorološki zavod, DAMIR MRĐEN-v.d. direktor Agencija za vodno područje Jadranskog mora, ALMIR PRLJAČA-rukovodilac Sektora za upravljanje vodama, ADNAN TOPALOVIĆ-rukovodilac Odjeljenja za prognoze AVP Sava).

KONFERENCIJA "IZAZOVI UPRAVLJANJA VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE"

Agencije za vodno područje rijeke Save bila je organizator konferencije „Izazovi upravljanja vodama na vodnom području rijeke Save". Cilj je bio ukazati na neophodnost saradnje institucija u planiranju i provedbi mjera smanjenja rizika od štetnog djelovanja velikih voda. Prezentacijama uposlenika AVP Sava ukazano je na izazove, ali i rješenja za efikasniju provedbu projekata Agencije - a sve s ciljem povećanja sigurnosti i zaštite građana i imovine. Konferenciji su prisustvovali predstavnici federalnog, kantonalnog i općinskog nivoa vlasti.

FEDERALNA NOVINSKA AGENCIJA - FENA

I u 2025. godini AVP Sava je sarađivala s Federalnom novinskom agencijom - FENA-om. Ova saradnja podrazumijeva korištenje tzv. osnovnog paketa, odnosno servisa za potrebe Agencije - najava događaja i objavljivanje informacija/saopćenja, posebno u slučaju vanredne hidrološke situacije. Plasiranje informacija i video sadržaja putem FENA-e je naročito važno, jer su te objave vidljivije medijima s kojima sarađuje FENA.

ČASOPIS „VODA I MI"

Tokom 2025. godine - pripremljena su, štampana i objavljena tri broja časopisa „Voda i mi" (115, 116. i 117. broj). Časopis je informativno-stručnog karaktera, a najveći broj informacija i tekstova odnosi se na aktivnosti AVP Sava, uz redovne rubrike (intervju s povodom; preventivne aktivnosti; zaštita, korištenje i upravljanje vodama; prostor posvećen mladima). Ispoštovana je dinamika štampanja tri broja časopisa godišnje.

RTV BPK

Do devetog mjeseca 2025. godine trajao je ugovor s RTVBPK. Podrazumijevao je snimanje kratkih reportaža i priloga čije je emitiranje planirano u skladu s ponudom (reportaža o upravljanju vodama, prognoznim modelima, kartama erozije, Studiji procjene tereta zagađenja vodnih resursa s deponija rudarskog i industrijskog otpada, radu Laboratorije za vode AVP Sava, posjeti studenata Građevinskog fakulteta AVP Sava, obilježavanju Dana voda).

Međunarodna saradnja, konvencije, sporazumi i ugovori

Bosna i Hercegovina je potpisnica niza konvencija, sporazuma i ugovora vezanih za sektor voda.

Za implementiranje odredbi Konvencije o zaštiti rijeke Dunav formirana je Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR), dok je za implementaciju Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save formirana Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija).

Uposlenici AVP Sava su aktivni učesnici stručnih grupa ovih komisija i kontinuirano obavljaju zadatke prema dogovorenom programu rada.

Konvencija o zaštiti rijeke Dunav

RBM EG – Stručna grupa za upravljanje riječnim bazenom

U 2025. godini održana su dva redovna sastanka RBM stručne grupe ICPDR-a, 61. sastanak u Beču u periodu od 06.-07.05.2025. i 62. sastanak u Budimpešti od 16.-17.10.2025. godine.

Članovi RBM stručne grupe su informirani o relevantnim ICPDR i EU aktivnostima, projektima i sastancima. Prezentiran je izvještaj JDS5 - Peto zajedničko istraživanje Dunava (Joint Danube

Survey 5) koje predstavlja najveću svjetsku riječnu ekspediciju za praćenje kvaliteta vode u organizaciji ICPDR.

Revidirana Direktiva EU o urbanim otpadnim vodama (UWWTD) stupila je na snagu 1. januara 2025. godine kao Direktiva (EU) 2024/3019. Ona donosi strožija pravila o tretmanu otpadnih voda, uključujući obavezno uklanjanje mikrozagađivača i veće obaveze dijeljenja troškova za proizvođače farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda. Evropska komisija je 4. juna 2025. godine objavila Strategiju EU za vodnu otpornost, postavljajući obavezujući cilj za sve države članice da do 2030. godine smanje potrošnju vode za 10%. Predstavljen je prijedlog za korištenje recikliranog azota iz stajnjaka (RENURE), kao i prijedlog za izmjenu liste prioritetnih supstanci u vodama.

Vezano za planiranje i sprovođenje aktivnosti na pripremi ažuriranog Plana upravljanja slivom rijeke Dunav (DRBMP) 2027. urađeno je sljedeće:

- RBM EG je, u bliskoj suradnji s relevantnim stručnim i radnim grupama ICPDR-a (PM EG, N TG, HYMO TG, GW TG) radila na izradi Izvještaja „Značajna pitanja upravljanja vodama (2025.)", te su finalni komentari RBM EG poslati do 1.11.2025. godine kako bi se završna verzija dokumenta razmatrala na sastanku HoDs (Heads of Delegation), šefova delegacija svake zemlje članice ICPDR-a. Nakon usvajanja, dokument se daje 6 mjeseci na konsultovanje sa javnošću, do juna 2026. godine.
- Predstavljen je radni plan za pripremu Ažuriranog plana upravljanja slivom rijeke Dunav (DRBMP) za 2027. godinu. Spomenuta je mogućnost uspostavljanja odgovarajuće radne grupe o čemu će se raspravljati na sastanku naredne godine.
- Raspravljano je o očekivanoj mogućnosti dostave podataka, te je zaključeno da će većina ažuriranih podataka biti dostupna tek krajem 2026. godine. Predloženo je da bi pomjeranje/produženje radnog plana za pripremu Ažuriranog DRBMP 2027. za jednu godinu omogućilo prikupljanje i procjenu ažuriranih i odobrenih podataka koji se koriste za izradu nacionalnih planova upravljanja vodnim slivovima (RBMP). To nije bio slučaj s prethodnim DRBMP-ovima, što je ograničavalo uporedivost podataka između nacionalnih RBMP-ova i DRBMP-a. U slučaju da se predložena procedura provede, DRBMP bi bio finaliziran nakon nacionalnih planova, čime bi se osiguralo da se najnoviji podaci uključe i procijene u DRBMP-u. Ovakav pristup bi osigurao dosljednost i uporedivost između nacionalnih RBMP i međunarodnog Dunavskog RBMP-a, uz potrebnu koordinaciju. Međutim, usklađenost sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama za države članice EU u slivu Dunava ne smije biti dovedena u pitanje i mora biti osigurana. Zatraženo je od članova RBM stručne grupe da se pismeno izjasne o stavu država vezano za proširenje radnog plana pripreme DRBMP-a 2027. za jednu godinu, te je dato pitanje delegirano na razmatranje sa šefovima delegacija (HoDs).

- Započeta je početna rasprava o strukturi i nacrtu DRBMP 2027. , uključujući i mape. Korištena je struktura DRBMP 2021. te je predloženo i dogovoreno skraćivanje dokumenta kako bi bio bolje prilagođen javnosti, uz zadržavanje trenutnog sadržaja, a da se opširnije tehničke informacije prebace u anekse. Dogovoreno je da će RBM EG u narednoj fazi izvršiti pregled karata i aneksa. Detaljne rasprave o nacrtu četvrtog DRBMP-a održat će se na proljetnim sastancima EG/TG u 2026. godini. Predloženo je da se broj karata ne smanjuje, te da se uključi karta o nestašici vode iz projekta Bilans voda Dunava (Danube Water Balance).
- Tehničke rasprave o izvještajnim tabelama koje će se koristiti za Ažuriranje DRBMP-a 2027 su finalizirane, te je planirano da prikupljanje podataka počne početkom 2026. godine kako bi prvi cjeloviti nacrt Ažuriranog DRBMP-a 2027 bio spreman za predstavljanje na OM-29 (decembar 2026).

U okviru teme prilogođavanja klimatskim promjenama, nedostatku vode i suši te vodnom bilansu prezentirane su ICPDR aktivnosti vezano za bilans voda i sušu. Kao rezultat pristupa prioritizaciji usvojena su 3 prioriteta od strane ICPDR-a u junu 2025:

- Definisati zajedničke indikatore suše (uključujući nizak vodostaj i potencijalno ekološki prihvatljiv protok), oslanjajući se na postojeće nacionalne pristupe.
- Razviti harmonizirane sisteme praćenja suše na nivou cijelog sliva, zasnovane na postojećim nacionalnim sistemima i u bliskoj vezi s definicijom indikatora suše.
- Podsticati izgradnju kapaciteta kao kontinuirani napor za razmjenu dobrih praksi i iskustava, uz uključivanje relevantnih sektora (ne samo iz sektora voda, već i iz poljoprivrede, plovidbe i zaštite prirode).

Pod integracionim pitanjima su prezentirani projekti i obrađene teme: Unutrašnja plovidba i okoliš, Zaštita prirode i biodiverzitet, Jesetre u slivu rijeke Dunav, te Poljoprivreda i upravljanje vodama. Relevantni projekti upravljanja riječnim slivom: Danube4All , NaturaConnect i Ekološki pristup prioritizaciji, te Danube Lifelines.
Prezentirane su aktivnosti ICPDR radnih grupa za hidromorfologiju i ekonomiju.
Date su informacije o napretku aktivnosti vezano za Strategiju EU za dunavsku regiju i ICPDR, te su prezentovane inicijative za podsliv rijeka Save, Tise i Pruta.
Naredni sastanak RBM EG ICPDR-a je planiran za 12.-13.5.2026. godine, a lokacija će biti naknadno određena.
Pored redovih sastanaka obezbjeđeno je prisustvo člana RBM EG iz Federacije BiH na on-line radionicama i sastancima organizovanim od strane ICPDR-a, a za koje je traženo prisustvo članova RBM EG:

- Radionica o projektu Danube Water Balance: Napredak, očekivani rezultati i aktivnosti praćenja
- Konferencija projekta OPTAIN
- NaturaConnect webinar na temu „Povezivanje plave i zelene infrastrukture u Dunavsko-Karpatskom području: Prioritetizacija rijeka, močvara i pejzaža – integrisani pristup povezivosti"

MA EG – Stručna grupa za monitoring i procjenu
Tokom 2025. godine MA EG ICPDR-a (Stručna grupa za monitoring i procjenu Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav) održala je dva radna sastanka:
-41. sastanak 19.-20. mart 2025. godine Temišvar
-42. sastanak 23.-24. sept. 2025. godine Zagreb
Glavni fokus rada Stručne grupe za monitoring i procjenu Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav tokom 2025. godine bile su pripreme i realizacija zajedničkog istraživanja Dunava JDS_5. Uzorkovanje je provedeno uspješno i utvrđeni su rokovi za obradu podataka za svaki parametar.
Na sastancima se nastavilo raditi na ustaljenim temama poput: aktivnosti Međunarodne monitoring mreže (TNMN) i učešću zemalja u testiranju profesionalne osposobljenosti (AQC), invazivne vrste IAS i biodiverzitet.
Za potrebe ažuriranja DRBMP 2027. članovi MA EG su pitani za informaciju o dostupnosti podataka za ocjenu statusa i procjenu rizika. Za FBiH izvijestili smo da imamo raspoložive podatke za slanje a to su podaci iz važećeg Plana upravljanja 2022.-2027. Još jedan traženi podatak bitan za ažuriranje Plana upravljanja rijekom Dunav je i podatak o mogućim izmjenama u delineaciji vodnih tijela (a što se odnosi samo na ona vodna tijela koja su površine preko 4000 km^2). Bosna i Herzegovina je izvijestila na nacionalnom nivou da nije bilo izmjena

i da iste ne očekujemo. Krajnji rok za slanje informacije o raspoloživosti podataka je proljeće 2026. godine za sve zemlje članice.
Bosna i Hercegovina (Federacija BiH) je u ovom periodu odgovorila traženim zahtjevima i ispunila većinu svojih obaveza (u skladu sa trenutnim okolnostima, raspoloživim i dostupnim podacima).
Slijedeći, 43. sastanak MA EG je zakazan a 25.-26.03.2026. godine i održat će se online, a dogovoreno je da će 44. sastanak biti održan 16.-17.09.2026. godine u Brnu, Češka.

FP EG – Stručna grupa za odbranu od poplava

47. sastanak FP EG ICPDR-a održan je u terminu 01.-02.04.2025. godine u Zagrebu – Republika Hrvatska, dok je 48. sastanak održan u terminu 01.-02.10.2025. godine u Ljubljani - Republika Slovenija.
U okviru realizacije III ciklusa Plana upravljanja poplavnim rizicima u bazenu rijeke Dunav (DFRMP Update 2021) intenzivno se radilo na finaliziranju sumarnog izvještaja o Preliminarnoj procjeni rizika od poplava u bazenu rijeke Dunav sa pratećim kartama. Započete su aktivnosti na ažuriranju sumarnog izvještaja o mapama opasnosti i mapama rizika od poplava.
Za III sumarni izvještaj o realizaciji DFRMP (DFRMP 2027) definisana su poglavlja koja će biti obrađena.
Izvšeno je ažuriranje i dorada Izvještaja o poplavama iz 2023. godine i Izvještaja o poplavama iz 2024. godine.
Također nastavljeno je praćenje realizacije niza projekata sa različitom tematikom kao i međudržavnih projekata koji su uključeni u Anex 2 DFRMP-a. Treba istaći sljedeće projekte: Danube Water Balance project; DANICE / DEVICE Danube; LAREDAR; MYRIAD-EU; RESTORIVER; Danube-ADAPT; NBS4LOCAL; SAFETY4TMF; SpongeCity; LOCALIENCE; LIFE-LOGOS 4 WATERS; LIFE SandBoil project.
Prezenirantirane su informacije u vezi implementacije EU strategije za regiju Dunava sa posebnim akcentom na petu prioritetnu oblast PA5 - Upravljanje okolišnim rizicima kao i nova dostignuća u EFAS-u.
Posebna pažnja posvećena je uspostavi hidrološkog informacionog sistema Dunava (DanubeHIS). Pripremljen je i u probnom radu je radna verzija Danube HIS-a. Tokom 2025. godine se razmatralo čitav niz pitanja koja bi trebala definisati način prikaza i rada ovog sistema.
U periodu 30.09.-01.10.2025. godine u Ljubljani je održan drugi Dunavski Forum prognostičara (Danube Forecasting Forum – DAFF) na kome su učestvovali predstavnici zemalja Dunavskog bazena. AVP Sava se predstavila na ovom forumu sa dvije prezentacije (Bujične poplave u Bosni i Hercegovini u oktobru 2024. godine i IT platforma za upravljanje rizikom od poplava - FloodSmart).
Tokom 2025. godine zajedno sa HYMO TG vršene su aktivnosti na doradi dokumenta koji poveznicu između dvije direktive WFD-FD (WFD-FD Discussion paper).

EG IM&GIS – Information Management&GIS stručna grupa

Ekspertna grupa IM&GIS u okviru ICPDR-a je u 2025. godini, kao i u prethodnim godinama imala za osnovni zadatak i cilj prikupljanje podataka i upload podataka u DRB GIS sistem (GIS sistem ICPDR-a), za potrebe izvještavanja sa akcentom na dvije teme: EU Reporting i Danube HIS, odnosno podrška FP EG u uspostavi Danube HIS-a, kao i sa uploadom podataka za APSFR i FHR mape, priprema i upload podataka o hidrološkim i kišomjernim/padavinskim stanicama na slivu Dunava. Tokom 2025. godine također se radilo na ispunjavanju zahtjeva Direktive o poplavama EU, dostava (uplaod) podataka u GIS sistem Dunava za potrebe izrade planova

upravljanja vodama i planova upravljanja poplavnim rizikom, kao i dalji razvoj i prilagođavanje Danube GIS sistema potrebama i zahtjevima.
U 2025. godini su održana 2 sastanka IM&GIS grupe, jedan je održan u formi hybrid, a drugi je održan putem ON-LINE platforme Zoom:

- 40. sastanak: 26. - 27. mart 2025. godine održana je hybridna forma sastanka, dio učesnika je bio u Regensburgu, Njemačka, a drugi dio je pristupio on-line putem Zoom platforme
- 41. sastanak: 22.oktobra 2025. godine, - ON-LINE ZOOM platforma

Naredni 42. sastanak IM&GIS grupe je planiran za 21. - 22. april 2026. godine u Austriji.
Tokom 2025. godine IM&GIS EG je svoje obaveze rješavala i provodila kroz nekoliko bitnih aktivnosti:

- GIS sistem Dunava (Danube GIS) prikupljanje podataka i potrebe izvještavanja saradnja i pomoć stručnim grupama:
- FP EG (pregled i update podataka za hidrološke stanice WG stn i meteo stanice PStn)
- APSFR i FHR mape update podataka (podrška flood protection grupi)
- APC EG (integracija podataka u Danube GIS)
- Analiza i pregled DanubeGIS template sistema za DRBMP 2027
- Analiza DanubeHIS (Danube Hydrological Information System)
- DRBMP/DFRMP – priprema slojeva, raspoloživost podataka za DRBMP 2027 „update" planova upravljanja vodama i upravljanja poplavnim rizikom
- Nastavak razvoja DanubeGIS sistema: Metadata DanubeGIS, Danube Hydrological Information System, on-line mape za izvještavanje, razvoj novih funkcionalnosti Danube GIS sistema

Obzirom da su krenule aktivnosti na pripremi novog planskog ciklusa, grupa je aktivno pripremala revidovan Danube GIS Templates dokumentaciju DRBMP 2027 u koje su uključeni zahtjevi svih drugih tehničkih grupa, sa kojima su se prethodno usaglašavali stavovi i rješavali zahtjevi.
Također se kontinuirano radilo i na dostavi (upload) podataka za pripremu i izradu novog Plana upravljanja vodama i Plana upravljanja poplavnim rizikom. Dostavljanje podataka se vrši automatski (upload) iz Nacionalnih sistema u DRB GIS sistem (baza podataka u Sekretarijatu ICPDR-a).
Bosna i Hercegovina (Federacija BiH) je u ovom periodu odgovorila traženim zahtjevima i ispunila većinu svojih obaveza (u skladu sa raspoloživim i dostupnim podacima).

Hymo TG – Radna grupa za hidromorfološke promjene
U 2025. godini su održana dva sastanka i to: 33. ICPDR HYMO TG sastanak održan u Beču 12. i 13.03.2025. godine, te 34. ICPDR HYMO TG sastanak održan u Beču 24. i 25.09.2025. godine. Radna grupa za hidromorfologiju (HYMO TG) je radna grupa osnovana u okviru Stručne grupe za upravljanje riječnim slivom (RBM EG). HYMO TG podržava aktivnosti ICPDR-a o značajnom pitanju upravljanja vodama (SWMI) hidromorfoloških promjena. U vezi s ovom temom, HYMO TG pomaže u koordinaciji provedbe Plana upravljanja slivom rijeke Dunav i njegovih ažuriranja. HYMO TG doprinosi, prema potrebi, radu drugih stručnih grupa ICPDR-a koje se bave temama relevantnim za hidromorfologiju.
Na sastancima se razgovaralo o pravcima u kojima treba da se kreće rad ove grupe u pripremama Plana upravljanja sliva rijeke Dunav. Diskusija se dalje odvijala u nekoliko tema kao što su pripreme za ažuriranje Plana 2027, SWIMI dokument za 2025. godinu, pružanju podrške aktivnostima na provođenju zajedničkog istraživanja Dunava (JDS) 5, dodatnim

rješenjima zasnovanim na prirodi, ažuriranje projekata relevantnih za ICPDR (npr. Danube Sediment_Q2 i Danube4All), i slično. Važno je napomenuti da je bilo govora i o drugim aspektima koji su važni za HYMO koji nadilazi samo ekološki status a relevantna je i za druge aspekte okoliša (npr. klimatske promjene, biodiverzitet, suše, nedostatak vode). Predstavljeni su ažurirani značajni pritisci za hidromorfologiju, sa predlošcima i smjernicama za prijenos podataka DanubeGIS-a za izvještavanje za ažuriranje DRBMP-a 2027.
Savska komisija je predstavila je pristup upravljanju sedimentom u slivu rijeke Save, u skladu sa informacijama o projektu koji se trenutno provodi pod okriljem ove komisije.
Grupi je predstavljen status dokumenta o rješenjima zasnovanim na prirodi (NbS). Verzija koja je razmatrana na sastanku HYMO TG predata je Stručnoj grupi za zaštitu od poplava (FP EG) na uvid i mišljenje.

PM EG - Stručna grupa za upravljanje zagađenjem
U 2025. godini su održana dva sastanka i to: 42. ICPDR PM EG sastanak održan u Sarajevu 23. 24. i 25.04.2025. godine, 43. ICPDR PM EG sastanak održan on line 01. i 02.10.2024. godine.
Stručna grupa za upravljanje zagađenjem (Pollution Management Expert Group PM EG) identificira uzroke pritisaka povezanih sa onečišćenjem i potiče mjere za njihovo rješavanje. Usklađuje svoj rad u ICPDR-u sa relevantnim direktivama i politikama EU (npr. Direktiva o tretmanu komunalnih otpadnih voda, Direktiva o nitratima, Direktiva o industrijskim emisijama, Zajednička poljoprivredna politika, Akcioni plan za nulto zagađenje).
U periodu od 23. do 25. aprila 2025. godine, Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo bila je domaćin zajedničkog sastanka grupe za nutrijente (Nutrient Task Group – NTG) i grupe za upravljanje zagađenjem (Pollution Management Expert Group – PM EG).
U protekloj godini članovima grupe predstavljen je najnoviji razvoj MONERIS modela. To uključuje usklađenu evropsku bazu podataka za unos podataka o zagađenjia prouzrokovanim poljoprivrednim površinama. Pojašnjen je princip modeliranja emisija zagađenja i predstavljene su planirane aktivnosti za podršku procjenama modeliranja koje će se koristiti za izradu ažuriranja SRBMP-a za 2027. godinu.
Izvršena je prezentacija glavnih rezultata i zaključaka studije o mogućnostima korištenja kanalizacionog mulja u Dunavskoj regiji. Studija identificira glavne izazove i probleme i daje preporuke za buduće korake.
Predstavljene su glavne aktivnosti i postignuti napredak projekta Aquatic Plastic, koji finansira Program za Dunavsku regiju, te su sumirani rezultati trenutnih istraživanja o kapacitetu hidroelektrana za zadržavanje riječnog otpada i povezanim operativnim utjecajima.
Članovima grupe predstavljen je aspekt praćenja zagađenja mikroplastikom, uključujući standardizaciju, zakonodavstvo i terenska iskustva u dunavskoj regiji. Prezentiran je regulatorni okvir EU i postojeći standardi praćenja zagađenja kao i nedostaci EU regulative u ovoj oblasti.
Tehnički ekspert je predstavio napredak aktivnosti ICPDR-a u vezi sa sušama i predočio tri prioriteta koja je ICPDR usvojio, a to su:

- Definisati zajedničke indikatore suše, nadograđujući se na postojeće nacionalne pristupe.
- Razviti usklađene sisteme za praćenje suše na nivou cijelog sliva, nadograđujući se na postojeće nacionalne sisteme.
- Podsticati izgradnju ljudskih kapaciteta kao kontinuirani napor za razmjenu dobrih praksi i iskustava, uključujući relevantne zainteresovane strane (poljoprivreda, plovidba i zaštita prirode).

Nutrient Task Group – NTG – Radna grupa za nutrijente

U periodu 23.-25.april 2025. godine u Sarajevu održan je 20. redovni sastanak radne grupe za nutrijente. U periodu od 23. do 25. aprila 2025. godine, Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo bila je domaćin zajedničkog sastanka Radne grupe za nutrijente (Nutrient Task Group – NTG) radne grupe za upravljanje zagađenjem (Pollution Management Expert Group – PM EG).

Na sastanku su razmotrene mogućnosti proširenja NTG-a na širi mandat: difuzno zagađenje (nutrijenti + hemikalije) kao i voda i poljoprivreda (zagađenje + suše). Tokom sastanka je naglašena važnost međusektorke saradnje vodnog i poljoprivrednog sektora. Prepoznata je potreba rješavanja širih izazova: deficit vode, navodnjavanje i upotreba pesticida. Više članova radne grupe je podržalo proširenje mandata i razmatranje novog naziva. Sekretarijat ICPDR-a je dobio zadatak da informiše šefove delegacija i razmotre naziv i obaveze NTG-a.

Završen je izvještaj „Upravljanje nutrijentima u Dunavskom slivu – uspješna priča", koji će biti objavljen na web stranici ICPDR-a. Planirane su aktivnosti jačanja saradnje s poljoprivrednim sektorom kroz seriju webinara, prvi u proljeće 2026. godine Formirana je kontaktna mreža relevantnih aktera u svim zemljama sliva.

Članovima PM EG i NTG grupe je predstavljen najnoviji razvoj MONERIS modela. To uključuje usklađenu evropsku bazu podataka za unos. Pojašnjen je princip modeliranja emisija zagađenja i predstavljene su planirane aktivnosti za podršku procjenama modeliranja koje će se koristiti za izradu ažuriranja RBM Plana Dunava za 2027. godinu.

Izvršena je prezentacija glavnih rezultata i zaključaka studije o mogućnostima korištenja kanalizacionog mulja u Dunavskoj regiji. Studija dalje identificira glavne izazove i probleme i daje preporuke za buduće korake.

Predstavljene su glavne aktivnosti i postignuti napredak projekta Aquatic Plastic, koji finansira Program za Dunavsku regiju, te su sumirani rezultati trenutnih istraživanja o kapacitetu hidroelektrana za zadržavanje riječnog otpada i povezanim operativnim utjecajima.

Članovima grupe predstavljen je aspekt praćenja zagađenja mikroplastikom, uključujući standardizaciju, zakonodavstvo i terenska iskustva u dunavskoj regiji. Prezentiran je regulatorni okvir EU i postojeći standardi praćenja zagađenja kao i nedostaci EU regulative u ovoj oblasti.

Tehnički ekspert je predstavio napredak aktivnosti ICPDR-a u vezi sa sušama i predočio tri prioriteta koja je ICPDR usvojio, a to su:

- Definisati zajedničke indikatore suše, nadograđujući se na postojeće nacionalne pristupe.
- Razviti usklađene sisteme za praćenje suše na nivou cijelog sliva, nadograđujući se na postojeće nacionalne sisteme.
- Podsticati izgradnju ljudskih kapaciteta kao kontinuirani napor za razmjenu dobrih praksi i iskustava, uključujući relevantne zainteresovane strane (poljoprivreda, plovidba i zaštita prirode).


APC EG – Stručna grupa za sistem za dojavu incidentnih zagađenja

Dana 08 - 09.10.2025. godine, u Bratislavi je održan 17. sastanak Stručne grupe za prevenciju i kontrolu incidentnih zagađenja (APC EG ICPDR).

Jedan od osnovnih zadataka radne grupe je rad i testiranje AEWS-a (sistema za dojavu incidentnih zagađenja), što uključuje primanje, obradu i prenos informacija o incidentnim zagađenjima, a u cilju što bolje kontrole incidentnih zagađenja.

Kao i svake godine i u 2025. godini održana su dva probna testa za dojavu incidentnih zagađenja. Prvi test održan je 24.04.2025. godine, u večernjim satima, bez prethodnog

najavljivanja. Drugi, multinacionalni test održan je 08.10.2025. godine, u toku sastanka grupe za prevenciju i kontrolu incidentnih zagađenja. Dojavu u AEWS sistem iz Bosne i Hercegovine obavljaju dvije osobe, ujedno članice Stručne grupe za prevenciju i kontrolu incidentih zagađenja, koje su u ulozi PIAC-a (Glavni međunarodni centri za uzbunjivanje). Na osnovu Izvještaja dostavljenih iz sekretarijata Dunavske komisije vidljivo je da je Bosna i Hercegovina u prilično kratkom roku reagovala na nenajavljeni test što je i registrovano u AEWS sistemu.

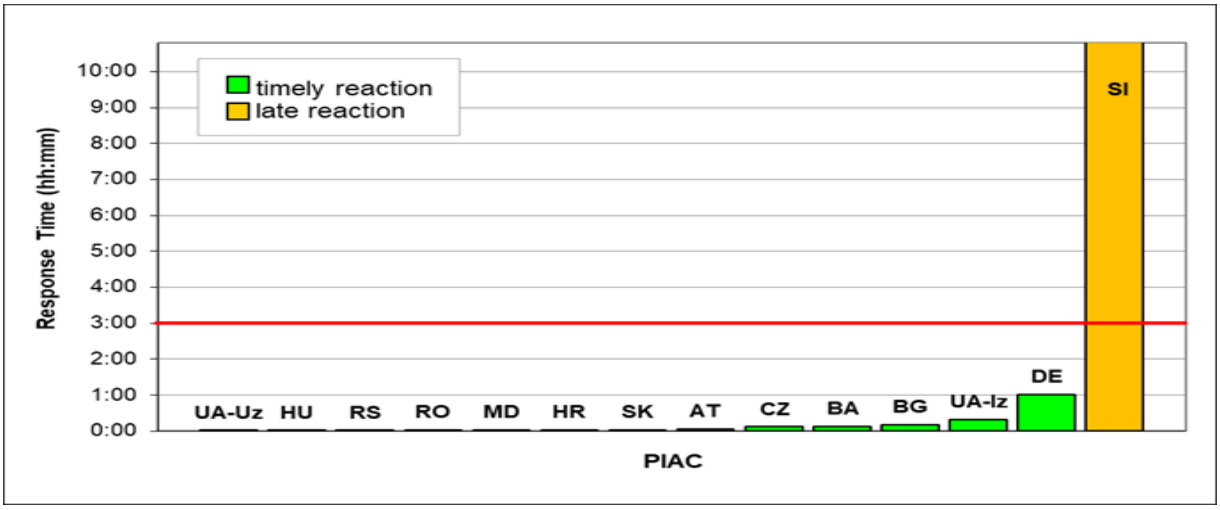

Rezultati probnog testa održanog 24.04.2025. godine

Incident	PIAC	Create	Update	End	Confirm	Remarks
Upper Danube	DE	OK	OK	OK	OK	
"	AT	OK	NO	OK	OK	
"	SK	OK	NO	OK	OK	
"	HU	OK	NO	OK	OK	
Lower Danube	RS	OK	OK	OK	OK	
"	RO	OK	NO	OK	OK	
"	BG	OK	NO	OK	OK	
"	MD	OK	NO	OK	OK	
"	UA-Iz	OK	NO	OK	OK	
Sava	SI	OK	OK	OK	OK	Multiple updates done
"	HR	OK	NO	OK	OK	
"	BA	OK	OK	OK	OK	
Prut	UA-Uz	OK	OK	OK	OK	A few incoming messages remained unconfirmed

Incident	PIAC	Create	Update	End	Confirm	Remarks
Morava	CZ	OK	OK	OK	OK	Thaya/Dyje river used in test

Prikaz učešća zemalja članica u multinacionalnom testu održanom 08.10.2025.

Ispred Sekretarijata podijeljene su slijedeće informacije:

- Predstavljen je preliminarni vremenski okvir za ažuriranje Plana upravljanja slivom rijeke Dunav (DRBMP) za 2027. godinu, za koji se očekuju doprinosi APC EG-a, posebno ažurirane liste zagađivača koji mogu imati utjecaj na prekograničnо onečišćenje. Prikupljanje podataka počet će u decembru mjesecu 2025. godine.
- Predstavljen je status ažuriranog dokumenta značajnih pitanja upravljanja vodama (SWMI) u slivu rijeke Dunav, ističući glavna pitanja na nivou cijelog sliva koja treba riješiti u ažuriranju Plana upravljanja (DRBMP-a) za 2027. godinu i navodeći identifikovane akcije i zahtjeve za koordinaciju. Izvještaj su u proljeće 2025. godine sastavile relevantne stručne grupe ICPDR-a, a njegova dorada se očekuje u jesen 2025. godine. Konačni nacrt izvještaja bit će podnesen na odobrenje u decembru 2025. godine. Dogovor APC EG grupe je da dokument zadrži bivšu strukturu SWMI-a nepromijenjenom, s tim da se stavi detaljan opis AEWS sistema i sprječavanja nesreća opasnim supstancama.

Također, najavljeno je ažuriranje podataka u AHS bazi tj. ažuriranje postrojenja/lokacija na kojima postoji opasnost od ozbiljnih industrijskih nesreća. U inventar će se uključiti sva SEVESO (industrijska postrojenja u kojima se koriste ili skladište opasne hemikalije u većim količinama) postrojenja koja mogu uticati na vode, bez obzira na udaljenost od voda i bez razmatranja prekograničnih efekata.
Budući da APC EG ima jedan sastanak godišnje, dogovoreno je da će se sveobuhvatni multinacionalni test za dojavu incidentnih zagađenja održati na slijedećem sastanku planiranom za početak mjeseca oktobra 2026. godine.
Drugi test, koji se obavlja za provjeru pripravnosti (24/7) PIAC-a (Glavni centri za uzbunjivanje) bit će organizovan u proljeće 2026. godine, u toku radne sedmice, u kasnim poslijepodnevnim satima.
Bosna i Hercegovina (Federacija BiH) je u ovom periodu odgovorila traženim zahtjevima i ispunila većinu svojih obaveza.

<u>Economics TG– Stručna grupa za ekonomiju</u>
30. sastanak Radne grupe za ekonomiju (ECON TG) održan je online uz učešće predstavnika ICPDR Sekretarijata i država članica (AT, HR, DE, HU, RO, RS, SK, UA).
Na sastanku su predstavljene su ključne aktivnosti ICPDR-a, uključujući:

- usvajanje 11 odluka na 27. redovnom sastanku ICPDR-a,
- primopredaju predsjedavanja (Slovačka → Slovenija),
- najavu važnih događaja (JDS5, sastanci radnih tijela, izložbe i sastanci u 2025),
- nastavak jačanja saradnje s međunarodnim partnerima (npr. UNEP-MAP, Black Sea Commission).

Posebno je naglašena važnost koncepta Source-to-Sea i jačanja međugeneracijske saradnje.
U okviru EU tema istaknuto je:

- jačanje zahtjeva Evropske komisije za kvalitetnijim ekonomskim opravdanjima kod izuzeća prema članu 4.4 WFD,
- potreba snažnijeg korištenja cost-benefit i cost-effectiveness analiza,
- ograničenja postojećih nacionalnih ekonomskih analiza u RBMP-ovima.

Priprema DRBMP 2027 – doprinos ECON TG
SWMI izvještaj (2025): Razmatrano je poglavlje 3.5 (Finansijska pitanja). Istaknuto je da su potrebna dodatna pojašnjenja vezana za subvencije i ekonomske instrumente, te da postoji potreba jače integracije ekonomskih analiza u planiranju mjera.

DRBMP 2027 – metodologija i DanubeGIS
Razmatrana je struktura ekonomskih podataka u okviru DanubeGIS-a:
- otvorena je rasprava o potrebi prilagođavanja postojećih šablona,
- dogovoreno je da se dalji koraci usklade s radom drugih ekspertnih grupa,
- razmatrana je uloga cost-benefit analiza u opravdanju izuzeća.

31. sastanak ECON TG održan je online uz učešće predstavnika ICPDR-a i država članica (AT, BA, CZ, HR, DE, HU, RO, RS, SK, UA). Posebno je naglašena raznolikost iskustava unutar grupe i važnost razmjene znanja.
Predstavljene su ključne aktivnosti, uključujući:
- obilježavanje Dana Dunava 2025,
- početak JDS5 kampanje,
- stratešku orijentaciju ICPDR-a prema dugoročnom cilju „Fit for 2055".

Na EU nivou naglašeno je:
- usvajanje Strategije otpornosti voda EU,
- fokus na efikasnijem korištenju postojećih finansijskih instrumenata,
- pojačan interes Evropske komisije za kvalitet opravdanja izuzeća prema WFD.

DRBMP 2027 – ekonomski aspekti
SWMI izvještaj: Potvrđeno je da je poglavlje o finansiranju finalizirano. Naglašeno je da javne konsultacije trebaju snažnije uključiti institucije koje direktno provode mjere, a ne samo nevladine organizacije.

Centralna tema sastanka bila je primjena izuzeća:
- Evropska komisija očekuje kvalitetnije ekonomsko obrazloženje (cost-benefit i cost-effectiveness).
- Predstavljeni su primjeri iz Slovačke, Rumunije i Austrije.
- Naglašeno je da će se nakon 2027. godine prostor za izuzeća značajno smanjiti.
- Uočeno je da mnoge države nemaju direktno uključene ekonomske stručnjake u procese odlučivanja o izuzećima.

32. sastanak ECON TG planiran je za proljeće 2026. godine (fizički sastanak).

PP EG – Stručna grupa za učešće javnosti
U toku 2025. godine održana su dva sastanka PP EG (stručna grupa za odnose s javnošću) Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav: prvi sastanak početkom aprila u Beču (3. i 4. april) te online susret krajem septembra 2025. godine (29. septembar).

Osim o aktivnostima na nacionalnoj razini, posebna pažnja posvećena je najopsežnijem istraživanju praćenja površinskih voda u svijetu - zajedničkom istraživanju Dunava (JDS). Peto izdanje JDS_5 službeno je počelo 1. jula 2025. godine, a zemljama članicama je upućeno zajedničko saopćenje za javnost. Sugerirano je da se komunikacijske aktivnosti odvijaju ne samo na nivou ICPDR-a, već i unutar svake zemlje. Agencija za vodno područje rijeke Save je o ovom događaju izvijestila na svojoj web i FB stranici te u časopisu "Voda i mi". Cilj je osigurati što veću medijsku pokrivenost i vidljivost na društvenim mrežama o JDS5 (informacije, plasman animiranog sadržaja, emitiranje video materijala koji prikazuje aktivnosti uzorkovanja i slično). Značajnim je označen inovativni program uključivanja "građanske znanosti" u informiranje javnosti. Program "građanska znanost" razvijen je u saradnji s EK, a riječ je o angažiranju učenika i lokalnih zajednica da aktivno učestvuju u najvećem svjetskom istraživanju praćenja površinskih voda. Podaci prikupljeni u okviru JDS_5 pomoći će u izradi Plana upravljanja riječnim slivom Dunava za 2027. godinu.
Također, posebna pažnja na sastancima posvećena je aktivnostima na nacionalnoj razini povodom obilježavanju Dana Dunava (uključujući vizualne elemente: fotografije i videozapise) te prezentiranju aktivnosti Danube Box i Danube Art Master.
Razgovarano je i o inicijativama za informiranje javnosti putem kampanja kojima je cilj edukacija građana o zaštiti i upravljanju vodama (primjer kampanja o nestašici vode i poplavama u Austriji).
Ažuriranjem smjernica ICPDR-a za društvene mreže, posljednji put revidiranih 2020. godine, nastoji se osigurati da komunikacija ICPDR-a ostane aktuelna, vjerodostojna i usklađena s najnovijim praksama društvenih medija (digitalna, štampana, online).

Okvirni sporazum o slivu rijeke Save

PEG RBM – Stalna stručna grupa za upravljanje riječnim bazenom
U 2025. godini u Zagrebu su održana dva redovna sastanka PEG RBM stalne stručne grupe Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, 53. sastanak u periodu od 11.-12.02.2025. godine i 54. sastanak od 03.-04.12.2025. godine. U sklopu 54. sastanka održan je hybrid on-line sastanak sa Task grupom za izradu Studije o sedimentu, vodi i bioti u slivu rijeke Save.
Kao redovno i kontinuirano izvještavanje na sastancima dati su kratki pregledi relevantnih aktivnosti Savske komisije i članova PEG RBM vezane za razmjenu informacija o napretku u implementaciji ODV-a i povezanih direktiva na nacionalnoj/entitetskoj razini. Predstavnik Federacije BiH iz AVP Sava je predstavio aktivnosti na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.
Plan rada Savske komisije za fiskalnu godinu 2025. koji se odnosi na rad PEG RBM je predstavljen, raspravljen i dogovoren.
U sklopu pripreme za 3. Plan upravljana slivom rijeke Save, radilo se na izradi trogodišnjeg Izvještaja o napretku 2. Sava RBMP (Interim izvještaj o napretku provođenja Programa mjera). Interim izvještaj 2. Plana upravljanja slivom rijeke Save je pripremljen s ciljem pružanja informacija o ostvarenom napretku, olakšavanja identifikacije zajedničkih izazova i nedostataka povezanih s provođenjem mjera i pružanja smjernica za sljedeće cikluse planiranja upravljanja za rijeku Savu. Drugi nacrt Izvještaja o napretku 2. Sava RBMP je pregledan i dorađen, te se usaglašen u skladu sa komentarima, razmatrao na 53. PEG RBM sastanku. Izvještaj o napretku provođenja Programa mjera iz 2. Plana upravljanja slivom rijeke Save je finaliziran i usvojen na 68. sjednici Savske komisije u martu 2025. godine.
Zajednička izjava 2.0 Savske komisije je dorađena i usvojena na 68. sjednici ISRBC, u martu 2025. godine. Ona predstavlja ažuriranu verziju prvobitne Zajedničke izjave iz 2007. godine i

ima za cilj jačanje održivog razvoja plovidbe, zaštite okoliša i regionalne koordinacije u skladu s evropskim standardima.
Pregledan nacrt Priručnika uz Zajedničku izjavu 2.0, zajedno s aneksima, te prijedlog strukture i sadržaja budućeg Online sistema razmjene znanja.
Predstavljen je pregled aktivnosti o provedbi SDIP-a (GEF Program integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine) Faza I Dio 4: Regionalna saradnja. U prezentaciji su navedene dovršene i tekuće aktivnosti s očekivanim rokovima njihove realizacije. Posebno su razmatrani sljedeći SDIP projekti:

- Studija o sedimentu, vodi i bioti u slivu rijeke Save
- Master plan za održivi turizam u slivu rijeke Save
- Hidrološka studija u slivu rijeke Save
- Strategija adaptacije na klimatske promjene u slivu rijeke Save
- Sava RBMP ažuriranje (2027.)

Prvi nacrt Izvještaja o napretku Studije o sedimentu, vodi i bioti je prezentiran, dati su komentari, te se od konsultanta očekuje krajem januara 2025. godine dokument sa pitanjima za diskusiju sa ekspertima i zainteresovanim stranama.
Vremenski okvir za izradu ažuriranog Plana upravljanja slivom rijeke Save (2027.) predložen je i predstavljen u skladu s prethodnom vremenskom dinamikom i iskustvom stečenim u procesu razvoja 2. Plana upravljanja slivom rijeke Save (odobrenog u decembru 2022.). Zemlje članice bi trebale odobriti 3. Plan upravljanja slivom rijeke Save u decembru 2027., tako da je postupak javne nabavke za Konsultanta za izradu dokumenta pokrenut u 2025. godini. Preliminarni ToR (Projektni zadatak) je predstavljen i usaglašen na 53. sastanku PEG RBM-a, te je i dalje u toku postupak javne nabavke.
Pregledan nacrt Priručnika uz Zajedničku izjavu 2.0, zajedno s aneksima, te na prijedlog strukture i sadržaja budućeg Online sistema razmjene znanja.

Dostavljeni podaci za Federaciju BiH za pripremu 9. državnog izvještaja o provedbi Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save.

PEG APC – Stalna stručna grupa za prevenciju i kontrolu incidentnih zagađenja
U 2025. godini nije održan nijedan sastanak stalne stručne grupe za prevenciju i kontrolu akcidenta u okviru Savske komisije.
U mjesecu avgustu 2025. godine, iz Sekretarijata Savske komisije zaprimljen je e-mail u kojem je traženo da se podaci o rudarskim i industrijskim jalovištima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, a koji su uneseni u bazu pri Dunavskoj komsiji, dostave za potrebe Studije o sedimentu, vodi i bioti. Radi se o podacima koji su uneseni kao „povjerljivi", te je uz saglasnost direktora Agencije proslijeđena informacija da se isti mogu koristiti samo u svrhu za izradu predmetne Studije.

PEG FP – Stalna stručna grupa za zaštitu od poplava
Stalna stručna grupa za zaštitu od poplava – PEG FP Savske Komisije, je grupa u čijem radu aktivno učestvuju uposlenici "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo kao predstavnici Bosne i Hercegovine na problematici poplava u slivu rijeke Save koji se odnosi na dio Federacije BiH.
U 2025. godini održana su dva sastanka PEG FP grupe:
-50. sastanak održan 26. i 27. februara 2025. godine, On-line Teams platforma,
-51. sastanak održan 18. septembra 2025. godine, u Zagrebu

Na sastancima se nastavilo sa raspravom o statusu provedbe nestrukturnih i strukturnih mjera iz 1. plana upravljanja rizicima od poplava za rijeku Savu. Nakon završetka prikupljenih informacija o provedbi strukturnih mjera, Sekretarijat Savske komisije je pripremio izvještaj o napretku postignutom u provedbi mjera s ocjenom postignutog napretka korištenjem GIS alata. Izvještaj je pripremljen za trogodišnje razdoblje provedbe Plana upravljanja rizicima od poplava rijeke Save.
U skladu sa Protokolom o zaštiti od poplava uz FASRB, završene su aktivnosti na ažuriranju zajedničkog izvještaja preliminarne procjene rizika od poplava (Sava PFRA) gdje je Bosna i Hercegovina (Federacija BiH) dostavila dostupne podatke u skladu sa Sava GIS-om.
Nakon završetka ažuriranja zajedničkog Sava PFRA izvještaja, ažurirane su mape opasnosti i mape rizika od poplava. Na osnovu prikupljenih informacija, gdje je Bosna i Hercegovina (Federacija BiH) dostavila dostupne podatke u skladu sa Sava GIS-om, Sekretarijat Savske komisije je pripremio izvještaj o razmjeni podataka o mapa opasnosti i mapa rizika od poplava u skladu s člankom 7(2) Protokola o sprječavanju poplava uz Okvirni sporazum.
Ukratko je predstavljen novi nacrt izvješća o poplavama u slivu rijeke Save - hidrološka sezona 2023., uključujući informaciju da su analize koje je prethodno pripremio Tim za prognoziranje Savskog FFWS-a dodatno ažurirane. Također su predstavljene informacije koje je pripremila Agencija za sliv rijeke Save u Sarajevu o poplavi koja je pogodila Bosnu i Hercegovinu u listopadu 2024. godine.
Na sastancima se zaključilo da PEG FP treba redovito obavještavati o napretku određenih SDIP zadataka koji su povezani s radom PEG FP-a, tj. Strategije za prilagodbu klimatskim promjenama, Hidrološke studije, Studije o sedimentu, vodi i bioti, kao i uključivati se u aktivnosti kada je to potrebno.
Sve zahtjevane obaveze, od strane Sekretarijata Savske komisije, Bosna i Hercegovina (Federacija BiH) je ispunila u najvećoj mogućoj mjeri i u skladu sa raspoloživim podacima i mogućnostima.
Slijedeći 52. sastanak PEG FP grupe je planiran da se održi sredinom februara 2026. godine.

GIS PEG- Stručna grupa za Geoinformacioni sistem

PEG GIS (stalna stručna grupa za GIS) je u 2025. godini, kao i u prethodnim godinama imala za osnovni zadatak i cilj prikupljanje podataka i upload podataka u Sava GIS sistem, za potrebe izvještavanja sa akcentom na dvije teme: Direktiva o poplavama EU, izrada mapa opasnosti i rizika od poplava; dostava (uplaod) podataka u Sava GIS sistem za potrebe izrade planova upravljanja vodama i planova upravljanja poplavnim rizikom, kao i dalji razvoj i prilagođavanje Sava GIS i Sava HIS sistema potrebama i zahtjevima.
U 2025. godini su održana dva sastanka PEG GIS grupe, jedan on-line, drugi „uživo" u hybrid formatu:

- 30. sastanak: 18. februar 2025. godine, hybrid sastanak dio učesnika uživo, dio on-line putem Teams platforme
- 31. sastanak: 09. septembar 2025. godine, u on-line formatu putem Teams platforme

Naredni 32. sastanak PEG GIS grupe je planiran da se održi u februaru/martu 2026. godine, po mogućnosti uživo.
Tokom 2025. godine PEG GIS grupa je imala puno aktivnosti uglavnom kroz implementaciju Sava RBMP i Sava FRM baze podataka (baza podataka za Plan upravljanja poplavnim rizikom). Jedna od glavnih aktivnosti kojima se bavila ova grupa tokom 2025. godine je Program „SAVA AND DRINA RIVER CORRIDORS INTEGRATED DEVELOPMENT PROGRAM (SDIP)-Phase I, Part

4 – Regional Cooperation", u okviru kojeg je Projekt Technical Assistance for the Extension and Enhancement of Sava GIS and HIS.
Redovne aktivnosti koje su se provodile tokom 2025. godine odnosile su se na obaveze prema Sava GIS-u i Sava HIS-u kroz:

- prikupljanje podataka, kontrola i dostavljanje novih podataka za potrebe centralnog sistema Sava GIS, saradnja i pomoć drugim stručnim grupama
- Update podataka za Mape opasnosti i mape rizika od poplava (FHRM datasets), kao i raspoloživih podatka za „flood control structure" duž rijeke Save i njenih pritoka
- Nastavak razvoja Sava GIS sistema: Metadata katalog, Sava Hydrological Information System, razvoj novih funkcionalnosti Sava GIS sistema
- Aktivnosti na projektima WACOM i SHELTER
- Aktivnosti po pitanju novog SDIP projekta – Sava GIS unapređenje infrastrukture

Na 30. sastanku je donesen i usvojem Program rada ove grupe za 2025. godinu.
Bosna i Hercegovina (Federacija BiH) je u ovom periodu odgovorila traženim zahtjevima i ispunila većinu svojih obaveza (u skladu sa raspoloživim i dostupnim podacima).

Komisija za vodoprivrednu saradnju između Republike Hrvatske i BiH – Podkomisija/ Potpovjerenstvo za sliv Crnog mora

Potkomisija za sliv Crnog mora održala je 17. sastanak 20. novembra 2025. godine u prostorijama Agencije za vodno područje rijeke Save u Sarajevu. Sastanku su prisustvovali predstavnici Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.
Na sastanku su razmatrana pitanja rada stalnih stručnih grupa, upravljanja prekograničnim vodotocima, provedbe međudržavnih ugovora, izrade planskih dokumenata te realizacije kapitalnih projekata zaštite od poplava.

Rad stalnih stručnih grupa:

Kvalitet voda: Poslovnik Stalne stručne grupe nalazi se u završnoj fazi. Dogovorene su dopune koje se odnose na preciziranje lokacija mjernih mjesta, frekvencije mjerenja i imenovanje članova, uz lekturu na službenim jezicima obje strane. Planiran je zajednički obilazak mjernih stanica u prvom kvartalu 2026. godine.

Količine voda: Poslovnik je u fazi usaglašavanja. Zaključeno je da je potrebno izvršiti dopunu sastava stalne stručne grupe, posebno imenovanjem predstavnika hidrometeoroloških zavoda obje države.

Vodoprivredno planiranje: Nakon prvog sastanka održanog 2024. godine nisu evidentirane nove aktivnosti.
Problematika čišćenja korita rijeke Gline:

Republika Hrvatska: Hrvatske vode kontinuirano provode aktivnosti održavanja i čišćenja graničnih dionica rijeke Gline, uključujući uklanjanje nanosa i sprudova te redovno održavanje korita.

Federacija Bosne i Hercegovine: Zaprimljen je zahtjev Općine Velika Kladuša za čišćenje i uređenje korita rijeke Gline. Istaknuta je važnost rijeke Gline kao međudržavnog vodotoka te potreba koordiniranog i usaglašenog djelovanja nadležnih institucija u njegovo upravljanje i zaštitu.

Međudržavni projekti na vodotocima od zajedničkog interesa:

Trenutno ne postoje bilateralni međudržavni projekti, dok obje države učestvuju u multilateralnim projektima u okviru Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav i Međunarodne komisije za sliv rijeke Save.

Aktivnosti na presječenom sistemu Velika Kladuša – Vojnić:

U toku je usaglašavanje nacrta provedbenog ugovora kojim se uređuju uslovi korištenja voda za potrebe javnog vodosnabdijevanja preko državne granice. Ovakvi provedbeni ugovori predstavljaju ustaljenu praksu u prekograničnoj saradnji.

Zaštita krških vodonosnika u graničnim područjima:

Na osnovu zaključaka Komisije za vodoprivrednu saradnju Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, zaduženi su predsjednici potkomisija za ponovno formiranje Radne grupe s ciljem izrade provedivog dokumenta (smjernica, sporazuma ili drugog odgovarajućeg akta) za zaštitu krških vodonosnika u graničnim područjima, usklađenog sa zakonodavnim okvirima obje države.

Razmjena informacija o planovima upravljanja vodama i rizicima od poplava:

Republika Srpska: Planovi upravljanja vodama i upravljanja rizicima od poplava nisu u potpunosti ažurirani. Paralelno se realizira veći broj projekata sanacije i zaštite od poplava finansiranih iz domaćih i kreditnih sredstava.
Federacija Bosne i Hercegovine: U toku je izrada Plana upravljanja vodama za period 2028–2033, kao i drugi ciklus izrade Plana upravljanja rizicima od poplava, uz provođenje procedura učešća javnosti u skladu sa Zakonom o vodama Federacije BiH.
Republika Hrvatska: U realizaciji su ili su završeni kapitalni projekti zaštite od poplava sufinansirani sredstvima Evropske unije, uz nastavak planskih aktivnosti za novi ciklus 2028–2033.

DIREKTOR

Dr.sc. Senad Memić
